

545

24/07/2017
MES QUE SE R
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

ANTECEDENTES:

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

AVANCE FISCO REAL

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE OBRAS

1 de

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090003		DESCRIPCION DE LA OBRA:	
				PERFORACION DE POZO PROFUNDO NO. 2, PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI		X		NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		CLAVE		N/A			
TIPO DE ZONA:		RURAL		URBANA		X	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO		X	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI		X		NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LONGITUD		-96.847945300			
LATITUD		19.536118100					

ANTECEDENTES:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
		MUY ALTO	
		ALTO	
		MEDIO	
		BAJO	
		MUY BAJO	
		X	

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:		RESTRINGIDA	
DIRECTA		X	
COMPLEMENTARIA			

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO NO. 2, PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ	
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 87%	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS						
	No.	MONTO	No.	MONTO	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
3 N	SPEI	\$1,072,908.54	44	\$1,577,353.73	\$473,206.12	\$473,206.12	\$6,798.94	\$24,440.13	\$1,072,908.54
2 N	SPEI	\$738,725.73	43	\$1,061,861.03	\$318,558.31	\$318,558.31	\$4,576.99	\$0.00	\$738,725.73
1 NORMAL	SPEI	\$945,425.87	40	\$1,358,976.47	\$407,692.94	\$407,692.94	\$5,857.66	\$0.00	\$945,425.87
ANTICIPO	SPEI	\$1,830,602.89	579A3	\$1,830,602.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830,602.89

MONTO AUTORIZADO:	\$6,200,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$6,200,000.00	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS, XALAPA	NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA	CMAS, XALAPA	
FACTIBILIDAD:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA	MUNICIPIO DE XALAPA	
LOS PERMISOS:	EXISTE	EXISTE
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACION PUBLICA	

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-001-2025	FECHA:	11/02/2025
CONTRATISTA:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUZMAR SA DE CV		
RFC:	PCL180519VB80		
MONTO CONTRATADO:	\$6,102,009.62	PROGRAMADA	REAL
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO 12/02/2025	TERMINO 11/07/2025	12/02/2025
	DIAS 150		139
ANTICIPO:	APLICA X NO APLICA		
	MONTO: \$1,830,602.88	PORCENTAJE:	30.00
	FECHA DE PAGO:		14/02/2025

B) REPORTE									
MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS							
		04/06/2025							
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,811,634.27								
FINQUITO CON IVA:	\$0.00								
ACTA ENTREGA RECEPCION:									

AVANCE FISICO REAL									
AVANCE	PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO	ATRASO (%)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
	0	2,822	30,54	31,56	18,71	14,83	0	0	0
	0	20	3	22	7	0	0	0	0
	0	20	23	58	80	87	0	0	0
	0	0	27,54	0	0	7,83	0	0	0

OBSERVACIONES:									

MONTO AFIANZADO:	\$1,830,602.89	CUMPLIMIENTO	\$526,035.31
AFIANZADORA:	URADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA, S.A. D		
No. DE FIANZA:	3801-02327-5	3801-02328-5	
FECHA:	11/02/2025	11/02/2025	
CONVENIO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MODIFICATORIO:	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$6,102,009.62		C/IVA

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Juan Ortiz Leganes
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

EJERCICIO 2025

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		Nº. DE OBRA:
		<p>A) PLANEACION Y DATOS GENERALES</p> <p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</p> <p>REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA ENCANTO Y FINAL DE LA CALLE DE LA COLONIA JARDINES DE</p>
		<p>XALAPA-ENRIQUEZ</p> <p>2025309090004</p>

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*			FACTURAS
	POLIZAS CHEQUE		

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-013-2025	FECHA:	03/03/2025
CONTRATISTA:	MAQUINARIA Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCC		
RFC:	MSI080710HA4		
MONTO CONTRATADO:	\$4,310,043.12	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	03/03/2025	03/03/2025
	TÉRMINO	29/08/2025	
	DÍAS	180	120
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:	\$0.00	PORCENTAJE:
FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$371,555.44	
AFIANZADORA:		INSTITUCIÓN DE GARAN	
No. DE FIANZA:		3009317	
FECHA:		03/03/2025	
CONVENIO	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
MODIFICATORIO:	PLAZO		INICIAL
	NO APLICA	X	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			\$4,310,043.12
			C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

CMAS

CMAS

CMASCMASCMASCMASCMASCMASCMAS

CMAS

CMAS

CMASCMASCMASCMASCMASCMAS

CMAS

C.M.S. 24

C.M.S. 24

C.M.S. 24C.M.S. 24C.M.S. 24C.M.S. 24C.M.S. 24C.M.S. 24C.M.S. 24C.M.S. 24

C.M.S. 24

C.M.S. 24

CMAA

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/07/2025
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja

CMAS

CMAS

CMASCMASCMASCMASCMASCMASCMAS

CMAS

CMAS

CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACION:
27/06/2025

MES QUE SE REPORTA
JUNIO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2025309090011

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA:
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLES AGUSTIN MELGAR Y JACARANDAS Y EN FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLES AGUSTIN MELGAR Y JACARANDAS Y EN CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y POZO No. 8 Y REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLES AGUSTIN MELGAR Y JACARANDAS VICENTE SUAREZ

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLES AGUSTIN MELGAR Y JACARANDAS Y EN CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y POZO No. 8 Y REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLES AGUSTIN MELGAR Y JACARANDAS VICENTE SUAREZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:
TIPO DE ZONA: RURAL CLAVE: N/A
URBANA AGEB: SI NO X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

ANTECEDENTES:
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.555456700 LONGITUD -96.953190000

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS		IMPORTE NETO	
		No.	MONTO	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA		5 MILLAR
1 N	\$204,483.83	SPEI	\$140,494.49	55	\$881.40	\$1,762.79	\$140,494.49
ANTICIPO	\$198,712.26	SPEI	\$198,712.25	53	\$0.00	\$0.00	\$198,712.26
TOTALES	\$204,483.83		\$140,494.49		\$881.40	\$1,762.79	\$339,206.75

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

MONTO PAGADO EN EL MES: \$140,494.49 17/06/2025

MONTO PAGADO ACUMULADO: \$140,494.49

FINQUITO CON IVA: \$0.00

ACTA ENTREGA RECEPCION:

OBSERVACIONES:

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0.99	12.99	44.74	37.36	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	1	57	33	8	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	1	58	91	99	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	11.74	29.36	0	0	0	0	0	0

NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-021-2025

CONTRATISTA: ARQUITECTURANDO SAS

RFC: ARQ1806018F7

MONTO CONTRATADO: \$662,374.21

PERIODO DE EJECUCION: INICIO 25/03/2025 TERMINO 02/07/2025 DIAS 100

ANTICIPO: APLICA MONTO: \$198,646.02 NO APLICA 98

FECHA DE PAGO: 16/04/2025

FECHA: 25/03/2025

PROGRAMADA 25/03/2025

REAL 25/03/2025

PORCENTAJE: 29.99

VIOS OCULTOS

URADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA, S.A. D

3679-03757-5

25/03/2025

IMPORTE/PERIODO

FECHA

MONTO

EXISTE

INICIAL

FINAL

PLAZO

NO APLICA

CONVENIO MODIFICATORIO: X

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO 4 CONTRATO) DE OBRA: \$662,374.21

C/IVA

Ing. Adán Burgos-Monfil DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Heber Alt Montemayor Medel SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

CALLS

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

FORMATO 11

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/07/2025
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

CMAS

* En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACION:	27/06/2025
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	202530900014
		DESCRIPCION DE LA OBRA:	
		REHABILITACION DE ALcantarillado sanitario y red de agua potable, incluye rehabilitación de trágatormentas, en las calles CUAUHTEMOC ENTRE	

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:			
REHABILITACION DE ALcantarillado sanitario y red de agua potable, incluye rehabilitación de trágatormentas, en las calles CUAUHTEMOC ENTRE ALHONDIGA DE GRANADITAS Y FINAL DE LA CALLE Y ALHONDIGA DE GRANADITAS ENTRE CUAUHTEMOC Y BLVR. XALAPA BANDERILLA, DE LA COLONIA 21 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ			

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99.1%	

MONTO AUTORIZADO:		\$1,650,000.00		C/I/A
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,650,000.00		C/I/A
VALIDACION DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS, XALAPA		NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		CMAS, XALAPA		NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		MUNICIPIO XALAPA		NO APLICA
TIPO DE LICITACION:		ADJUDICACION DIRECTA		
		INVITACION A MENOS 3 PERSONAS		
		LICITACION PUBLICA		
		EXISTE		
		X		

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-005-2025	FECHA:	18/02/2025
CONTRATISTA:	CALLI INGENIERIA CIVIL SA DE CV		
REC:	CIC881222D94		
MONTO CONTRATADO:	\$1,421,137.08	PROGRAMADA	REAL
		19/02/2025	19/02/2025
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO	19/05/2025	
	TERMINO		
	DIAS	90	132
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$426,199.01	PORCENTAJE: 29.99
	FECHA DE PAGO:	18/02/2025	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$426,341.12	\$122,511.82	
AFIANZADORA:	INTERREY, ASEGURADOR INTERREY, ASEGURADOR		
No. DE FIANZA:	2324211		
FECHA:	18/02/2025	18/02/2025	FECHA
CONVENIO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	
MODIFICATORIO:	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,421,137.08		C/I/A

Ing. Adán Burgos Monfil		Arq. Labir Jaramel Jimenez	
DIRECTOR DE OBRAS		RESIDENTE DE OBRAS EN FUNCIONES DE SUPERVISOR DE OBRA	
		FORMATO 11	

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	N/A	
TIPO DE ZONA:	RURAL		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA		
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	SI	X	NO
LATITUD	19.578170700	LONGITUD	-96.929723900

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS		5 MILLAR		CARGOS ADICIONALES		IMPORTE NETO
	MONTO CON IVA	No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
3 N	\$396,760.37	SPEI	\$272,601.74	2677E	\$396,760.37	\$119,028.11	\$1,710.17	\$3,420.35	\$272,601.74
2 N	\$351,413.10	SPEI	\$241,445.04	04ABA1	\$351,413.10	\$105,423.93	\$1,514.71	\$3,029.42	\$241,445.04
ANTICIPO	\$426,341.12	SPEI	\$426,341.12	28921	\$426,341.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,341.12
1 N	\$172,880.00	SPEI	\$118,780.49	EC7F3	\$172,880.00	\$51,864.00	\$745.17	\$1,490.34	\$118,780.49
3 A	\$76,169.72	SPEI	\$52,333.84	08955	\$76,169.72	\$22,850.92	\$328.32	\$656.64	\$52,333.84
TOTALES	\$997,223.19		\$685,161.11		\$997,223.19	\$299,166.96	\$4,298.37	\$8,596.75	\$1,111,502.23

B) REPORTE		AVANCE FÍSICO REAL												
	EXISTE	FECHAS												
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$324,935.58	20/06/2025												
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$685,161.11													
FINQUITO CON IVA:	\$0.00													
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:														

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	7.28	52.89	22.88	24.23	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	10	53.2	31.8	4	0.1	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	10	63.2	95	99	99.1	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	20.23	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	
----------------	--

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

CMAS

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/07/2025
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		Antecedentes:		
Obras Realizadas con FISM-DF:	SI	X	NO	
TIPO DE ZONA:	CLAVE AGEB:			
SE Encuentra en una ZAP:	SI	NO	X	
SE Encuentra en el Catálogo	SI	X	NO	
Grado de Rezag Social:		MUY ALTO	ALTO	MEDIO
				BAJO
				MUY BAJO
				X
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA
				RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		
LATITUD	LONGITUD	
19.506683800	-96.871869300	

[illegible][illegible]

B) REPORTE		AVANCE FISICO REAL											
EXISTE		FECHAS											
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00												
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00												
FINQUITO CON IVA:	\$0.00												
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:													
OBSERVACIONES:													

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

* En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACION:	02/07/2025
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090016		DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO AMAZONAS, ENTRE RIO JAMAPA Y RIO COATZACOALCOS, DE LA COLONIA CAROLINO	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		Antecedentes:		Descripción detallada del objeto (meta) de la obra:	
Obras realizadas con FISM-DF:		Grado de rezago social:		Rehabilitación de alcantarillado sanitario y red de agua potable en la calle Río Amazonas, entre Río Jamapa y Río Coatzacoalcos, de la Colonia Carolino Anaya y Calle Huasteca, entre Río Coatzacoalcos y Totonaca, de la Colonia Culturas Mexicanas, en Xalapa, Veracruz	
Tipo de zona:		Clave:			
SE encuentra en una zap:		AGEB:			
SE encuentra en el catálogo		SI			

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		Tipo de contribución del proyecto:		Tipo de licitación:	
LONGITUD		DIRECTA		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
LATITUD		COMPLEMENTARIA		LICITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*		Facturas		Tipo de licitación:	
				ADJUDICACIÓN DIRECTA	
				LICITACIÓN PÚBLICA	

No. Est.	Monito con IVA	Pólizas cheque	Monito	No.	Importe obra con IVA	Amortizado con IVA	5 Millar	Cargos adicionales	Importe neto
3 FINQUITO	\$394,741.11	SPEI	\$274,617.30	418	\$394,741.11	\$118,422.34	\$1,701.47	\$0.00	\$274,617.30
1 A	\$28,859.87	SPEI	\$20,077.51	413	\$28,859.87	\$8,657.96	\$124.40	\$0.00	\$20,077.51
1 N	\$617,542.74	SPEI	\$429,618.10	414	\$617,542.74	\$185,262.82	\$2,661.82	\$0.00	\$429,618.10
ANTICIPO	\$403,050.64	SPEI	\$403,050.64	410	\$403,050.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,050.64
2N	\$213,440.99	SPEI	\$148,488.69	415	\$213,440.99	\$64,032.30	\$920.00	\$0.00	\$148,488.69
2A	\$88,917.41	SPEI	\$61,858.93	416	\$88,917.41	\$26,675.22	\$383.26	\$0.00	\$61,858.93

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-006-2025		FECHA:		18/02/2025	
CONTRATISTA:		SUPERVISION CONSTRUCCION Y EDIFICACION LEO SA DE CV		RFC:		SCE1107071N6	
MONTO CONTRATADO:		\$1,343,502.12		PROGRAMADA		REAL	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO		19/02/2025		19/02/2025	
		TÉRMINO		19/05/2025		19/05/2025	
		DÍAS		90		90	
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$403,050.64		PORCENTAJE:	
		FECHA DE PAGO:		26/02/2025		30.00	

TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$403,050.64		\$115,819.15		\$134,350.21	
AFIANZADORA:		INTERREY, ASEGURADOR INTERREY, ASEGURADOR INTERREY		2323820		23422391	
FECHA:		18/02/2025		18/02/2025		22/05/2025	
CONVENIO		MONTO		EXISTE		IMPORTE/PERIODO	
MODIFICATORIO:		PLAZO		INICIAL		FINAL	
		NO APLICA		X		C/I/A	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,343,502.12					

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Oscar Jair Rojas Ortiz
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

FORMATO 11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XALAPA-ENRIQUEZ	DESCRIPCION DE LA OBRA:	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DAMAS ROTARIAS, ENTRE CLUB ROTARIO Y CALLE POPOCATÉPETL, DE LA COLONIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	2025309090017		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		Antecedentes:	
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
ZONA:	AGEB:		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	
	SI	DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA	

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LONGITUD	-96.889847400

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. Est.	Monto con IVA		Pólizas Cheque		Facturas		Importe obra estimación	Monto con IVA	Amortizado con IVA	Cargos adicionales		Importe neto
	No.	Monto	No.	Monto	5 Millar	Millar						
3 FINQUITO	SPEI	\$500,777.03	SPEI	\$337,230.26			\$500,777.03	\$161,388.25	\$2,158.52	\$0.00		\$337,230.26
1 N	SPEI	\$357,109.70	SPEI	\$248,437.52			\$357,109.70	\$107,132.91	\$1,539.27	\$0.00		\$248,437.52
ANTICIPO	SPEI	\$394,881.77	SPEI	\$394,881.77			\$394,881.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$394,881.77
2 N	SPEI	\$421,202.04	SPEI	\$293,025.90			\$421,202.04	\$126,360.61	\$1,815.53	\$0.00		\$293,025.90
TOTALES		\$1,279,088.77		\$878,693.68			\$1,279,088.77	\$394,881.77	\$5,513.32	\$0.00		\$1,273,575.45

B) REPORTE		FECHAS	
MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE \$0.00		
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$541,463.42		
FINQUITO CON IVA:	\$337,230.26	19/06/2025	
ACTA ENTREGA RECEPCION:	X	16/05/2025	

AVANCE FISICO REAL											
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
PROGRAMADO	0	7.97	36.71	36.03	19.29	0	0	0	0	0	0
REAL	0	10	45	43	1	1	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	10	55	98	99	100	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,316,272.58	C/IVA
---	----------------	-------

Ing. Adán Burgos-Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Juan Ortiz Lagunes
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

FECHA DE ELABORACION:	02/07/2025
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DAMAS ROTARIAS, ENTRE CLUB ROTARIO Y CALLE POPOCATÉPETL, DE LA COLONIA ROTARIA, EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

MONTO AUTORIZADO:	\$1,450,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,450,000.00	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS, XALAPA	NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS, XALAPA	
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	MUNICIPIO DE XALAPA	EXISTE

TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitación pública	

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-003-2025	FECHA:	14/02/2025
CONTRATISTA:	CONSTRUTIVALES MAXMAR SA DE CV		
RFC:	CMA140618M40		
MONTO CONTRATADO:	\$1,316,272.58	PROGRAMADA	REAL
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO 15/02/2025	TERMINO 15/05/2025	15/05/2025
	DÍAS 90		90
ANTICIPO:	APLICA X NO APLICA	MONTO: \$394,881.77	PORCENTAJE: 29.99
	FECHA DE PAGO:	26/02/2025	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$394,881.77	\$113,471.77	\$127,908.88
AFIANZADORA:	LA COMPAÑIA DE GARANTIA	COMPANIA DE GARANTIA FINANCIERA	
NO. DE FIANZA:	BKY-0889-0239770	BKY-0889-0239773	BKY-0889-0252766
FECHA:	14/02/2025	14/02/2025	30/05/2025
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO INICIAL	FINAL	
	NO APLICA X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,316,272.58		C/IVA

EJERCICIO 2025

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	
		XALAPA-ENRIQUEZ	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CAORA ENTRE CALLE LINDIÁMBAR Y CALLE POBIE. CALLE POBIE ENTRE CALLES ENCINO
		202530900018	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		Antecedentes:	
Obras Realizadas con FISM-DF:		SI	NO
TIPO DE ZONA:	CLAVE AGE:	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
RURAL		ALTO	BAJO
URBANA		MUY ALTO	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	NO	COMPLEMENTARIA	
	SI	DIRECTA	
	NO	RESTRINGIDA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	LONGITUD		
19.556624800	-96.948534300		
C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*			
Pólizas Cheque		Facturas	

[illegible]

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-007/2025		FECHA:		18/02/2025			
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CODIEU, SA DE CV							
RFC:		CIC041221PH2							
MONTO CONTRATADO:				\$1,285,567.22		C/IVA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL			
		INICIO		19/02/2025		19/02/2025			
		TERMINO		19/05/2025					
		DÍAS		90		102			
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA			
		MONTO:		\$385,670.16		PORCENTAJE:		29.99	
		FECHA DE PAGO:		05/03/2025					

B) REPORTE		AVANCE FÍSICO REAL												
EXISTE		FECHAS												
Monto pagado en el mes:		\$0.00												
Monto pagado acumulado:		\$451,452.98												
Finiquito con IVA:		\$0.00												
Acta entrega recepción:														
OBSERVACIONES:														

TIPO DE FINANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFANZADOR:	\$385,670.16	\$110,824.76	
AFANZADORA:	INSTITUCIÓN DE GARAN INSTITUCIÓN DE GARAN		
No. DE FINANZA:	3006143	3006148	
FECHA:	18/02/2025	18/02/2025	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRA:		\$1,285,567.22	C/IVA

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



FECHA DE ELABORACIÓN:
03/07/2025
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

						ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:							
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A	SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				SI		NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO				SI	X	NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA							
LATITUD	19.561864800			LONGITUD	-96.998428200		

[illegible]

TOTALES	\$1,221,881.67	\$1,216,614.94	\$1,221,881.67	\$0.00	\$5,266.73	\$0.00	\$1,216,614.94
---------	----------------	----------------	----------------	--------	------------	--------	----------------

B) REPORTE		AVANCE FISICO REAL												
	EXISTE	FECHAS												
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$499,006.73	27/06/2025												
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,216,614.94													
FINQUITO CON IVA:	\$499,006.73	27/06/2025												
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:														

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	1.38	52.22	22.01	1.87	0	0	0	0	0	0
PROGRAMADO REAL	0	0	10	47	23	20	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	10	57	80	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	5.21	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

* En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL FINO VICTORIA, ENTRE CALLES ISAURO SANCHEZ Y VICENTE VIVEROS, DE LA COLONIA PRESIDENTES Y ALEJANDRO MOLINA, DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2025309090020	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		CLAVE	N/A	
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	AGEB:	SI	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI	X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LONGITUD		-96.939590000
LATITUD				19.537768300

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS				
	MONTO CON IVA	No.	MONTO	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
2 N	\$427,495.03	SPEI	\$293,718.57	\$128,248.51	\$1,842.65	\$3,685.30	\$293,718.57
ANTICIPO	\$501,228.68	SPEI	\$501,228.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,228.68
1N	\$359,808.97	SPEI	\$242,211.95	\$107,942.69	\$1,550.90	\$8,103.43	\$242,211.95
2A	\$210,818.61	SPEI	\$147,273.74	\$63,245.58	\$908.70	-\$609.41	\$147,273.74
TOTALES	\$998,122.61		\$683,204.26	\$299,436.78	\$4,302.25	\$11,179.32	\$1,184,432.94

B) REPORTE

MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS											
		13/06/2025											
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$440,992.31												
FINQUITO CON IVA:	\$683,204.26												
ACTA ENTREGA RECEPCION:	\$0.00												

OBSERVACIONES:

AVANCE FISICO REAL													
AVANCE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO		0	7.28	38.73	33.09	20.9	0	0	0	0	0	0	0
REAL		0	2	35	41	21	0.1	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO		0	2	37	78	99	99.1	0	0	0	0	0	0
ATRASSO (%)		0	5.28	3.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

FECHA DE ELABORACION:	02/07/2025
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL FINO VICTORIA, ENTRE CALLES ISAURO SANCHEZ Y VICENTE VIVEROS, DE LA COLONIA FRANCISCO FERRER GUARDIA, Y EN 2A PRIV. DE ALEJANDRO MOLINA, ENTRE CIRCUITO PRESIDENTES Y ALEJANDRO MOLINA, DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99.1%

MONTO AUTORIZADO:		\$1,850,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,850,000.00	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS, XALAPA		NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA	CMAS, XALAPA		NO APLICA
FACTIBILIDAD:	EXISTE	X	NO EXISTE
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA	MUNICIPIO XALAPA		NO APLICA
LOS PERMISOS:			EXISTE
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA		
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS		X
	licitacion publica		

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-009-2025	FECHA:	24/02/2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CARIBE SA DE CV		
REC:	CCA190206NR1		
MONTO CONTRATADO:	\$1,670,762.28		C/IVA
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO 24/02/2025	PROGRAMADA	REAL
	TERMINO 24/05/2025		24/02/2025
	DIAS 90		127
ANTICIPO:	APLICA X	NO APLICA	
	MONTO: \$501,061.60	PORCENTAJE:	29.99
	FECHA DE PAGO:		07/03/2025

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO FIANZADO:	\$501,228.68	\$144,031.23	
FIANZADORA:	L COMPAÑIA DE GARANTIA COMPAÑIA DE GARANTIA		
NO. DE FIANZA:	BKY-0235-0240312	BKY-0235-0240315	
FECHA:	24/02/2025	24/02/2025	
CONVENIO	MONTO EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MODIFICATORIO:	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,670,762.28	C/IVA

Ing. Adán Burgos Morán
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Luis Ángel Avelino Martín
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

C.M.A.S.

C.M.A.S.

C.M.A.S.C.M.A.S.C.M.A.S.C.M.A.S.C.M.A.S.C.M.A.S.C.M.A.S.

C.M.A.S.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACION:	02/07/2025
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2025309090022	
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALcantarillado sanitario y red de agua potable en la calle ENCINO, ENTRE CALLES CIPRES Y LUIS DONALDO COLOSIQ; EN ANDADOR GARDENIAS,	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A	
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD -96.878960200	
LATITUD 19.497852900	

ANTECEDENTES:	
GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X	
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA	
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*	
FACTURAS	
No. EST.	MONTO CON IVA
2 N	\$550,363.88
ANTICIPO	\$347,190.19
1 N	\$292,979.39
1 A	\$43,235.50
2 A	\$142,425.32
PÓLIZAS CHEQUE	
No.	MONTO
SPEI	\$382,882.46
SPEI	\$347,190.19
SPEI	\$292,979.39
SPEI	\$30,078.49
SPEI	\$99,083.82
FACTURAS	
5 MILLAR	
AMORTIZADO CON IVA	
CARGOS ADICIONALES	
IMPORTE NETO	
MONTO AUTORIZADO: \$1,300,000.00	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,300,000.00	
VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS	
FACTIBILIDAD:	
PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.	
LOS PERMISOS:	
TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA EXISTE	
LICITACION: LICITACION A MENOS 3 PERSONAS X	

NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-016-2025	
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA YEBAL-MAKA-JU SA DE CV	
RFC: CYE200803Q80	
MONTO CONTRATADO: \$1,157,300.62	
PERIODO DE EJECUCION: INICIO 08/03/2025 REAL 08/03/2025	
TERMINO 05/06/2025	
DÍAS 90	
ANTICIPO: APLICA X NO APLICA 115	
MONTO: \$347,190.18	
FECHA DE PAGO: 20/03/2025	
PORCENTAJE: 30.00	

TIPO DE FIANZA: ANTIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS	
MONTO FIANZA: \$347,190.19	
FIANZADORA: SURADORA ASERTA, SA DURADORA ASERTA, S.A. D	
FECHA: 3616-28738-6	
MONTO: 3616-28739-5	
FECHA: 07/03/2025	
CONVENIO: EXISTE IMPORTE/PERIODO	
MODIFICATORIO: MONTO INICIAL FINAL	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$1,157,300.62	
Ing. Adán Burgos Mijangil	
DIRECTOR DE OBRAS	
Arq. Blanca Aurora Anelli Flores	
SUPERVISOR DE OBRAS	
FORMATO 11	

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

CMAS

FECHA DE ELABORACIÓN:
02/07/2025
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

		ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE	CLAVE		
ZONA:	AGEB:		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X
		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
		MUY ALTO	ALTO
		MEDIO	BAJO
		MUY BAJO	
		X	
		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
LATTITUD	19.568383200				
LONGITUD	-96.939960000				

[illegible]

B) REPORTE		AVANCE FÍSICO REAL												
	EXISTE	FECHAS												
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$263,724.57	19/06/2025												
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$419,865.54													
FINQUITO CON IVA:	\$0.00													
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:														
OBSERVACIONES:														

			AVANCE FÍSICO REAL											
	AVANCE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	PROGRAMADO		0	0	40.96	35.38	21.23	2.23	0	0	0	0	0	0
	REAL		0	0	1	38	52	1	0	0	0	0	0	0
	ACUMULADO		0	0	1	39	91	92	0	0	0	0	0	0
	ATRASO (%)		0	0	39.96	0	0	1.23	0	0	0	0	0	0

Ing. Adán Burgos Mon
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2025
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

No. DE OBRA: 2025309090024

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANTONIO M. CARLÓN, ENTRE LAS CALLES ISAURO ACOSTA Y ESPERANZA AZCÓN, Y EN PRIVADA, DE LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA, EN XALAPA, VERACRUZ.

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

SI X NO

CLAVE N/A

AGEB: SI NO X

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD -96.935778500

ANTECEDENTES:

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANTONIO M. CARLÓN, ENTRE LAS CALLES ISAURO ACOSTA Y ESPERANZA AZCÓN, Y EN PRIVADA, DE LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA, EN XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCION DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 99.1%

MONTO AUTORIZADO: \$1,050,000.00

C/IVA \$1,050,000.00

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: CMAS

PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA

EXISTE

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS

EXISTE

NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-011-2025

FECHA: 24/02/2025

CONTRATISTA: WILBERT VALENCIA CERVANTES

RFC: VACW880110DTA

MONTO CONTRATADO: \$952,393.03

PROGRAMADA REAL

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 24/02/2025

TERMINO 24/05/2025

24/02/2025

ANTICIPO: APLICA X NO APLICA

MONTO: \$261,050.92

PORCENTAJE: 27.41

FECHA DE PAGO: 16/04/2025

TIPO DE FIANZA: MONTO AFANZADO: \$285,717.91

CUMPLIMIENTO \$82,102.85

AFANZADORA: INSTITUCION DE GARAN INSTITUCION DE GARAN

NO. DE FIANZA: 30080053

FECHA: 24/02/2025

3008854

CONVENIO MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO

MODIFICATORIO: PLAZO INICIAL FINAL

09/05/2024 31/12/2024

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$952,393.03

C/IVA

Ing. Adán Burgos Montiel

DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Hésyer Ali Montreña Medel

SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

MONTO PAGADO EN EL MES: \$0.00

EXISTE

FECHAS

MONTO PAGADO ACUMULADO: \$272,871.02

FINQUITO CON IVA: \$0.00

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE

PROGRAMADO

REAL

ACUMULADO

ATRASO (%)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACION:	24/07/2025
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2025309090025	
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ESTIBADORES ENTRE LAS CALLES TEJEDORES Y CIRCUITO 1, DE LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, EN XALAPA, VERACRUZ.	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo: SI X NO	
Obras Realizadas con FISM-DF: CLAVE N/A	
ZONA: RURAL URBANA	
SE encuentra en una ZAP: SI NO X	
SE encuentra en el Catálogo: SI X NO	
Grado de Rezago Social: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X	
Tipo de Contribución del Proyecto: DIRECTA X COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA	
Coordenadas de Georreferencia: LATITUD 19.498291700 LONGITUD -96.874813200	

Antecedentes:	
Descripción detallada del objeto (meta) de la obra:	
Rehabilitación de red de agua potable y alcantarillado sanitario en la calle Estibadores entre las calles Tejedores y Circuito 1, de la Colonia Miguel Alemán, en Xalapa, Veracruz.	
Descripción del avance físico de la obra en el mes:	
Avance físico de la obra del 99.1%	

Monto Autorizado:	
Monto del Presupuesto Base:	
Validación del Proyecto:	
Dependencia que valida:	
Factibilidad del Proyecto:	
Dependencia que otorga la factibilidad:	
Permisos y concesiones:	
Dependencia que otorga los permisos:	
Tipo de Licitación:	
Adjudicación directa invitación a menos 3 personas licitación pública	

No. de Contrato:	CMAS-OP-012-2025	Fecha:	03/03/2025
Contratista:	CONSTRUCTORA XAMO SA DE CV		
RFC:	CXA140924I03		
Monto Contratado:	\$1,092,131.31	Programada	REAL
Periodo de Ejecución:	Inicio 03/03/2025	Término 10/06/2025	03/03/2025
	Días 100		90
Anticipo:	Aplica Monto: X	No aplica	
	Fecha de pago: 20/03/2025	Porcentaje: 29.99	

Tipo de fianza:	
Monto Afanzado:	
No. de fianza:	
Fecha:	
Convenio Modificatorio:	
Monto Total Contratado (Convenio + Contrato) de obra:	

Observaciones:	
Ing. Víctor Hugo Hernández Pérez SUPERVISOR DE OBRAS	
Ing. Adán Burgos-Montañón DIRECTOR DE OBRAS	
FORMATO 11	

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACION:
02/07/2025

MES QUE SE REPORTA
JUNIO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2025309090026

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CANAL PLUVIAL, EN CALLE ANDADOR DOS, ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y FINAL DEL ANDADOR, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA

RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD -96.903175000

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS		IMPORTE OBRA		CARGOS ADICIONALES		IMPORTE NETO
	MONTO CON IVA	No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	ANOTIZADO CON IVA	5 MILLAR	MONTO CON IVA	
2 A	\$189,516.59	SPEI	\$131,844.73	307	\$189,516.59	\$56,854.98	\$816.88	\$0.00	\$131,844.73
ANTICIPO	\$486,533.04	SPEI	\$486,533.04	300	\$486,533.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,533.04
1 N	\$419,299.64	SPEI	\$290,567.25	303	\$419,299.64	\$125,789.89	\$1,807.33	\$1,135.17	\$290,567.25
2 N	\$607,692.44	SPEI	\$422,765.35	306	\$607,692.44	\$182,307.73	\$2,619.36	\$0.00	\$422,765.35

MONTO AUTORIZADO: \$1,800,000.00

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,800,000.00

VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE

DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS, XALAPA

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE

FACTIBILIDAD: CMAS, XALAPA

PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE

DEPENDENCIA QUE OTORGA: MUNICIPIO DE XALAPA

LOS PERMISOS: EXISTE

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA

INVTACION A MENOS 3 PERSONAS

EXISTE

NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-018-2025

FECHA: 07/03/2025

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR QUALITY SA DE CV

RFC: GCQ030131BVO

MONTO CONTRATADO: \$1,621,776.79

PROGRAMADA

REAL

PERIODO DE EJECUCION: INICIO 08/03/2025

TERMINO 15/06/2025

DIAS 100

115

ANTICIPO: APLICA X NO APLICA

MONTO: \$486,533.04

PORCENTAJE: 30.00

FECHA DE PAGO: 19/03/2025

TIPO DE FIANZA: ANTIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO: \$486,533.04

INSTITUCION DE GARAN: INSTITUCION DE GARAN

AFIANZADORA: 3010211

FECHA: 07/03/2025

IMPORTE/PERIODO

FECHA

CONVENIO: MONTO EXISTE

MODIFICATORIO: PLAZO INICIAL FINAL

NO APLICA X

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO * CONTRATO) DE OBRA: \$1,621,776.79

C/IVA

Ing. Adán Burgos Morán

DIRECTOR DE OBRAS

Arg. Carlos Gustavo Hernández Paredes

SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACION:
02/07/2025
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2025309090027	
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA IZTACCHUATL, ENTRE	

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA IZTACCHUATL, ENTRE CALLE IZTACCHUATL Y FINAL DE CALLE, DE LA COLONIA LADERAS DEL MACUILTEPETL, EN XALAPA, VERACRUZ.	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%	

MONTO AUTORIZADO:	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	
VALIDACION DEL PROYECTO:	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA	
FACTIBILIDAD:	
PERMISOS Y CONCESIONES:	
DEPENDENCIA QUE OTORGA	
LOS PERMISOS:	
TIPO DE LICITACION:	
ADJUDICACION DIRECTA	
LICITACION A MENOS 3 PERSONAS	
LICITACION PUBLICA	

NO. DE CONTRATO:	
CONTRATISTA:	
RFC:	
MONTO CONTRATADO:	
PERIODO DE EJECUCION:	
ANTICIPO:	
CUMPLIMIENTO	
VICIOS OCULTOS	

TIPO DE FIANZA:	
MONTO AFIANZADO:	
AFIANZADORA:	
No. DE FIANZA:	
FECHA:	
CONVENIO	
MODIFICATORIO:	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO +	
CONTRATO) DE OBRA:	

Ing. Adán Burgos Mendiola
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Rubén Omar Morales Bandalá
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

EJERCICIO 2025

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		207. FOMENTO DE PROYECTOS GENERALES
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	Nº. DE OBRA:	20753090900028

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		Antecedentes:	
Obras Realizadas con FISM-DF:		SI	NO
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	CLAVE AGE: N/A		
GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO			
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA			

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
LATITUD	19.567707700				
LONGITUD	-96.907622500				

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*		FACTURAS
	PÓLIZAS CHEQUE	

[illegible][illegible]

B) REPORTE		AVANCE FÍSICO REAL												
	EXISTE	FECHAS												
Monto pagado en el mes:	\$0.00													
Monto pagado acumulado:	\$0.00													
Finiquito con IVA:	\$0.00													
Acta entrega recepción:														

<p>OBSERVACIONES:</p>

FORMATO 11

CMAS

JUNIOR

FECHA DE ELABORACIÓN:	24/07/2025
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

EJERCICIO 2025

CMAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACION:	02/07/2025
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 2DA PRIVADA DE LAZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2025309090031	
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		ANTECEDENTES:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
TIPO DE ZONA:	CLAVE:	MUY ALTO	ALTO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	AGEB:	ALTO	BAJO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	NO	X
	SI	X	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LONGITUD	
19.521616700		-96.939230000	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:		AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 50%	
DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 2DA PRIVADA DE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EUCALIPTO, DE LA COLONIA BENITO JUAREZ O LOMAS DE TECUANAPAN, EN XALAPA, VERACRUZ.	

MONTO AUTORIZADO:		\$1,950,000.00	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,950,000.00	
VALIDACION DEL PROYECTO:		EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS, XALAPA	NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		CMAS, XALAPA	NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		H. AYUNTAMIENTO XALAPA	EXISTE
TIPO DE LICITACION:		ADJUDICACION DIRECTA	
		LICITACION A MENOS 3 PERSONAS	
		LICITACION PUBLICA	

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-029-2025	
CONTRATISTA:		GRUPO EMPRESARIAL Y CONSTRUCTOR MAYAMME SA DE CV	
RFC:		GEC241029ET3	
MONTO CONTRATADO:		\$1,858,725.80	
PERIODO DE EJECUCION:		INICIO	16/04/2025
		TERMINO	24/07/2025
		DIAS	100
		APLICA	X
		MONTO:	\$557,617.74
		FECHA DE PAGO:	24/04/2025
		PORCENTAJE:	30.00

TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO	
MONTO AFIANZADO:		\$557,617.74	
AFIANZADORA:		INSTITUCION DE GARAN	
No. DE FIANZA:		25A13788	
FECHA:		15/04/2025	
CONVENIO MODIFICATORIO:		MONTO	EXISTE
		PLAZO	INICIAL
		NO APLICA	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,858,725.80	

OBSERVACIONES:		Ing. Adán Burgos Montiel	
		Arq. Luis Ángel Avelino Marín	
		SUPERVISOR DE OBRAS	

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

FORMATO 11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACION:
02/07/2025
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

No. DE OBRA: 2025309090032

CLAVE

AGEB:

SI

NO

SI

NO

CLAVE

AGEB:

SI

NO

SI

NO

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA:

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD

-96.948550000

ANTECEDENTES:

TIPO DE ZONA:

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD

-96.948550000

PLANEAACION Y DATOS GENERALES

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 99%

ESTADO FINANCIERO DE OBRA *

No. EST.	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS		IMPORTE NETO				
	MONTO CON IVA	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA		5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES		
1 A	\$146,362.55	SPEI	\$100,718.89	CFDI-217	\$146,362.55	\$43,908.76	\$630.87	\$1,104.03	\$100,718.89
ANTICIPO	\$393,675.79	SPEI	\$393,675.79	212	\$393,675.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,675.79
1 N	\$434,871.14	SPEI	\$299,255.08	CFDI-216	\$434,871.14	\$130,461.34	\$1,874.44	\$3,280.28	\$299,255.08
TOTALES	\$581,233.69		\$399,973.97		\$581,233.69	\$174,370.10	\$2,505.31	\$4,384.31	\$793,649.76

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

18/06/2025

MONTO PAGADO EN EL MES:

\$399,973.97

MONTO PAGADO ACUMULADO:

\$399,973.97

FINQUITO CON IVA:

\$0.00

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	5.67	39.65	54	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	34.27	40.73	24	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	34.27	75	99	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

NO. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

RFC:

MONTO CONTRATADO:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

ANTICIPO:

CMAS-OP-026-2025

FAUSTO CESAR GARCIA MARTINEZ

GAMF880225F19

\$1,326,547.32

PROGRAMADA

08/04/2025

06/07/2025

90

NO APLICA

\$393,586.58

11/04/2025

29.67

FECHA:

07/04/2025

REAL

08/04/2025

84

TIPO DE FIANZA:

MONTO AFIANZADO:

AFIANZADORA:

No. DE FIANZA:

FECHA:

CONVENIO

MODIFICATORIO:

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO)

CONTRATO DE OBRA:

ANTICIPO

\$397,964.20

URADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA, S.A. D

3679-03770-8

07/04/2025

EXISTE

IMPORTE/PERIODO

INICIAL

FINAL

\$1,326,547.32

C/IVA

Ing. Adán Burgos Morfín

DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Omar Josue del Carmen Suarez

SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

1 de 1

2015

FECHA DE ELABORACION:
02/07/2025
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

* En caso de requerir más filas en el anastado de estado financiero utilizar otra hoja

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACION:	02/07/2025
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2025309090034
DESCRIPCION DE LA OBRA:	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BANCOS ENTRE CALLE NORTE-SUR Y CALLE CIRCUITO INDUSTRIAL, Y ANDADOR BANCOS, ENTRE CALLE NORTE-SUR Y CALLE CIRCUITO INDUSTRIAL, DE LA COLONIA EL INGENIO (CENTRAL DE ABASTOS), EN XALAPA, VERACRUZ	

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BANCOS ENTRE CALLE NORTE-SUR Y CALLE CIRCUITO INDUSTRIAL, Y ANDADOR BANCOS, ENTRE CALLE NORTE-SUR Y CALLE CIRCUITO INDUSTRIAL, DE LA COLONIA EL INGENIO (CENTRAL DE ABASTOS), EN XALAPA, VERACRUZ	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 71%	

MONTO AUTORIZADO:		\$1,400,000.00		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,400,000.00		C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS, XALAPA		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		CMAS, XALAPA		
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA		
TIPO DE LICITACION:		ADJUDICACION DIRECTA		
		INVITACION A MENOS 3 PERSONAS		
		LICITACION PUBLICA		
		EXISTE		
		X		

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-031-2025	FECHA:	15/04/2025
CONTRATISTA:	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ESRO SA DE CV		
RFC:	ICE0001216EA		
MONTO CONTRATADO:	\$1,287,836.27	PROGRAMADA	REAL
		16/04/2025	16/04/2025
PERIODO DE EJECUCION:		14/07/2025	
		DIAS	90
		APLICA	NO APLICA
		MONTO:	\$386,222.09
		FECHA DE PAGO:	24/04/2025
ANTICIPO:		PORCENTAJE:	25.99

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$386,350.88	\$111,020.37	
AFIANZADORA:	INSTITUCION DE GARAN	INSTITUCION DE GARAN	
No. DE FIANZA:	3020731	3020735	
FECHA:	15/04/2025	15/04/2025	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,287,836.27		C/IVA

Ing. Adán Burgos Montañi	Ing. Víctor Hugo Hernández Pérez
DIRECTOR DE OBRAS	SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACION:	02/07/2025
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ

FEUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

No. DE OBRA: 2025309090035

CLAVE: N/A

AGEB: SI

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD: -96.937795000

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

X

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

RURAL

URBANA

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD: -96.937795000

PLANIFICACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA JAZMIN, ENTRE CALLES JAZMIN Y TIALNECAPAN, DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ O LOMAS DE TECUANAPAN, EN XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA JAZMIN, ENTRE CALLES JAZMIN Y TIALNECAPAN, DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ O LOMAS DE TECUANAPAN, EN XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 100%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

FACTURAS

No. EST.

MONTO CON IVA

MONTO

No.

IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN

AMORTIZADO CON IVA

5 MILLAR

CARGOS ADICIONALES

IMPORTE NETO

1 FINIQUITO

\$468,721.07

\$346,976.07

40

\$468,721.07

\$119,724.65

\$2,020.35

\$0.00

\$346,976.07

ANTICIPO

\$119,724.65

\$119,724.65

40

\$119,724.65

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$119,724.65

TOTALES

\$468,721.07

\$346,976.07

\$468,721.07

\$119,724.65

\$2,020.35

\$0.00

\$466,700.72

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

MONTO PAGADO EN EL MES:

\$346,976.07

26/06/2025

MONTO PAGADO ACUMULADO:

\$346,976.07

26/06/2025

FINIQUITO CON IVA:

\$346,976.07

12/05/2025

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:

X

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE

PROGRAMADO

REAL

ACUMULADO

ATRASSO (%)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OBSERVACIONES:

FECHA DE ELABORACION:

02/07/2025

MES QUE SE REPORTA

JUNIO

NO. DE CONTRATO:

CMAS-OP-022-2025

FECHA:

25/03/2025

CONTRATISTA:

COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAM SA DE CV

RFC:

CCG140811F15

MONTO CONTRATADO:

\$399,082.15

PROGRAMADA

REAL

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO

25/03/2025

TERMINO

08/05/2025

DÍAS

45

ANTICIPO:

APLICA

MONTO:

\$119,724.64

NO APLICA

PORCENTAJE:

30.00

FECHA DE PAGO:

11/04/2025

TIPO DE FIANZA:

ANTICIPO

CUMPLIMIENTO

VICIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO:

\$119,724.65

\$34,403.63

\$46,872.11

AFIANZADORA:

URADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA, S.A. D

No. DE FIANZA:

3596-04450-4

3596-04450-2

3596-04510-9

FECHA:

25/03/2025

25/03/2025

12/05/2025

CONVENIO

MODIFICATORIO:

MONTO

PLAZO

INICIAL

FINAL

70254.87

02/05/2025

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:

\$469,337.02

CMAS

Ing. Agnén Burgos Montiel

DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Luis Ángel Avelino Marín

SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

1 de 1

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACION:	08/07/2025
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 202530900036	DESCRIPCION DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER ENTRE CALLE ALFONSIÑA STORNI Y CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE, EN LA COLONIA SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.				

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		ANTECEDENTES:	
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
ZONA: RURAL	AGEB: N/A	MUY ALTO	ALTO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	DIRECTA	X
		COMPLEMENTARIA	
		RESTRINGIDA	

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LONGITUD	-96.892677300
LATITUD	19.525088900

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS				IMPORTE NETO	
		No.	MONTO	No.	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES		
ANTICIPO	\$703,912.20	SPEI	\$703,912.20	176	\$703,912.20	\$0.00	\$0.00	\$703,912.20	

B) REPORTE		FECHAS	
MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE \$0.00		
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00		
FINQUITO CON IVA:	\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCION:			
OBSERVACIONES:			

AVANCE FISICO REAL											
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	33	60	44	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	54	34	74	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	54	88	74	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	25	69		0	0	0

Ing. Adán Burgos Morfíl		Ing. Civil Rubén Opatar Morales Bandala	
DIRECTOR DE OBRAS		SUPERVISOR DE OBRAS	
FORMATO 11			

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

CMAS

FECHA DE ELABORACIÓN:
02/07/2025
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

CMAS

CMAS

CMASCMASCMASCMASCMASCMASCMASCMAS

CMAS

CMAS

CMAS

FECHA DE ELABORACIÓN:
03/07/2025
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2025

FECHA DE ELABORACION:	03/07/2025
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 202530900040
DESCRIPCION DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO NO. 3, PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE N/A
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	BAJO MUY BAJO X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI NO X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI X NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LONGITUD	-96.847964500
LATITUD	19.534733400

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS						
	No.	MONTO	No.	MONTO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO		
IN	SPEI	\$692,954.09	45	\$996,067.84	\$4,293.40	\$0.00	\$692,954.09		
ANTICIPO	SPEI	\$1,843,003.95	97FF1	\$1,843,003.95	\$0.00	\$0.00	\$1,843,003.95		

B) REPORTE		FECHAS	
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$692,954.09	20/06/2025	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$692,954.09		
FINQUITO CON IVA:	\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCION:			

AVANCE FISICO REAL											
AVANCE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SEP	OCT
PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL		0	0	0	0	0	75	0	0	0	0
ACUMULADO		0	0	0	0	0	75	0	0	0	0
ATRASSO (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


OBSERVACIONES:	

Ing. Adán Burgos Montiel, DIRECTOR DE OBRAS	
Ing. Civil Juan Ortiz Lagunes SUPERVISOR DE OBRAS	
FORMATO 11	

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ
No. de obra:	2025309090001	Periodo:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NOGALES, (ENTRE LAS CALLES		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	08/07/2025

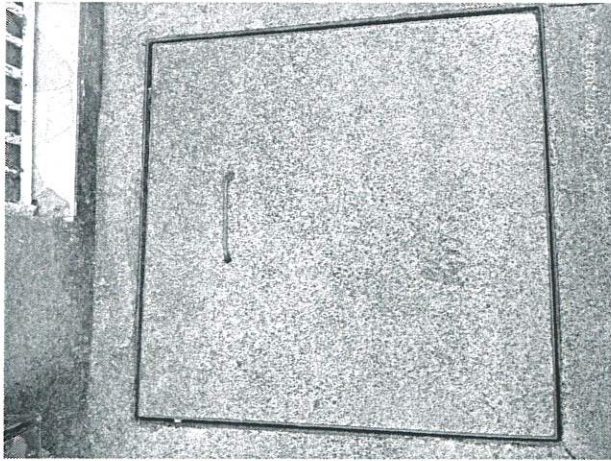

Registro sanitario

Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:

Toma domiciliaria

Observaciones:

Bianca Aurora Anell Flores

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal



c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Ofis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: INIPICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUÉZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090003 Período: JUNIO Número de estimación: INGRESOS PROPIOS
Descripción: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 2, PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ Fecha de revisión: 07/07/2025

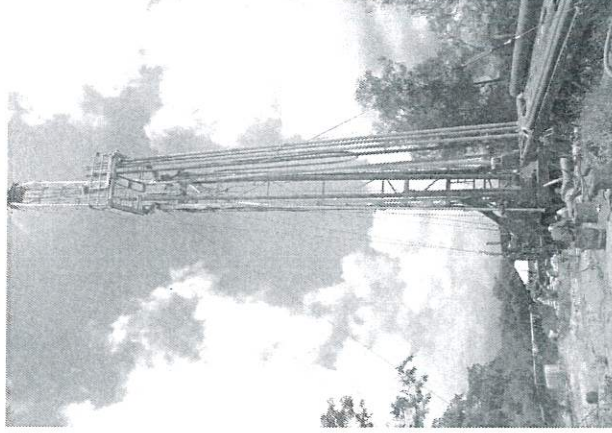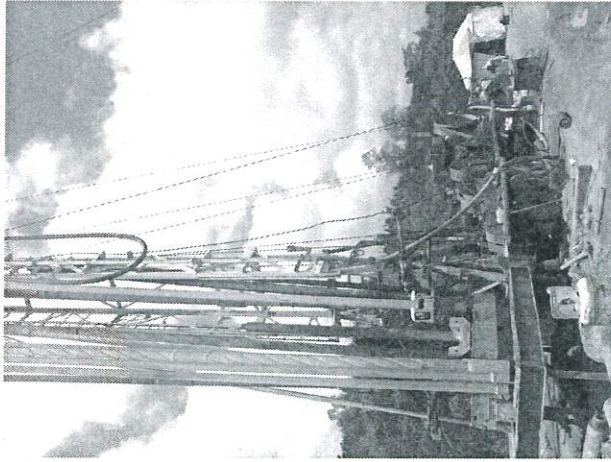

Concepto de obra ejecutado:

Maquinaria de perforación

Concepto de obra ejecutado:

Trabajos de perforación de pozo profundo

Observaciones:


Juan Ortiz Lagunes
Supervisor de Obras

ING. CIVIL
Profesión

c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090004	Periodo:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA ENCANTO Y FINAL DE LA CALLE, DE LA COLONIA JARDINES DE		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	08/07/2025

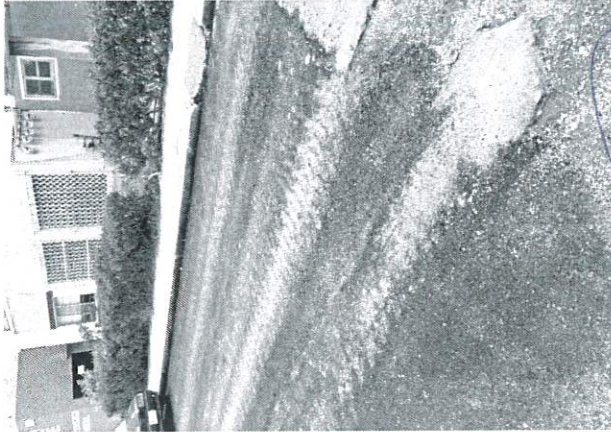

Concepto de obra ejecutado: construcción de cajas de válvulas

Concepto de obra ejecutado:

reposición de pavimento asfáltico

Observaciones:

Ruben Omar Morales Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

C.c.p.

C.c.p. Contralor Interno

C.c.p. Tesorero Municipal

C.c.p. Director de Obras Públicas



C.c.p. Orfis



REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090007 Periodo: JUNIO Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO SOBRE EL CERRO DE LA FUENTE de FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
GALAXIA, EN XALAPA, VERACRUZ Fecha de revisión: 08/07/2025

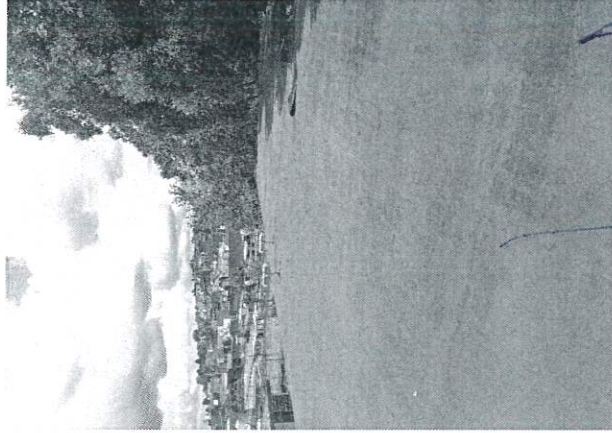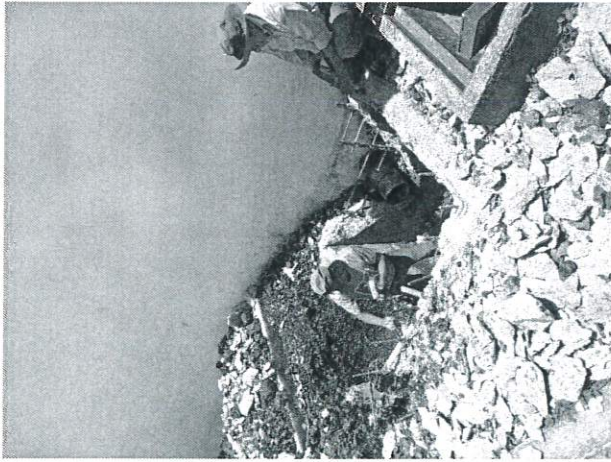

Concepto de obra ejecutado:

Demolición a caja de valvulas

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Impermeabilización de losa.

Jabir Jamez Jimenez

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra

ARQ.

Profesión

C.C.P.

C.C.P. Contralor Interno


C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090008	Periodo:	JUNIO
Descripción:	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE DEL ARROYO, ENTRE CALLE CIRCUITO PRESIDENTES Y CALLE DR. LUIS F. NACHÓN, DE LAS COLONIAS VICENTE		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	08/07/2025

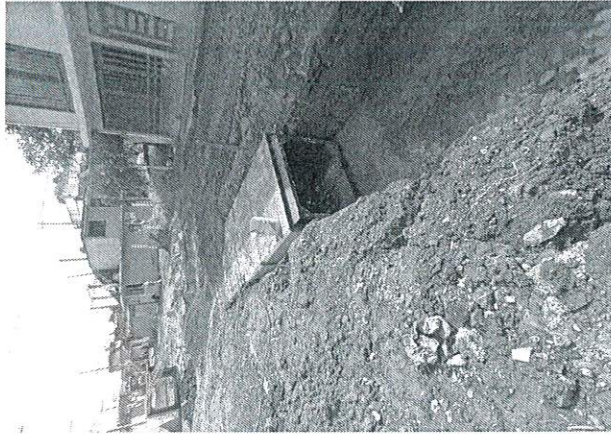

Concepto de obra ejecutado:	construcción de canal al cielo abierto con muros y losa de concreto	Concepto de obra ejecutado:	Suministro e instalación de cajón prefabricado de concreto
-----------------------------	---	-----------------------------	--

Observaciones:


Carlos Gustavo Hernández Paredes
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090009 Periodo: JUNIO Número de estimación: INGRESOS PROPIOS
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 08/07/2025
AGUACATE, ENTRE JOSÉ DE ARRILLAGA Y JOAQUÍN PENSADO, DE LA COLONIA ÁLVARO

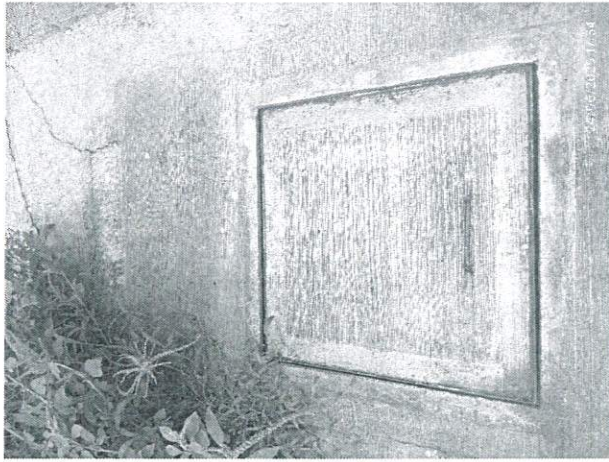

Concepto de obra ejecutado:

Registro sanitario

Concepto de obra ejecutado:

Calle terminada y en funcionamiento

Observaciones:

Bianca Aurora Anell Flores

Supervisor de Obras


ARQ. Profesión

c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
No. de obra:	2025309090010	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MARIO RUIZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSTO Y DIANA LAURA RIOJAS,	Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión:	08/07/2025

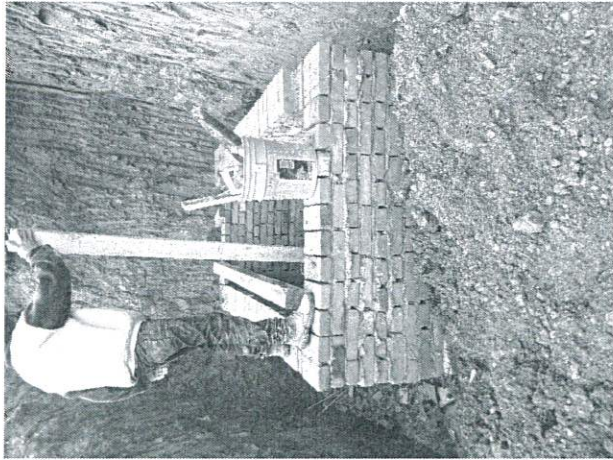

Concepto de obra ejecutado:

construcción de pozo especial para drenaje pluvial.

Concepto de obra ejecutado:

Construcción de caja de valvulas.

Observaciones:

Supervisor de Obras
Heber Ali Montemira Medel

ING. Profesión

c.c.p. Contralor Interno


c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Ofis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090011	Período:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE	Número de estimación:	EJERCICIO 2025
	FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLES AGUSTÍN MELGAR Y JACARANDAS Y EN CALLE	Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	07/07/2025

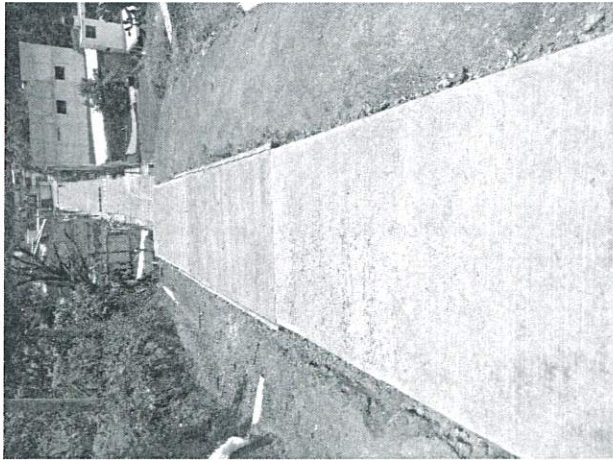

Concepto de obra ejecutado:	Reposición de banqueta de concreto	Concepto de obra ejecutado:	Construcción de Registro sanitario amadrinado
Observaciones:			
			Heber Ali Montehira Medel Supervisor de Obras
			ING. Profesión
			c.c.p. Contralor Interno
			c.c.p. Tesorero Municipal
			c.c.p. Director de Obras Públicas
			c.c.p. Orfis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090012	Periodo:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL CTO. TEODORO A. DEHESA ENTRE CALLE DOCTOR CARLOS ROMERO (EXTREMO ESTE) Y CALLE		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	07/07/2025

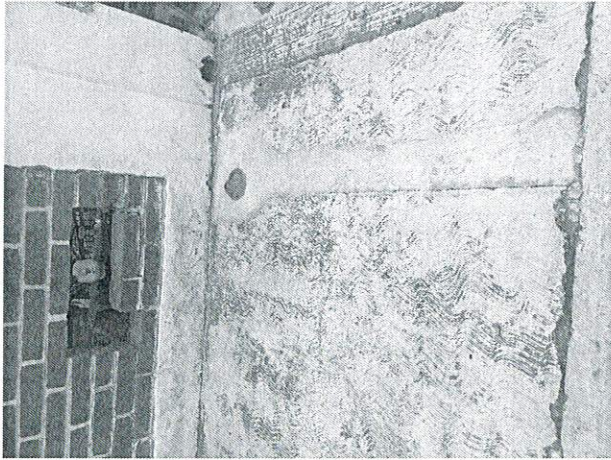


Concepto de obra ejecutado:	toma domiciliaria	Concepto de obra ejecutado:	instalación de brocal
Observaciones:		Oscar Jair Rojas Ortiz Supervisor de Obras	
		ING. Profesión	
		c.c.p. Contralor Interno	
		c.c.p. Tesorero Municipal	
		c.c.p. Director de Obras Públicas	
		c.c.p. Orfís	

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090013	Período:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE POZA RICA ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSTO Y CALLE CARDEL Y CALLE		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	07/07/2025




Concepto de obra ejecutado:	Calle en funcionamiento	Concepto de obra ejecutado:	Estado actual de la calle
Observaciones:			
		<div><div></div><div>Blanca Aurora Anell Flores</div><div>Supervisor de Obras</div></div>	
		ARQ.	
		Profesión	
		c.c.p. Contralor Interno	
		c.c.p. Tesorero Municipal	
		c.c.p. Director de Obras Públicas	
		c.c.p. Orfís	

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090014 Período: JUNIO Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
REHABILITACIÓN DE TRAGATORMENTAS, EN LAS CALLES CUAUHTÉMOC ENTRE. Fecha de revisión: 09/07/2025

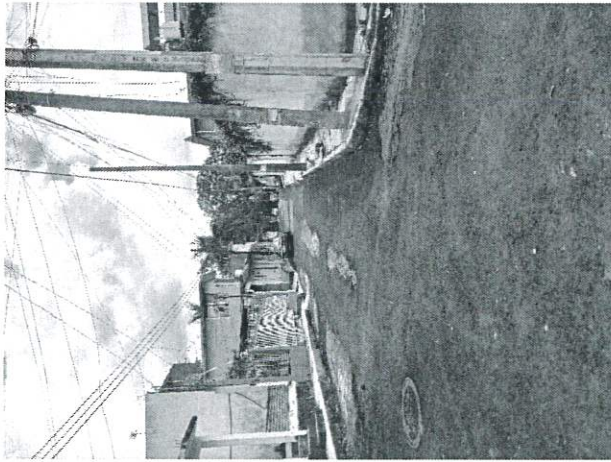

Concepto de obra ejecutado:

Reposición de asfalto.

Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de toma domiciliaria.

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra
ARQ.
Profesión
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090015	Periodo:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HUAZONTLE ENTRE CALLE PRIVADA BANDERILLA, CALLE PRIVADA CALLE CIRCUITO QUETZALCOATL Y CALLE PRIVADA BANDERILLA, CALLE PRIVADA		
Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025		
Número de estimación:			
Fuente de Financiamiento:			INGRESOS PROPIOS
Fecha de revisión:			08/07/2025



Concepto de obra ejecutado:

registros sanitarios en calle huazontle

Concepto de obra ejecutado:

pozo de visita en Privada bandera

Observaciones:

Víctor Hugo Hernández Pérez

Supervisor de Obras

ING.

Profesión

Contralor Interno

Tesorero Municipal


Director de Obras Públicas

c.c.p. Ofis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
No. de obra:	20253090900016	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión:	07/07/2025		

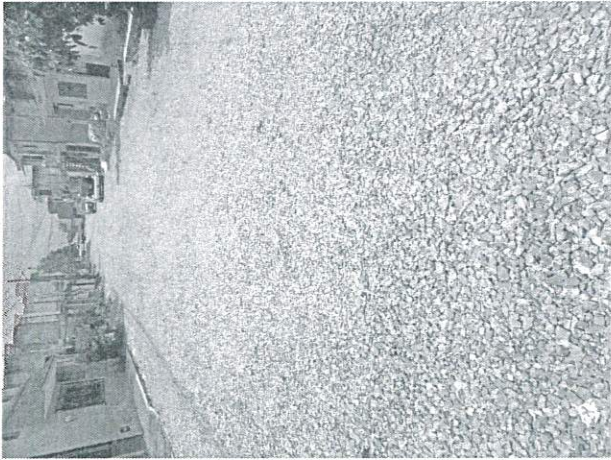

Concepto de obra ejecutado:

tendido de caliza

Concepto de obra ejecutado:

toma domiciliaria

Observaciones:

Oscar Jair Rojas Ortiz
Supervisor de Obras

ING.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno


c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Otros

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090017	Período:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE		
	DAMAS ROTARIAS, ENTRE CLUB ROTARIO Y CALLE POPOCATÉPETL, DE LA COLONIA		
Ejercicio fiscal:	Ejercicio de estimación:		EJERCICIO 2025
Fuente de financiamiento:		INGRESOS PROPIOS	
Fecha de revisión:		07/07/2025	

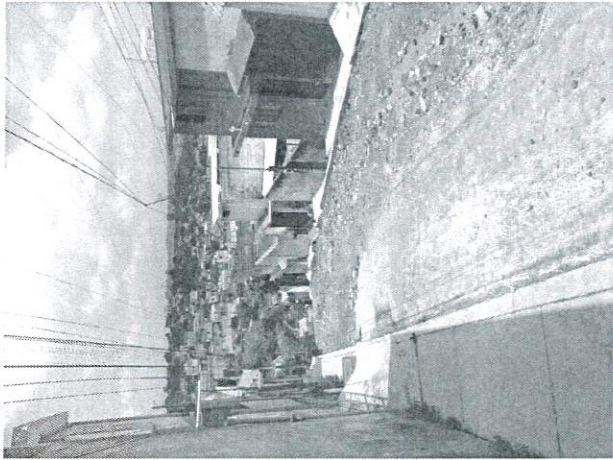

Concepto de obra ejecutado:	Sitio en donde se rehabilitó red de drenaje sanitario y agua potable	Concepto de obra ejecutado:	Sitio en donde se rehabilitó red de agua potable y alcantarillado sanitario
Observaciones:			
<div><div>Juan Ortiz Lagunes</div><div>Supervisor de Obras</div><div>ING. CIVIL</div><div>Profesión</div></div> <div><div>c.c.p. Contralor Interno</div><div>c.c.p. Tesorero Municipal</div><div>c.c.p. Director de Obras Públicas</div><div>c.c.p. Orfís</div></div>			

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	UNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090018	Periodo:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CAOBA ENTRE CALLE LIQUIDÁMBAR Y CALLE ROBLE, CALLE ROBLE ENTRE CALLES ENCINO.		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	08/07/2025

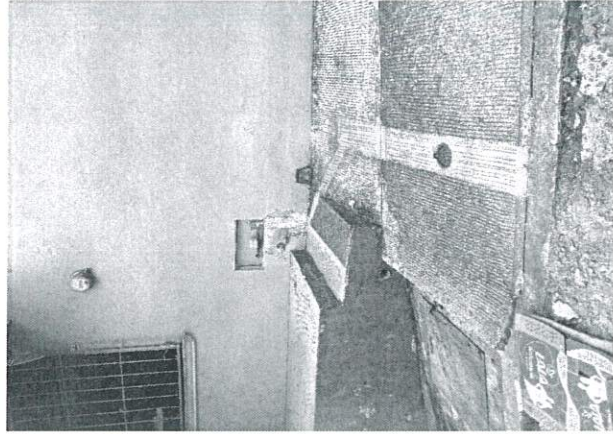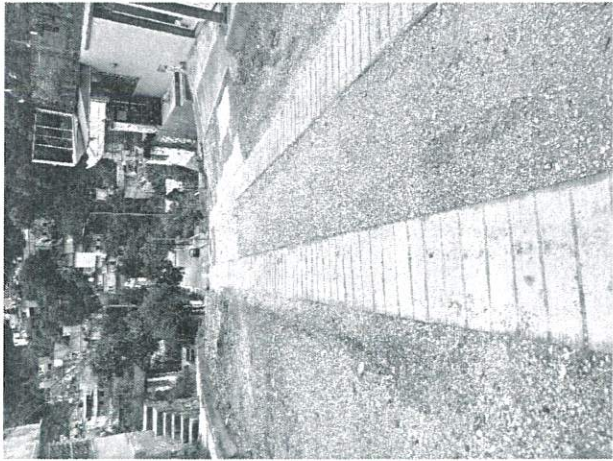

Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de toma domiciliaria.

Heber Alt Montemira Medel


Supervisor de Obras

Observaciones:

ING.
Profesión
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Ofis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
No. de obra:	2025309090019	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE BENITO JUÁREZ Y HERMENEGILDO GALEANA, DE LA				
				Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	08/07/2025

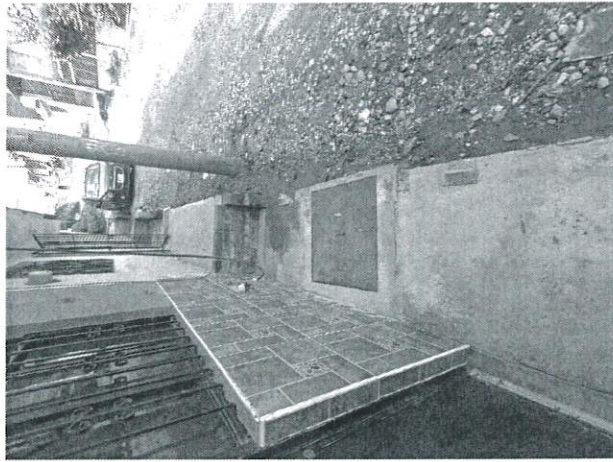

Concepto de obra ejecutado: Rehabilitación de registro sanitario

Concepto de obra ejecutado: Revestimiento con material calizo y construcción de banquetta de concreto

Observaciones:	
	Supervisor de Obras
	Carlos Gustavo Hernández Paredes
	ARQ.
	Profesión
	c.c.p. Contralor Interno
	c.c.p. Tesorero Municipal
	c.c.p. Director de Obras Públicas
	c.c.p. Ofis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ
No. de obra:	2025309090020	Periodo:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACION DE ALcantarillado sanitario y red de agua potable en la calle Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS		
	DELFINO VICTORIA, ENTRE CALLES ISAURO SÁNCHEZ Y VICENTE VIVEROS, DE LA Fecha de revisión: 07/07/2025		



Concepto de obra ejecutado: Reposición de concreto hidráulico

Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material calizo.

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Marín
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfís

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090021	Periodo:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALcantarillado sanitario y red de agua potable en la calle CHININI, ENTRE CALLES AZALEAS Y SAN DANIEL EN LAS COLONIAS JACARANDAS Y LAS		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	07/07/2025



Concepto de obra ejecutado:	Estado actual de revestimiento con materia de base tipo calizo	Concepto de obra ejecutado:	Estado actual de revestimiento con material de base tipo calizo
Observaciones:			
		Juan Ortiz Lagunes	Supervisor de Obras
		ING. CIVIL	Profesión
		c.c.p. Contralor Interno	
		c.c.p. Tesorero Municipal	
		c.c.p. Director de Obras Públicas	
		c.c.p. Ofis	

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ
No. de obra:	2025309090022	Periodo:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		
	ENCINO, ENTRE CALLES CIPRÉS Y LUIS DONALDO COLOSTO, EN ANDADOR GARDENIAS, Fecha de revisión: 07/07/2025		



Concepto de obra ejecutado: Estado actual de la calle, en funcionamiento Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Pozo sanitario

Blanca Aurora Anelli Flores

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfís

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090023	Periodo:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE AGUSTIN LARA Y FINAL DE LA CALLE DE LA COLONIA		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	08/07/2025



Concepto de obra ejecutado:

Registro sanitario rehabilitado.

Concepto de obra ejecutado:

Colocación de brocal de polietileno

Observaciones:

Omar Josue del Carmen Suárez

Supervisor de Obras

ING. Profesión

c.c.p. Contralor Interno


c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2025309090024	Periodo:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANTONIO M. CARLÓN, ENTRE LAS CALLES ISAURO ACOSTA Y ESPERANZA AZCÓN, Y EN		
Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025		
Número de estimación:			
Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS		
Fecha de revisión:	07/07/2025		

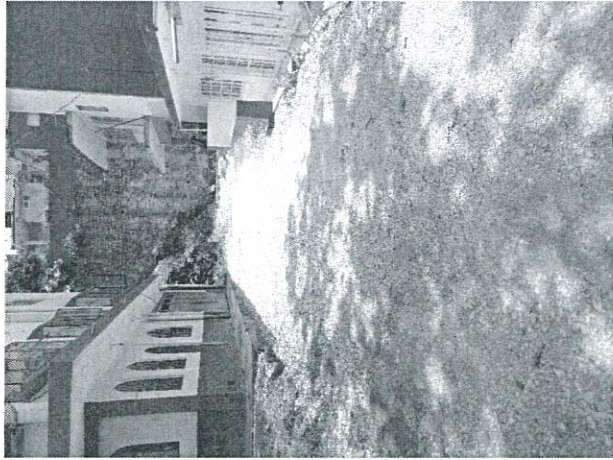

Concepto de obra ejecutado:

Tendido Calizo.

Concepto de obra ejecutado:

reposición de empedrado.

Observaciones:

Heber Al Montemira Medel

Supervisor de Obras

ING. Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Ofis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ
No. de obra:	2025309090025	Periodo:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ESTIBADORES ENTRE LAS CALLES TEJEDORES Y CIRCUITO 1, DE LA COLONIA MIGUEL		
Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025		
Número de estimación:	INGRESOS PROPIOS		
Fecha de revisión:	08/07/2025		



Concepto de obra ejecutado:	tendido de calíza en calle Estibadores	Concepto de obra ejecutado:	registro albañal sanitario en calle Estibadores
-----------------------------	--	-----------------------------	---

Observaciones:

Supervisor de Obras

Víctor Hugo Hernández Pérez

ING.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno



c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Ofis

DATOS GENERALES

Municipio:	JINICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
No. de obra:	202530900026	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALcantarillado sanitario y canal pluvial, en calle andador dos, entre calle plutarco elías calles y final del			Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	08/07/2025

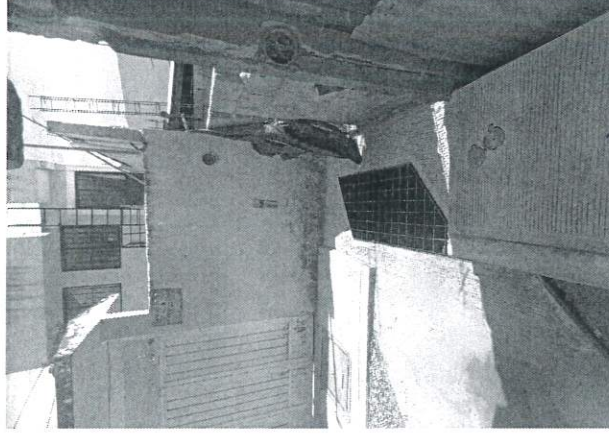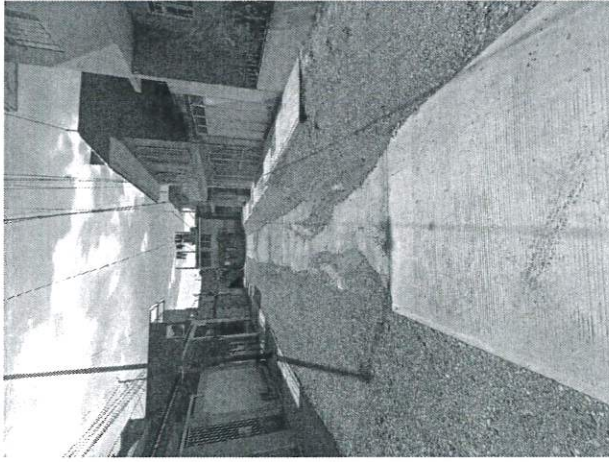


c.c.p. Orfis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
No. de obra: 2025309090027 Período: JUNIO Número de estimación: INGRESOS PROPIOS
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA IZTACCHUATL, ENTRE Fecha de revisión: 09/07/2025

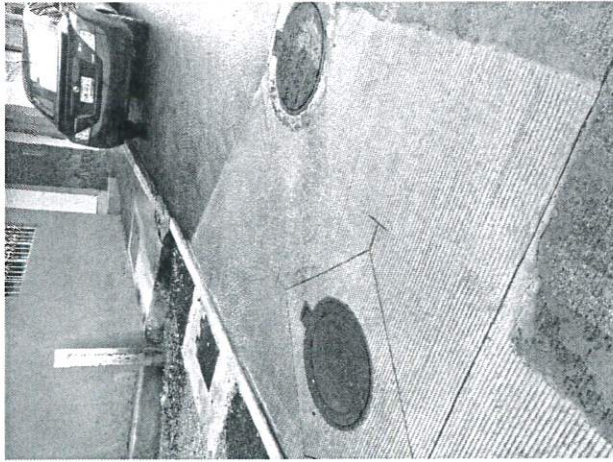

Concepto de obra ejecutado:

reposición de concreto hidráulico y colocación de brocales

Concepto de obra ejecutado:

tendido de material calizo

Observaciones:

Ruben Omar Morales Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090028	Período:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE		Número de estimación:
	PROLONGACIÓN LAS FLORES, ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS FLORES, EN LA		Fuente de Financiamiento:
			INGRESOS PROPIOS
			Fecha de revisión:
			07/07/2025
			Ejercicio fiscal:
			EJERCICIO 2025



Concepto de obra ejecutado:

registro sanitario

Concepto de obra ejecutado:

toma domiciliaria

Observaciones:

Oscar Jair Rojas Ortiz
Supervisor de Obras

ING.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Ofis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	UNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090029	Período:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA PRIMAVERA ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA Y EL CIRCUITO PRESIDENTES		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	07/07/2025



Concepto de obra ejecutado:

Pozo de visita Rehabilitado

Concepto de obra ejecutado:

Toma domiciliaria rehabilitada

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Magín
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión

c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090030	Periodo:	JUNIO
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN Y	Número de estimación:	EJERCICIO 2025
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GABRIEL GARZÓN, ENTRE LAS CALLES	Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	08/07/2025



Concepto de obra ejecutado: reposición de banquetas

Concepto de obra ejecutado:

demolición de concreto en calle Acapulco

Observaciones:


Ruben Omar Morales Bandala
Supervisor de Obras

ING. CIVIL
Profesión

- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025	
No. de obra: 20253090031	Período: JUNIO	Número de estimación:	
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 2DA PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE	Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión: 07/07/2025	

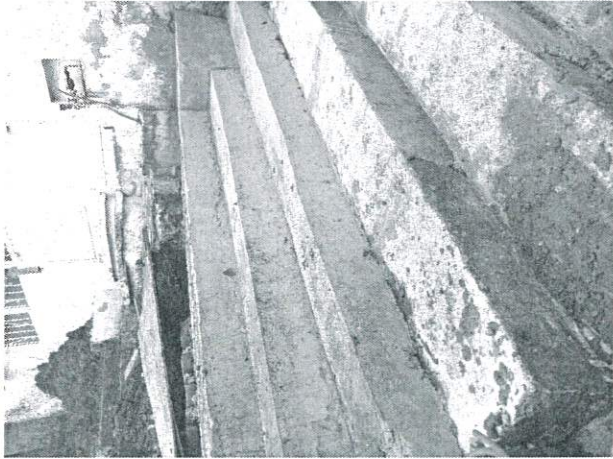

Concepto de obra ejecutado:

Reposición de escalones

Concepto de obra ejecutado:

Pozo de visita construido.

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Marín
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión

c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Ofis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
No. de obra:	2025309090032	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS DE LA				
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS		
		Fecha de revisión:	08/07/2025		



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de caja de valvulas.

Concepto de obra ejecutado:

Registro sanitario rehabilitado.

Observaciones:

Omar Josue del Carmen Suarez

Supervisor de Obras

ING. Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal



c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES


Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025
No. de obra:	2025309090033	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALcantarillado sanitario en la calle PICO DE ORIZABA ENTRE LAS AVENIDA ARAUCARIAS Y LA CALLE CERRO DE CHIGNAUTLA DE LA	Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión:	07/07/2025

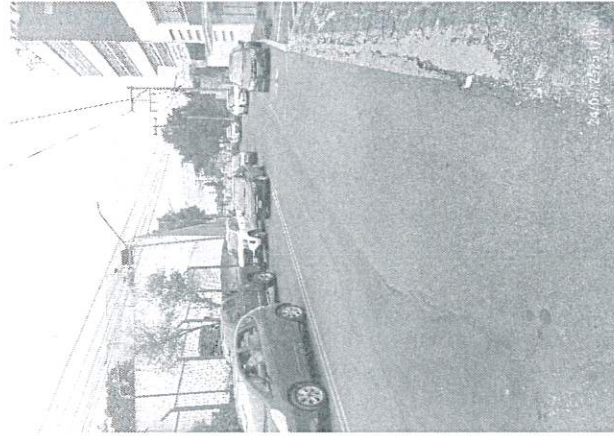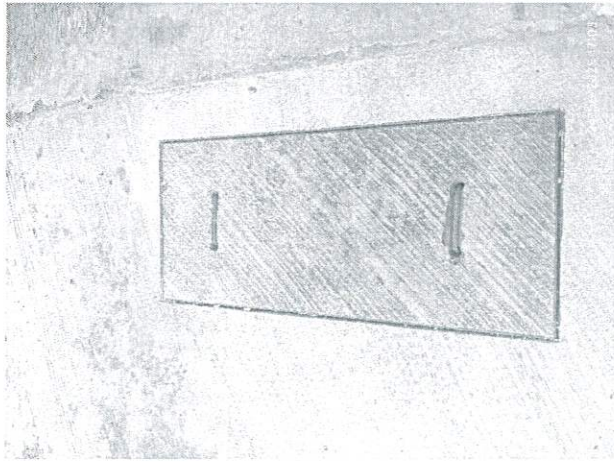

Concepto de obra ejecutado:	Registro sanitario	Concepto de obra ejecutado:	Estado actual de la calle, en funcionamiento
Observaciones:			
			<div><div>Bianca Aurora Arellano Flores</div><div>Supervisor de Obras</div></div>
			<div>ARQ.</div> <div>Profesión</div>
			<div><div><input type="checkbox"/> c.c.p. Contralor Interno</div><div><input type="checkbox"/> c.c.p. Tesorero Municipal</div><div><input type="checkbox"/> c.c.p. Director de Obras Públicas</div><div><input type="checkbox"/> c.c.p. Ofis</div></div>

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES	
Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra: 2025309090034	Periodo: JUNIO
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BANCOS ENTRE CALLE NORTE-SUR Y CALLE CIRCUITO INDUSTRIAL Y	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025
	Número de estimación: INGRESOS PROPIOS
	Fecha de revisión: 08/07/2025

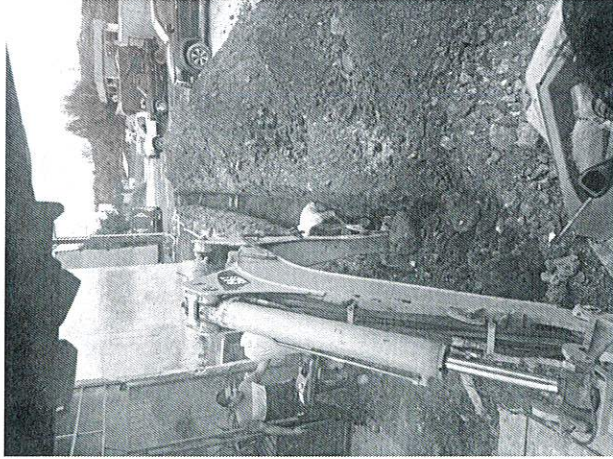

Concepto de obra ejecutado:

excavación para agua potable en andador bancos

Concepto de obra ejecutado:

instalación de tubería de agua de agua potable en bancos

Observaciones:

Víctor Hugo Hernández Pérez

Supervisor de Obras

ING. Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Ofis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉJEZ
No. de obra:	2025309090035	Periodo:	JUNIO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA JAZMIN, ENTRE CALLES JAZMIN Y TLALNECAPAN, DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ O LOMAS DE TECUANAPAN, EN		
Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025		
Número de estimación:			
Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS		
Fecha de revisión:	07/07/2025		



Concepto de obra ejecutado:

Reposición de escalinatas.

Concepto de obra ejecutado:

Caja de valvulas construida

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Marín

Supervisor de Obras

ARQ. Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Ofis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2025309090036

Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUSTAVO ADOLFO BECQUER ENTRE CALLE ALFONSINA STORNI Y CALLE RAMÓN

Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ


Período: JUNIO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025

Número de estimación: 08/07/2025

Fecha de revisión: 08/07/2025

Ingresos PROPIOS

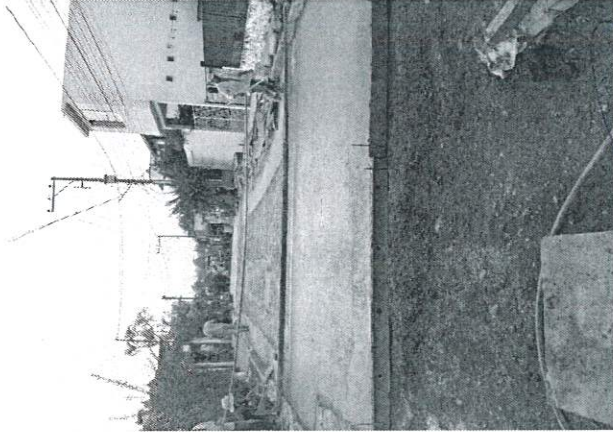

Concepto de obra ejecutado: construcción de caja de válvulas

Concepto de obra ejecutado:

reposición de concreto hidráulico

Observaciones:

Ruben Omar Morales Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



Municipio: INIICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ		Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025	
No. de obra: 2025309090037		Periodo: JUNIO		Número de estimación: INGRESOS PROPIOS	
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CALLEJÓN DE LAS ANIMAS ENTRE CALLE DE LA PRIMAVERA Y PASEO DE				Fecha de revisión: 08/07/2025	



Concepto de obra ejecutado:	Demolición de empedrado y pavimento Hidráulico	Concepto de obra ejecutado:	Relleno con material filtro
Observaciones:			
		Carlos Gustavo Hernández Paredes Supervisor de Obras	
		ARQ. Profesión	
		c.c.p. Contralor Interno	
		c.c.p. Tesorero Municipal	
		c.c.p. Director de Obras Públicas	
		c.c.p. Orfis	

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2025309090038	Periodo:	JUNIO
Descripción:	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN PARTICULAR DE 500 KVA PARA		
Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2025		
Número de estimación:	INGRESOS PROPIOS		
Fecha de revisión:	08/07/2025		

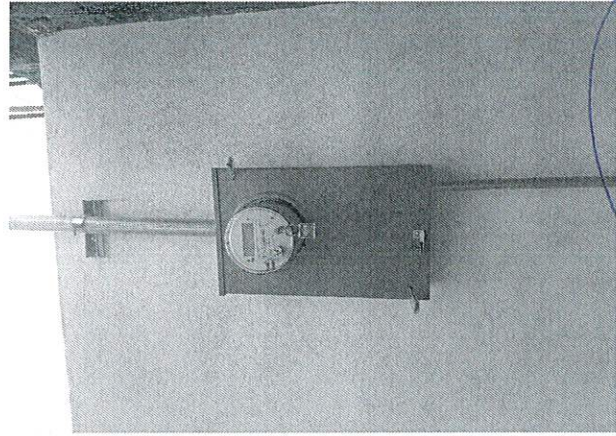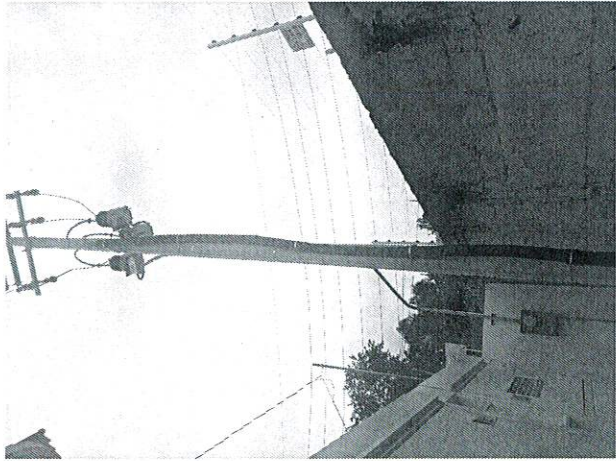

Concepto de obra ejecutado:

bajada de la línea al carcamo de bombeo en pinos

Concepto de obra ejecutado:

medidor del carcamo de bombeo en pinos


Observaciones:

Víctor Hugo Hernández Pérez
Supervisor de Obras

ING.
Profesión
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Ofis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


DATOS GENERALES			
Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRIQUÉZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025	
No. de obra: 2025309090039	Período: JUNIO	Número de estimación: INGRESOS PROPIOS	
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO PARA LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA, EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ		Fuente de Financiamiento: 07/07/2025	

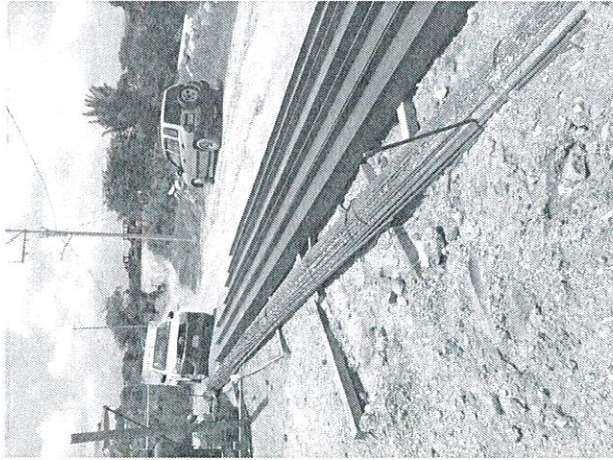

Concepto de obra ejecutado:	Suministro y habilitado de acero	Concepto de obra ejecutado: Sitio en donde se lleva a cabo la construcción de cárcamo de bombeo
Observaciones:		
<div><div>Juan Ortiz Lagunes</div><div>Supervisor de Obras</div><div>ING. CIVIL</div><div>Profesión</div><div>c.c.p. Contralor Interno</div><div>c.c.p. Tesorero Municipal</div><div>c.c.p. Director de Obras Públicas</div><div>c.c.p. Orfis</div></div>		

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ
No. de obra:	2025309090040	Período:	JUNIO
Descripción:	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 3, PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		
	EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ		
	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2025		
	Número de estimación:		
	Fecha de revisión: 07/07/2025		

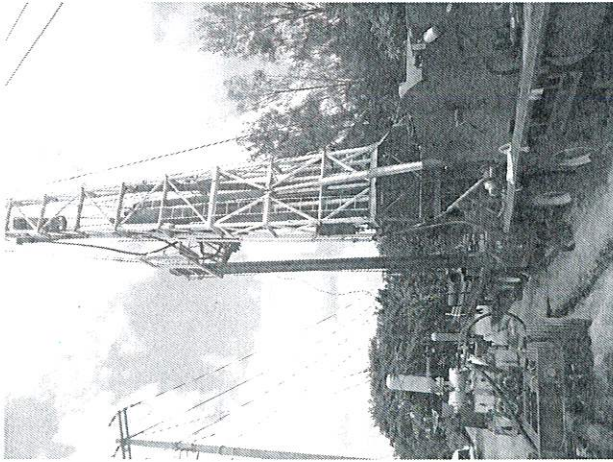

Trabajos de perforación en pozo No. 3

Tubería de perforación para pozo No. 3

Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Juan Ortiz Lagunes
Supervisor de Obras

ING. CIVIL
Profesión

☐ c.c.p. Contralor Interno
☐ c.c.p. Tesorero Municipal
☐ c.c.p. Director de Obras Públicas
☐ c.c.p. Ofis
