



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
22/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ DESCRIPCION DE LA OBRA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR III, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 207430900001

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE: N/A AGEB: SI X NO X
TIPO DE ZONA: RURAL SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: RESTRICTIVA
COMPLEMENTARIA DIRECTA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.566961900 LONGITUD -96.875686800

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	Monto con IVA	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS				IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	MONTO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
1N	\$405,038.66	SPEI	\$322,285.07	1692	\$322,285.07	\$1,745.86	\$0.00	\$322,285.07
ANTICIPO	\$398,273.65	SPEI	\$398,273.65	57028	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,273.65
TOTALES	\$405,038.66		\$322,285.07		\$321,007.73	\$1,745.86	\$0.00	\$720,558.77

B) REPORTE

MONTO PAGADO EN EL MES: \$0.00
MONTO PAGADO ACUMULADO: \$322,285.07
FINQUITO CON IVA: \$0.00
ACTA ENTREGA RECEPCION:

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR III, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE DEL 65.73%

MONTO AUTORIZADO: \$2,000,000.00 CIVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$2,000,000.00 CIVA
VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: NO EXISTE NO EXISTE NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: II. AYUNTAMIENTO DE XALAPA EXISTE
TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA X
INVITACION A MENOS 3 PERSONAS
LICITACION PUBLICA

NO. DE CONTRATO: CMAS-SR-003-2024 FECHA: 26/06/2024
CONTRATISTA: F & C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV
RFC: F8C070430R42
MONTO CONTRATADO: \$1,991,368.26 CIVA
PROGRAMADA REAL
PERIODO DE EJECUCION: INICIO 26/06/2024 26/06/2024
TERMINO 27/12/2024
DIAS 180 97
APLICA NO APLICA X
MONTO: \$0.00 PORCENTAJE: 0.00
FECHA DE PAGO:

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO: \$398,273.65 \$171,669.68
AFIANZADORA: INSTITUCION DE GARANTIA INSTITUCION DE GARANTIA
No. DE FIANZA: 1423-03031-5 1423-03031-5
FECHA: 27/06/2024 27/06/2024
CONVENIO MONTO IMPORTE/PERIODO FECHA
MODIFICATORIO: PLAZO INICIAL FINAL
NO APLICA X
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$1,991,368.26 CIVA

Ing. Civil Gilberto Montero Pérez
OTRO EN FUNCIONES DE SUPERVISOR
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir más folios en el apartado de estado financiero utilizar otro hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	DESCRIPCION DE LA OBRA:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024309090002	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD COLONIA 6 DE ENERO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.	

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:			
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD COLONIA 6 DE ENERO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.			
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:			
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL \$2.62			

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:			
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL \$2.62			

MONTO AUTORIZADO:	\$1,000,000.00	C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,000,000.00	C/IVA	
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
LOS PERMISOS:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE	
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS		
	licitacion publica		

NO. DE CONTRATO:	CMAS-SR-004-2024	FECHA:	21/08/2024
CONTRATISTA:	F & C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV		
RFC:	F&C00430RX2		
MONTO CONTRATADO:	\$992,007.33	PROGRAMADA	REAL
		21/08/2024	21/08/2024
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO	TERMINO	
	21/08/2024	28/11/2024	
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	41
	MONTO:	\$198,401.47	PORCENTAJE: 20.00
	FECHA DE PAGO:	03/09/2024	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$198,401.47	\$95,517.87	
AFIANZADORA:	SURADORA ASERIA, SA DE CV		
NO. DE FIANZA:	1423-03248-9	1423-03249-2	
FECHA:	21/08/2024	21/08/2024	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$992,007.33		C/IVA
Ing. Adán Guzmán Mendiola Ing. Gilberto Montero Pérez DIRECTOR DE OBRAS			
TITULAR DEL AREA TECNICA EN FINANCIAMIENTO DE OBRAS FORMATO 11			

*En caso de requerir más días en el estado de estado financiero utilizar otro hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
04/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUETZ DESCRIPCION DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024300090003

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A AGE: NO X
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEOREFERENCIA

LATITUD 19.533974200 LONGITUD -96.846645000

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DE 99%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS O CHEQUE				FACTURAS				IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	MONTO	IMPORTE OBRA PROYECTO CON IVA RESTRICCIÓN	IMPORTE OBRA PROYECTO CON IVA CORRIENTE	5 MILLAR	CARGOS ANULACIONES	
3N	\$898,907.66	SPEI	\$625,360.76	EFA3F	\$260,672.30	\$898,907.66	\$260,672.30	\$3,874.60	\$0.00	\$625,360.76
ANTICIPO	\$1,461,496.74	SPEI	\$1,461,496.74	2FE39	\$0.00	\$1,461,496.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,496.74
3N	\$266,873.79	SPEI	\$185,661.33	91630	\$80,062.14	\$266,873.79	\$80,062.14	\$1,150.32	\$0.00	\$185,661.33
1A	\$160,558.74	SPEI	\$111,699.06	0F013	\$48,167.62	\$160,558.74	\$48,167.62	\$692.06	\$0.00	\$111,699.06
2N	\$207,809.01	SPEI	\$144,612.32	02138	\$62,960.70	\$207,809.01	\$62,960.70	\$895.99	\$0.00	\$144,612.32
2B	\$360,707.05	SPEI	\$250,940.16	23EAC	\$108,312.12	\$360,707.05	\$108,312.12	\$1,554.77	\$0.00	\$250,940.16
4N	\$873,001.53	SPEI	\$607,338.13	A5000	\$261,900.46	\$873,001.53	\$261,900.46	\$3,762.94	\$0.00	\$607,338.13
4B	\$1,763,698.75	SPEI	\$1,276,988.97	CD416	\$529,109.63	\$1,763,698.75	\$529,109.63	\$7,602.15	\$0.00	\$1,226,986.97
TOTALES	\$4,531,616.53		\$3,152,598.73		\$4,531,616.53	\$1,359,484.97	\$15,532.83	\$0.00		\$4,614,095.47

B) REPORTE

MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS
\$2,459,685.86		30/10/2024
MONTO PAGADO ACUMULADO:		
\$3,152,598.73		
FINQUITO CON IVA:		
\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

OBSERVACIONES:

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	5.21	14.33	14.37	0	27.34	0	0
REAL	0	0	0	0	0	5	3.2	29.8	0	61	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	5	8.2	34	34	95	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0.7	11.81	24.43	0	0	0	0

MONTO AUTORIZADO:	\$5,355,000.00	C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$5,355,000.00	C/IVA	
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS		NO APLICA
DEPENDENCIA DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS		NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA		NO APLICA
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA		EXISTE
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS		X
	licitacion publica		

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-082-2024	FECHA:	25/06/2024
CONTRATISTA:	MECANICA HIDRAULICA DE PRECISION DOS SA DE CV		
RFC:	MIP091014F-C3		
MONTO CONTRATADO:	\$4,871,655.79	PROGRAMADA	REAL
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO 25/06/2024	TERMINO 22/09/2024	25/06/2024
	DIAS 90		129
ANTICIPO:	APLICA X	NO APLICA	
	MONTO: \$1,461,496.73	PORCENTAJE:	30.00
	FECHA DE PAGO:	08/07/2024	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$1,461,496.74	\$419,970.33	
AFIANZADORA:	URADORA ASERTA, S.A. LIMONADORA ASERTA, S.A. D		
No. DE FIANZA:	4426-07796-9	4426-07795-0	
FECHA:	25/06/2024	25/06/2024	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO EXISTE	IMPORTE PERIODO	INICIAL FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRA):	\$4,871,655.79		

Ing. Adolfo Borges-Morán
DIRECTOR DE OBRAS
Ing. Civil Juan Diego Leguines
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar: otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUILIZ DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA ENTRE CALLES AVENIDA RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE DURAZNO Y CALLE MELON, EN EL DISTRITO DE VASCONCELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309050008

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
CLAVE: N/A
ZONA: URBANA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL: PUY ALTO MEDIO BAJO X

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 19.57189900 LONGITUD -96.901816400

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
FACTURAS									
No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZA CHEQUE	No.	MONTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
FINQUITO	\$365,673.03		325E	\$167,002.25	\$167,002.25	\$167,002.25	\$167,002.25	\$167,002.25	\$167,002.25
1N	\$982,759.49		03319	\$982,759.49	\$982,759.49	\$982,759.49	\$982,759.49	\$982,759.49	\$982,759.49
ANTICIPO	\$850,553.67		50081	\$850,553.67	\$850,553.67	\$850,553.67	\$850,553.67	\$850,553.67	\$850,553.67
2N	\$711,947.34		000312E	\$711,947.34	\$711,947.34	\$711,947.34	\$711,947.34	\$711,947.34	\$711,947.34
3N	\$182,667.95		0313E	\$182,667.95	\$182,667.95	\$182,667.95	\$182,667.95	\$182,667.95	\$182,667.95
3A	\$311,629.97		000314E	\$311,629.97	\$311,629.97	\$311,629.97	\$311,629.97	\$311,629.97	\$311,629.97
TOTALES	\$2,554,677.78			\$2,554,677.78	\$2,554,677.78	\$2,554,677.78	\$2,554,677.78	\$2,554,677.78	\$2,554,677.78

B) REPORTE											
EXISTE											
H O C I A S											
MONTOS PAGADOS EN EL MES:											
MONTOS PAGADOS ACUMULADOS:											
FINQUITO CON IVA:											
ACTA ENTREGA RECEPCION:											

AVANCE FISICO REAL											
AVANCE											
PROGRAMADO											
REAL											
ACUMULADO											
ATRASO (%)											

OBSERVACIONES:

*En caso de recibir más facturas en el periodo de estado financiero utilizar otra hoja.

FECHA DE ELABORACION:
04/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA ENTRE CALLES AVENIDA RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE DURAZNO Y CALLE MELON, EN EL DISTRITO DE VASCONCELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99.90%

MONTOS AUTORIZADOS:	\$2,700,000.00	C/IVA
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,900,000.00	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS	
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.	
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitacion publica	

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-004-2024	FECHA:	08/02/2024
CONTRATISTA:	EQUIPO PESADO DEL GOLFO SA DE CV		
RFC:	EPG980517CP8		
MONTOS CONTRATADOS:	\$2,835,178.89	C/IVA	REAL
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO 09/02/2024	TERMINO 09/02/2024	
	DIAS 150		235
APLICA:	X NO APLICA		
MONTOS:	\$850,553.66	PORCENTAJE:	30.00
FECHA DE PAGO:	14/02/2024		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTOS AFIANZADOS:	\$850,553.67	\$244,411.97	
AFIANZADORA:	SADORA INSURGENTES SOCIEDAD ANONIMA S/		
FECHA:	8246-0114-0	8246-0114-1	
FECHA:	08/02/2024	08/02/2024	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTOS	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$2,835,178.89		C/IVA

Ing. Civil Víctor Hugo Hernández Pérez
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EXERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
04/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE MIRADOR, OROQUINDAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	No. DE OBRA:	
INGRESOS PROPIOS	202-4309090009	

ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO		
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL		N/A		
	URBANA				
CLAVE AGE:					
	MUY ALTO				
	ALTO				
	BASTO				
	MUY BASTO				X
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:					
REHABILITACIÓN DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO COLORADO, EN XALAPA, VERACRUZ.					

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO		SI	X	NQ	DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTANTE
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA								
LATITUD	19.541306300	LONGITUD		-98.945045000				
C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*								
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:								
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%								

[illegible]

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-052-2024	FECHA:	28/02/2024	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARRETT SA DE CV			
RFC:	CIC090827U99			
MONTO CONTRATADO:	\$1971,877.56	C/JIVA		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRANADA	REAL	
	TÉRMINO	28/02/2024	28/02/2024	
	DÍAS	27/06/2024	24/06/2024	
		171	179	
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA	
	MONTO:	\$391,563.26	PORCENTAJE:	30.00
	FECHA DE PAGO:	06/03/2024		

TOTALES		\$1,776,136.84	\$1,220,348.51	\$7,655.76	\$532,841.05	\$1,776,136.84	\$15,311.57	\$1,811,891.78
---------	--	----------------	----------------	------------	--------------	----------------	-------------	----------------

B REPORTE		EXISTE		FECHAS	
MONTOPAGADO EN EL MES:		\$726,897.87		14/10/2024	
MONTOPAGADO ACUMULADO:		\$1,220,328.51			
FINIQUITO CON IVA:		\$0.00			
ACTA ENTREGA RECEPCION:					

AVANCE FISICO REAL													
AVANCE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	DIC	NOV	DIC
PROGRAMADO		0	0	21	17	08	27	07	80	66	23	07	0
REAL		0	0	1	14	50	23	11	5	0	0	0	0
ACUMULADO		0	1	15	65	86	95	95	100	5	100	0	0
ATRASO (%)		0	0	0	0	0	27.86	12.37	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS	
MONTOPAGADO:		\$591,563.27		\$169,989.45		\$196,624.77	
FIANZADORA:		ERRELY ASGUARDONA IDIRREY ASGUARDONA TERREY ASGUARDONA					
NO. DE FIANZA:		2253509		2263505		2307588	
FECHA:		28/02/2024		28/02/2024		26/08/2024	
CONVENIO		EXISTE		IMPORTE PERIODO		FECHA	
MODIFICATORIO:		MONTO		INICIAL		FINAL	
		PLAZO					
		NO APLICA		X			
MONTOTOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,903,847.56				100%	

SI SUPERVISOR DE OBRA
FORMATO 11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FECHA DE ELABORACION:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

EJERCICIO 2024

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024-309-00011
DESCRIPCION DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES HERREROS Y PINTORES (ENTRE AGUAS DE XALAPA Y LOS PINOS), Y CALLES HERREROS Y PINTORES (ENTRE AGUAS DE XALAPA Y LOS PINOS), Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE YUCATAN (ENTRE AGUAS DE XALAPA Y AV. EBANO), DE LA COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.	

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES HERREROS Y PINTORES (ENTRE AGUAS DE XALAPA Y LOS PINOS), Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE YUCATAN (ENTRE AGUAS DE XALAPA Y AV. EBANO), DE LA COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%	

MONTO AUTORIZADO:		MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		C/IVA	
VALIDACION DEL PROYECTO:		EXISTE		X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		EXISTE		X	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE		X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA:		EXISTE		X	
FACTIBILIDAD:		EXISTE		X	
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE		X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA:		EXISTE		X	
LOS PERMISOS:		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.		EXISTE	
TIPO DE LICITACION:		ADJUDICACION DIRECTA		X	
		INVITACION A MENOS 3 PERSONAS			
		LICITACION PUBLICA			

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-007 2024		FECHA: 22/02/2024	
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES TL CINCO S DE SA DE CV			
RFC:		CTC1403130C9			
MONTO CONTRATADO:		5835,788.00		C/IVA	
PERIODO DE EJECUCION:		INICIO 13/07/2024		REAL	
		TERMINO 12/05/2024		13/02/2024	
		DÍAS 90		12/05/2024	
		APLICA X		NO APLICA	
		MONTO: \$250,736.40		PORCENTAJE: 30.00	
ANTICIPO:		FECHA DE PAGO:		12/02/2024	

TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$250,736.00		\$72,030.00		\$82,541.10	
AFIANZADORA:		INSTITUCION DE GARAN.		INSTITUCION DE GARAN		SOLVEX	
No. DE FIANZA:		2888652		2888653		2972575	
FECHA:		12/02/2024		12/02/2024		14/05/2024	
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE		IMPORTE/PERIODO		TECHA	
		MONTO		INICIAL		FINAL	
		PLAZO		NO APLICA		X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRAS		\$250,736.00				C/IVA	

OBSERVACIONES:	
Res. Civil Gilberto Montero Pérez	
DIRECTOR DE OBRAS	
RESIDENTE DE OBRA EN FUNCIONES DE SUPERVISOR DE OBRA	
FORMATO 11	

B) REPORTE	
EXISTE	
FECHAS	
MONTO PAGADO EN EL MES:	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	
FINIQUITO CON IVA:	
ACTA ENTREGA RECEPCION:	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA	
FACTURAS	
IMPORTE NETO	
\$186,928.42	
\$250,736.00	
\$15,641.46	

D) ESTADO FINANCIERO DE OBRA	
FACTURAS	
IMPORTE NETO	
\$186,928.42	
\$250,736.00	
\$15,641.46	

E) ESTADO FINANCIERO DE OBRA	
FACTURAS	
IMPORTE NETO	
\$186,928.42	
\$250,736.00	
\$15,641.46	

F) ESTADO FINANCIERO DE OBRA	
FACTURAS	
IMPORTE NETO	
\$186,928.42	
\$250,736.00	
\$15,641.46	

G) ESTADO FINANCIERO DE OBRA	
FACTURAS	
IMPORTE NETO	
\$186,928.42	
\$250,736.00	
\$15,641.46	

*En caso de requerir más datos en el apartado de estado financiero, consulte el libro mayor.



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACIÓN:	27/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANFAMENTO	LOCALIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:
XALAPA-ENRIQUILIZ	202434090500017
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JORGE I. CASTILLO ENTRE FINAL DE LA CALLE Y PROLONGACION BOLIVIA; PRIVADA	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	ANTECEDENTES:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:						
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	NO	X	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	SI		NO	X	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
LATITUD	19.516754300	LONGITUD		96.935927200		
		DIRECTA		X		
		COMPLEMENTARIA		RESTRINGIDA		
		ALTO		X		
		MEDIO		Bajo		
		Bajo		MUY BAJO		
		MUY ALTO		X		
		GRADO DE REZAGO SOCIAL:				

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
RECONSTRUCCIÓN DE PUZOS DE PROYECTO PARA EL CANTON SANTO ANTONIO EN LA CALLE
JORGE L. CASTILLO ENTRE FINAL DE LA CALLE Y PROLONGACIÓN BOLIVIA; PRIVADA
JORGE L. CASTILLO ENTRE JORGE L. CASTILLO Y FINAL DE LA CALLE; CALLE
PROLONGACIÓN BOLIVIA ENTRE MANUEL CARBONEL Y PUZO DE VISITA CARBONERO Y
PROLONGACIÓN DE ALICANTARILLO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PUZOS PARA EL PUZOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE DE OBRA FÍSICO DEL 100%

MONTOS AUTORIZADOS:		\$1,750,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,750,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS		
FACILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACILIDAD:	CMAS		
PROMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO		
Tipo de LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS DE 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA		EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	CMAS OP-035-2024	FECHA:	23/02/2024
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985		
RFC:	C10021211F54		
MONTO CONTRATADO:	\$1,665,170.38	C/IVA	
	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	24/02/2024	
	TERMINO	31/07/2024	
	DIAS	159	
	APLICA	X	NO APLICA
ANTICIPO:	MONTO:	\$499,584.43	PORCENTAJE: 29.99
	FECHA DE PAGO:	04/03/2024	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$499,851.05	\$143,035.36	\$133,612.20
AFIANZADORA:	FIANZAS MEXICO, S.A. DE FIANZAS MEXICO, S.A. DE FIANZAS MEXICO, S.A.		
NO. DE FIANZA:	1.61086+14	1.61086+14	1.61086+14
FECHA:	23/02/2024	23/02/2024	03/08/2024
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE IMPORTE PERIODO FECHA		
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,086,170.18		

Ing. Ciro Gilberto Montero Pérez
DIRECTOR DE OBRAS

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE CON IVA MONTO CON IVA DISTRIBUCION	ACORTIZADO CON IVA	FACTURAS		IMPORTE NETO
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
1N	\$706,180.30	SPEI	\$491,282.33	1E57C	\$706,180.30	\$711,854.09	\$3,043.88		\$491,282.33
ANTICIPO	\$499,851.05	SPEI	\$499,851.05	7B83C	\$499,851.05	\$0.00	\$0.00		\$499,851.05
TOTALS	\$706,180.30		\$491,282.33		\$706,180.30	\$711,854.09	\$3,043.88		\$491,133.38

BIREPORTE		AVANCE FISICO REAL											
		FECHAS											
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00												
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$491,282.33												
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00												
ACTA ENTREGA RECEPCION:													

OBSERVACIONES:

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	27/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRAS: 20243090900119
DESCRIPCION DE LA OBRA:	

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE (LRA, ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA LUZ DEL BARRIO; PRIVADA TIRUCIO VELAZQUEZ, ENTRE CALZADA LUZ DEL BARRIO Y FINAL DE LA PRIVADA), DE LA COLONIA LUZ DEL BARRIO, EN XALAPA, VERACRUZ.	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: XALAPA ENRIQUEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

No. DE OBRA: 2024309000020

DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA SATURNO ENTRE AVENIDA VIA LACTEA Y CALLE ANTARES, COLONIA ARROYO BLANCO, EN XALAPA, VERACRUZ.

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA SATURNO ENTRE AVENIDA VIA LACTEA Y CALLE ANTARES, COLONIA ARROYO BLANCO, EN XALAPA, VERACRUZ.

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

CLAVE AGEB: N/A

TIPO DE ZONA: URBANA

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEOREFERENCIA

LATITUD: 19.53573000

LONGITUD: -96.945100800

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA

ALTERNATIVA

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
FACTURAS									
No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE	No.	MONTO	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA REAL	CORTEJE ADICIONALES	IMPORTE NETO	
IN	\$260,232.78		103	\$181,041.26	\$260,232.78	\$181,041.26	\$0.00	\$181,041.26	
ANTICIPO	\$148,486.95		F14442	\$148,486.95	\$0.00	\$148,486.95	\$0.00	\$148,486.95	
TOTALES	\$260,232.78			\$181,041.26	\$260,232.78	\$181,041.26	\$0.00	\$181,041.26	

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-053-2024	FECHA:	13/03/2024
CONTRATISTA:	HALLPER CONSTRUCCIONES SA DE CV		
RFC:	HCO1509305MIA		
MONTO CONTRATADO:	\$494,956.50	PROGRAMA:	REAL
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO 14/03/2024	TERMINO 12/05/2024	12/05/2024
ANTICIPO:	DIAS 60	APLICA MONTO: X	NO APLICA
	FECHA DE PAGO:	26/03/2024	30.00

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$148,486.95	\$42,668.66	\$49,495.65
AFIANZADORA:	NIA SEGUROS S.A. DE C.V. NIA SEGUROS S.A. DE C.V. NIA SEGUROS S.A. DE C.V.		
No. DE FIANZA:	3.00202E+12	3.00202E+11	3.00202E+12
FECHA:	13/03/2024	13/04/2024	12/05/2024
CONVENIO	MONTO	EXISTE	IMPORTE PERIODO
MODIFICATORIO:	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$494,956.50		

DIRECTOR DE OBRAS

RESIDENTE DE OBRA EN FUNCIONES DE SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas datos en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

[illegible]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



EJERCICIO 2024

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA ENRIQUEZ	A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 202430900024	DESCRIPCION DE LA OBRA:	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		Antecedentes:		
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	SI	X	NO
ZONA: RURAL	AGEB:	SI	N/A	NO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	NO	X	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LONGITUD		96.890757600
LATITUD		19.545309700		

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
POLIZAS CHEQUE		FACTURAS							
No. EST.	MONTO CON IVA	No.	MONTO	IMPORTE OBRA	MONTO CON IVA	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
IN	\$234,465.31	SPEI	\$146,163.46	A0483	\$234,465.31	\$70,339.59	\$1,010.63	\$16,951.63	\$146,163.46
ANTICIPO	\$306,195.38	SPEI	\$306,195.38	BFEFA9	\$306,195.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,195.38
TOTALES			\$146,163.46		\$234,465.31	\$70,339.59	\$1,010.63	\$16,951.63	\$452,358.84

B) REPORTE		AVANCE FISICO REAL											
EXISTE		FECHAS											
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00												
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$146,163.46												
FINQUITO CON IVA:	\$0.00												
ACTA ENTREGA RECEPCION:													

AVANCE FISICO REAL											
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
PROGRANADO	0	6.65	31.7	48.17	12.53	0.88	0	0	0	0	0
REAL	0	1	95	100	42	7	0	0	0	1	0
ACUMULADO	0	1	40	50	97	99	99	99	99	100	0
ATRASO (%)	0	5.65	0	38.17	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

FECHA DE ELABORACION:	27/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALICANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO CHEDRAUI CARAN), DE LA COLONIA TOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALICANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE CENTROAMERICA, ENTRE CALLES (LAS FLORES Y AVENIDA ANTONIO CHEDRAUI CARAN), DE LA COLONIA TOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

MONTO AUTORIZADO:		\$1,100,000.00	C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,100,000.00	C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	II. AYUNTAMIENTO			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-035-2024	FECHA:	23/02/2024
CONTRATISTA:	SANIOR HERMANOS Y ASOCIADOS SA DE CV		
REC:	SHM090319858		
MONTO CONTRATADO:	\$1,020,651.28	C/IVA	
	PROGRAMADA		
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO	24/02/2024	REAL
	TERMINO	02/06/2024	24/02/2024
	DIAS	100	17/08/2024
APLICA	X	NO APLICA	171
MONTO:	\$306,093.31	PORCENTAJE:	29.99
FECHA DE PAGO:	04/03/2024		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$306,195.38	\$84,987.18	\$75,164.13
AFIANZADORA:	DOXAMA	DOXAMA	DOXAMA
No. DE FIANZA:	24A009613	24A009647	24A058823
FECHA:	23/02/2024	23/02/2024	17/08/2024
CONVENIO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MODIFICATORIO:	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,020,651.28		C/IVA

Arq. Carlos Gustavo Hernández Paredes
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir más flujos en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES	
XALAPA-ENRIQUÉLZ	
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:
202430905034	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		ANTECEDENTES:	
SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE CLAVE			
ZONA: RURAL N/A			
URBANA			
¿SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X			
¿SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO			
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO		ALTO	
MUY ALTO		MEDIO	
MUY ALTO		BAJO	
MUY ALTO		MUY BAJO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA		X	
COMPLEMENTARIA		RESTRINGIDA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD		LONGITUD	
19 5663003100		-96.90782400	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
PÓLIZAS CHEQUE			FACTURAS						
No. EST.	MONTO CON IVA	Nº.	MONTO	Nº.	IMPORTE LARGO MONTO CON IVA POR PAGAR	ABONADO CON IVA	\$ MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
18	\$98,541.79	SPEI	\$98,541.15	C-022	\$98,541.29	\$79,562.39	\$424.75	\$0.00	\$68,554.15
19	\$456,316.51	SPEI	\$456,316.51	D6097	\$655,919.63	\$196,775.88	\$2,877.74	\$0.00	\$456,316.51
ANTICIPO	\$431,522.44	SPEI	\$421,522.44	380807	\$431,522.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,522.44
TOTALES	\$754,460.92		\$524,870.66		\$754,460.92	\$226,338.27	\$3,351.99	\$0.00	\$568,323.10

BIREPORTE						
EXISTE						FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00					
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$524,870.65					
FINAQUITO CON IVA:	\$0.00					
ACTA ENTREGA RECEPCION:						

OBSERVACIONES:

En caso de requerir más filas en el abastecido del estado financiero utilice el botón

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-003-2024	FECHA:	28/02/2024
CONTRATISTA:	LUI JACINTA PENSADO VASSALLO		
RFC:	PEVL810319L9A		
MONTOS CONTRATADO:	51,438,408.13	C/PVA	
	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	79/02/2024	29/02/2024
	TERMINO	07/05/2024	
	DIAS	100	215
PERIODO DE EJECUCIÓN:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTOS	\$431,522.43	PORCENTAJE: 30.00
ANTICIPO:	FECHA DE PAGO:		06/03/2024

TIPO DE FINANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$431,522.44	\$172,901.98	
AFIANZADORA:	INSTITUCION DE GARANTIA		
NO. DE FINANZA:	2893481	2893483	
FECHA:	28/02/2024	28/02/2024	
	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENTO	MONTO	INICIAL	
MODIFICATORIO:	PLAZO	FINAL	
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO)			
CONTRATO DE OBRA:			\$1,438,408.13
			CHVA

~~Ray Ardié Burgos Morfi~~
~~DIRECTOR DE OBRAS~~

ing, Civil Juan Ortiz Lagunes

FORMATO 11



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	25/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:
XALAPA-ENRIQUETZ		702430090000135

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
RECONSTRUCCIÓN DE UNO DE LOS CALLES DE LA CIUDAD DE PANAMÁ, EN EL SIGLO XVIII, ENTRE CALLES (P-RESINOS Y PANAMÁ), EN LA CALLE (YAMIEL Y FRESNOS) DE LA COLONIA ACUEDUCTO Y EN LA CALLE ANDADOR DE PANAMÁ, ENTRE CALLES (VENEZUELA Y OYAMEL) DE LA COLONIA MONTEVIDEO, EN XALAPA, MÉXICO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
<p>Se realizó el primer corte de la obra, se demarcó el terreno y se colocaron los postes de la obra.</p>

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

MONTO AUTORIZADO:		MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		C/IVA	
	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00		C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE		
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS				NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE		
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS				NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE		
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	EL AYUNTAMIENTO				NO APLICA

TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitación pública	

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-028-2024	FECHA:	23/02/2024
CONTRATISTA:	ACTA NOM VERBA SA DE CV		
RFC:	ANV100213NF7		
MONTO CONTRATADO:	\$1,904,175.38	PROGRAMADA	C/IVA
		REAL	
	INICIO	23/02/2024	23/02/2024
	TERMINO	21/06/2024	17/07/2024
	DÍAS	120	146
	APLICA	X	NO APLICA
ANTICIPO:	MONTO:	\$571,062.19	PORCENTAJE: 29.99
	FECHA DE PAGO:		01/03/2024

TIPO DE FIANZA:		ANTIGÜO	LUMPLIMIENTO	VELOC OCULTUS
MONTA AFIANZADO:		\$571,252.61	\$164,153.05	\$105,417.53
FIANZADORA:		ERET, ASGUARDADORA LTERREY, ASGUARDADORA EMBLY, ASGUARDADORA D		
NO. DE FIANZA:		7061908	2261908	22366540
FECHA:		22/03/2024	22/03/2024	17/07/2024
		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
ONVENIO		MONTA	INICIAL	FINAL
MODIFICATORIO:		PLAZA		
		NO APLICA	X	
MONTA TOTAL CONTRATADO (CONVENIO +				
TRATO) DE OBRA:			\$1,904,175.38	C/IVA

Arq. Jabir Jamed Jiménez
RESIDENTE DE OBRA EN FUNCIONES DE
SUPERVISOR DE OBRA
FORMATO 1

7 de 7

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.		MONTO CON IVA		POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
				No.	MONT0	No.	IMPORTE BRUTO PERCEPCION ATRIBUIBLE	AMORTIZACION CON IVA	\$ MILLAR			
3N		\$417,216.91		SPEI	\$790,253.49	C38EA	\$417,216.91	\$125,165.07	\$1,798.35	\$0.00	\$290,253.49	
2A		\$141,301.60		SPEI	\$98,302.06	SPEI	\$141,301.60	\$42,390.48	\$609.06	\$0.00	\$98,302.06	
2N		\$742,817.88		SPEI	\$516,770.72	ASJ65	\$742,817.88	\$222,845.36	\$3,201.80	\$0.00	\$516,770.72	
ANICIPO		\$571,252.61		SPEI	\$571,252.61	87668	\$571,252.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,252.61	
1N		\$408,127.96		SPEI	\$283,930.40	103B4	\$408,127.96	\$122,438.39	\$1,759.17	\$0.00	\$283,930.40	
1A		\$11,457.16		SPEI	\$7,970.63	663C1	\$11,457.16	\$3,437.15	\$49.38	\$0.00	\$7,970.63	
3A		\$142,196.67		SPEI	\$98,924.75	667CF	\$142,196.67	\$42,679.00	\$612.97	\$0.00	\$98,924.75	
TOTALES		\$1,863,118.18			\$1,296,152.05		\$1,863,118.18	\$558,935.45	\$8,030.68	\$0.00	\$1,296,152.05	

BYREPORT

	EXISTE	FECHAS
MONTOPAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTOPAGADO ACUMULADO:	\$1,296,152.05	
QUINTO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FISICO REAL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0,56	28,28	30,67	27,17	13,32	12	0	0	0	0	0
REAL	0	1	4,9	1	1,79	9	3	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	1	5,6	5,3	9,2	59	100	100	100	100	100	100
ATRASADO (%)	0	0	1	28,62	0	0	73,33	99	100	100	100	100

OBSERVACIONES:

En caso de requerir más días en el apartado de estado financiero, iniciar otra hoja.



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	04/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

[illegible]

EJERCICIO 2024

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA:	
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		XALAPA-ENRIQUILIZ	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		2024309290038	
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAUQUINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA, CALLE			
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:			
RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAUQUINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUKO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMARON ANTECILLO A NAUQUINCO			
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:			

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		Antecedentes:	
Obras Realizadas con FISM-DF:			
tipo de	Clave		
zona:	AGEB:		
Se encuentra en una Zap:	SI	NO	X
Se encuentra en el Catálogo	SI	X	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
Latitud	Longitud		
19.560046800	-96.905112300		

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
POLIZAS CHEQUE		FACTURAS							
No. EST.	MONTOS COM IVA	No.	IMPORTE COM IVA	IMPORTE NETO	CARGOS ANTICIPALES	5 MILLAR	IMPORTE NETO	CARGOS ANTICIPALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$416,070.11	017007	\$416,070.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,070.11	\$0.00	\$416,070.11
1N	\$415,507.02	3628	\$415,507.02	\$124,652.11	\$0.00	\$1,790.98	\$289,063.93	\$0.00	\$289,063.93

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%

MONTO AUTORIZADO: \$1,450,000.00

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,450,000.00

VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE

DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA: CMAS

FACTIBILIDAD: CMAS

PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE

DEPENDENCIA QUE OTORGA: NO EXISTE

LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACIÓN DIRECTA

EXISTE

INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS

EXISTE

licitación pública

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP 029-2024	FECHA:	22/02/2024
CONTRATISTA:	INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACION SA DE CV		
RFC:	ICO801266K8		
MONTO CONTRATADO:	\$1,386,900.35	C/IVA	
	PROGRAMADA	REAL	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	23/02/2024	23/02/2024
	TERMINO	21/06/2024	
	DÍAS	120	221
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$415,931.41	PORCENTAJE: 29.99
	FECHA DE PAGO:		03/03/2024

BIREPORTE		AVANCE FISICO REAL											
EXISTE		FECHAS											
MONTOPAGADO EN EL MES:	\$0.00												
MONTOPAGADO ACUMULADO:	\$289,063.93												
FINQUITO CON IVA:	\$0.00												
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:													
OBSERVACIONES:													

TIPO DE PLANZA:		ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTOPAGADO ACUMULADO:	\$416,070.11	\$119,560.38		
AFIANZAMIENTO:				
AFIANZAMIENTO:				
NO. DE PLANZA:	4125-01196-5	4125-01197-0		
FECHA:	22/02/2024	22/02/2024		
CONVENIO		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MODIFICATORIO:		MONTOPAGO	INICIAL	FINAL
		PLAZO		
		NO APLICA	X	
MONTOTOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			\$1,386,900.35	C/IVA

En caso de requerir más folios en el apartado de los datos financieros utilizar otra hoja.



FECHA DE ELABORACIÓN:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

*En caso de requerir más flac en el período de estado financiero utilizar otro 2 hojas.



H. AYUNTAMIENTO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACIÓN:
04/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA, ENRIQUEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024000900043

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

CLAVE: N/A

AGEB: SI NO X

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD: 19.497698900 LONGITUD: -96.876840900

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA

RESTRINCION

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANDADOR XALAPA (ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y CIRCUITO XALAPA) Y REHABILITACION DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CORDOBA (ENTRE CARDEL Y POZA RICA), DE LA COLONIA FREDEPO, EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DEL 100%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	Monto con IVA	POLLAS DIQUE		FACTURAS		Importe Neto
		No.	Monto	No.	Monto	
2N	\$716,876.00	SPEI	\$498,723.22	208	\$3,089.98	\$498,723.22
ANTIPO	\$476,852.46	SPEI	\$476,852.46	2905A1	\$0.00	\$476,852.46
3N	\$365,300.60	SPEI	\$254,135.85	151	\$109,590.18	\$254,135.85
	\$216,249.45	SPEI	\$146,167.58	217	\$64,874.83	\$146,167.58
TOTALES	\$1,298,426.05		\$899,026.65		\$5,596.66	\$1,375,879.11

B) REPORTE

EXISTE

FECHA: 31/10/2024

MONTO PAGADO EN EL MES: \$644,890.80

MONTO PAGADO ACUMULADO: \$899,076.65

FINQUITO CON IVA: \$0.00

ACTA ENTREGA RECEPCION:

OBSERVACIONES:

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	4.17	17.18	21.32	24.09	9.41	0	0	0	0	0	0
REAL	0	1	21	41	74	9	0	0	0	1	0	0
ACUMULADO	0	1	22	65	90	70	99	99	99	100	0	0
ATRASO (%)	0	2.12	1	0	29.05	0.41	0	0	0	0	0	0

*En caso de requerir mas datos en el apartado de estado financiero utilizar obra h04.

[illegible]



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	04/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

LOCALIDAD:

No. DE OBRA:

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA:

2024/09/09/046

2024/09/09/046

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

OBRA REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE OBRA: RURAL

ZONA: URBANA

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

SI

X

NO

CLAVE:

AGEB:

SI

X

NO

X

NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD

-96.909581400

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:

DIRECCIA

X

COMPLEMENTARIA

RESERVA

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

X

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

FACTURAS

No. EST:

No.

MONTO

IMPORTE NETO

IN

644

\$189,853.79

\$189,853.79

ANTICIPO

FADDFES

\$169,545.69

\$169,545.69

TOTALES

\$293,124.63

\$189,853.79

\$169,545.69

\$169,545.69

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

74/10/2024

MONTO PAGADO EN EL MES:

\$189,853.79

MONTO PAGADO ACUMULADO:

\$189,853.79

FINQUITO CON IVA:

\$0.00

ACTA ENTREGA RECEPCION:

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO [META] DE LA OBRA:

REFABRICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LUIS FERNANDO ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA Y FINAL DE LA CALLE LUIS FERNANDO DEL TRACCIONAMIENTO LOS ANGELES EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

MONTO AUTORIZADO:

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:

VALIDACION DEL PROYECTO:

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:

PERMISOS Y CONCESIONES:

DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:

\$700,000.00

\$700,000.00

EXISTE

CIMAS

EXISTE

CIMAS

EXISTE

H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.

TIPO DE LICITACION:

ADJUDICACION DIRECTA

INVITACION A MENOS 3 PERSONAS

EXISTE

NO. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

RFC:

MONTO CONTRATADO:

PERIODO DE EJECUCION:

ANTICIPO:

CIMAS-OP-025/2024

CONSTRUCCION 24.09 SA DE CV

CONSTRUCCION 24.09 SA DE CV

\$565,152.30

INICIO 21/02/2024

TERMINO 20/04/2024

DIAS 60

MONTO: \$169,489.17

FECHA DE PAGO: 07/03/2024

FECHA:

20/02/2024

TIPO DE FIANZA:

MONTO AFIANZADO:

AFIANZADORA:

No. DE FIANZA:

FECHA:

CONVENIO MODIFICATORIO:

ANTICIPO

\$169,489.17

NACIONAL FINANZAS MEXICANAS

BRY-0202-0191241

20/02/2024

MONTO EXISTE

IMPORTE PERIODO INICIAL FINAL

20/02/2024 20/04/2024

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO CONTRATO) DE OBRA:

\$565,152.30

Ing. Adrián Muñoz Moscoso

DIRECTOR DE OBRAS

RESIDENTE DE OBRA EN FUNCIONES DE SUPERVISOR DE OBRA

FORMATO 11

*En caso de superar a más libras el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 20243050940051 DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS LASCURAIN, ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS,

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE: N/A
ZONA: URBANA AGE: NO X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD: -96.931751300
LATITUD: 19.516017900

ANTECEDENTES:
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE: N/A
ZONA: URBANA AGE: NO X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD: -96.931751300
LATITUD: 19.516017900

GRADO DE REZAGO SOCIAL:
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
DIRECTA X COMPLEMENTARIA
R/S FRUSTRADA

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS		5 MILLAR		CARGOS ADICIONALES		IMPORTE NETO
	No.	MONTO	No.	MIL	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
3A	SPEI	\$132,141.82	8389F		\$39,642.55	\$569.58	\$0.00	\$0.00	\$91,929.63
3N	SPEI	\$311,058.06	4E46A		\$93,317.42	\$1,340.77	\$0.00	\$0.00	\$236,398.87
2A	SPEI	\$151,318.08	63005		\$45,395.42	\$65.23	\$0.00	\$0.00	\$105,270.43
2N	SPEI	\$433,727.47	4CD27		\$130,118.74	\$1,869.51	\$0.00	\$0.00	\$301,739.72
1A	SPEI	\$8,374.18	DE547		\$2,512.75	\$36.10	\$0.00	\$0.00	\$5,825.83
ANTICIPO	SPEI	\$568,338.97	42F00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,338.97
1N	SPEI	\$419,093.16	44280		\$125,727.95	\$1,806.44	\$0.00	\$0.00	\$291,558.77
TOTALES		\$1,455,712.77			\$1,455,712.77	\$6,274.03	\$0.00	\$0.00	\$1,581,063.28

B) REPORTE		AVANCE FISICO REAL											
EXISTE		FECHAS											
MONTO PAGADO EN EL MES:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													

OBSERVACIONES:

* En caso de liquidar mas de una vez en el mes, se debe utilizar el valor de la liquidación de la última vez.

FECHA DE ELABORACION: 22/12/2024
MES QUE SE REPORTA: OCTUBRE

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS LASCURAIN, ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS,

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS LASCURAIN, ENTRE PROLONGACION LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, RAYMUNDO SALAS ENTRE CALLE CARLOS LASCURAIN Y ANDADOR LUIS G. MURILLO, ANDADOR LUIS G. MURILLO ENTRE ANDADOR PABLO H. MEDINA Y FINAL DE ANDADOR, ANDADOR PABLO H. MEDINA ENTRE ANDADOR LUIS G. MURILLO Y CARLOS LASCURAIN

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DEL 99%

MONTO AUTORIZADO: \$1,980,000.00 CIVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,980,000.00 CIVA
VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: CMAS
PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.
TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA EXISTE
INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X
LICITACION PUBLICA

NO. DE CONTRATO: CMAS 01-05-0-2024 FECHA: 28/02/2024
CONTRATISTA: MIGUEL TELLO SEGURA
RFC: TESSM5305082E3
MONTO CONTRATADO: \$1,894,403.23 CIVA
PROGRAMADA REAL
29/02/2024 29/02/2024
PERIODO DE EJECUCION: INICIO TERMINO
27/06/2024 27/06/2024
DIAS 120 215
APLICA X NO APLICA
MONTO: \$568,338.96 PORCENTAJE: 30.00
FECHA DE PAGO: 13/03/2024

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO FIANZADO: \$568,338.97 \$163,315.80
AFIANZADORA: INSTITUCION DE GARANTIA INSTITUCION DE GARANTIA
No. DE FIANZA: 2893652 2893655
FECHA: 28/02/2024 28/02/2024
CONVENIO EXISTE IMPORTE PERIODO FECHA
MODIFICATORIO: MONTO PLAZO INICIAL FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$1,894,403.23 CIVA

Res. Víctor Quiroz, Director
DIRECTOR DPT OBRAS
RESIDENTE DE OBRA EN FUNCIONES DE SUPERVISOR DE OBRA
FORMATO 11

[illegible]

^aEn caso de requerir más filas en el acortado de estados financieros utilizar cero (0).



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACIÓN:	22/12/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

[illegible]

²² El caso de requerir más frías en el apartado de volúmenes financieros utilizar otra ley.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
07/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA, ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024304900058 DESCRIPCION DE LA OBRA:

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION EXTERNA DE OBRA PUBLICA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE AGEB: N/A
ZONA: RURAL URBANA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 19.5477447500 LONGITUD -96.9166589300
GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA
RESTRICTIDA

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION EXTERNA DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	Monto con IVA	Pólizas cheque		Facturas		Ingresos con IVA	Ingresos con IVA	Cargos adicionales	Importe neto
		No.	Monto	No.	Monto				
7N	\$542,996.09	SPEI	\$323,457.16	CF0134	\$2,340.50	\$542,996.09	\$217,198.43	\$0.00	\$323,457.16
5N	\$542,996.09	SPEI	\$323,457.16	73	\$2,340.50	\$542,996.09	\$217,198.43	\$0.00	\$323,457.16
3N	\$542,996.09	SPEI	\$323,457.16	14	\$2,340.50	\$542,996.09	\$217,198.43	\$0.00	\$323,457.16
ANTICIPO		SPEI	\$1,863,540.00	D6836	\$0.00	\$1,863,540.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863,540.00
1N	\$357,660.12	SPEI	\$213,054.43	10	\$1,511.64	\$357,660.12	\$143,064.05	\$0.00	\$213,054.43
2N	\$456,505.92	SPEI	\$271,935.85	12	\$1,967.70	\$456,505.92	\$182,602.37	\$0.00	\$271,935.85
4N	\$542,996.09	SPEI	\$323,457.16	18	\$2,340.50	\$542,996.09	\$217,198.43	\$0.00	\$323,457.16
6N	\$542,996.09	SPEI	\$323,457.16	078	\$2,340.50	\$542,996.09	\$217,198.43	\$0.00	\$323,457.16
TOTALES			\$2,102,276.08		\$3,521.84	\$3,529,146.49	\$1,411,658.57	\$0.00	\$3,565,816.08

AVANCE FISICO DE LA OBRA 91.09.93%

Monto autorizado:	\$4,658,850.00	C/IVA	
Monto del presupuesto base:	\$4,658,850.00	C/IVA	
Validación del proyecto:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
Dependencia que valida:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
Facilidad del proyecto:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
Dependencia que otorga la:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
Facilidad:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
Permisos y concesiones:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
Dependencia que otorga los permisos:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA INVTACION A MENOS 3 PERSONAS EXISTE X
LICITACION PUBLICA

No. de contrato: CMAS-SH-001-2024 FECHA: 12/03/2024
Contratista: GRUPO DESARROLLADOR DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
RFC: GDI200421180
Monto contratado: \$4,658,850.00 PROGRAMADA REAJ C/IVA
Periodo de ejecución: INICIO 12/03/2024 31/12/2024 12/03/2024
Días 295
Monto: \$1,863,540.00 NO APLICA 234
Fecha de pago: 14/03/2024 PORCENTAJE: 40.00

B) REPORTE		FECHAS											
Monto pagado en el mes:	Monto pagado acumulado:	Finiquito con IVA:	Acta entrega recepción:	Avance físico real									
				Avance	Programado	Real	Atraso (%)	Avance	Programado	Real	Atraso (%)	Avance	Programado
\$323,457.16	\$7,102,276.08	\$0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VÍCIOS OCULTOS
Monto afianzado: \$1,863,540.00 \$403,625.00
Afianzadora: INSTITUCION DE GARANTIA INSTITUCION DE GARANTIA
No. de fianza: 2807992 2897997
Fecha: 12/03/2024 12/03/2024
Compendio: MONTO EXISTE IMPORTE PERIODO FECHA
Modificatorio: PLAZO INICIAL FINAL
Monto total contratado (compendio + contrato) de obra: \$4,658,850.00 C/IVA

Ing. Adán Burgos Manrí
Ing. Civil Juan Ortiz Argüelles
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir más flexión al reportar el estado financiero utilizar esta hoja



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
22/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ No. DE OBRA: 202430900001
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL BARRAGAN, ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO.

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE AGEB: N/A
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA SI X NO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO
ANTECEDENTES: DIRECTA X COMPLEMENTARIA
GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: RESTRICCIÓN

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.561230900 LONGITUD -96.899852200

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTOS CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS		IMPORTE			
		No.	MONTOS	No.	MONTOS	No.	MONTOS	No.	MONTOS
ANTICIPO IN	\$162,013.52	SPEI	\$162,013.52	20906	\$162,013.52	16	\$162,013.52		\$162,013.52
	\$347,224.74	SPEI	\$347,224.74		\$347,224.74		\$347,224.74		\$347,224.74
TOTALES	\$347,224.74		\$347,224.74		\$347,224.74		\$347,224.74		\$347,224.74

NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-097-2024 FECHA: 04/04/2024
CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES HARA SAS DE CV
RFC: PCC200310M7A
MONTOS CONTRATADOS: \$540,045.08
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 05/04/2024 REAL 05/04/2024
TERMINO 19/05/2024 19/06/2024
DÍAS 45 76
APLICA X NO APLICA
MONTOS: \$161,959.51 PORCENTAJE: 29.99
FECHA DE PAGO: 11/04/2024
ANTICIPO: NO APLICA

TIPO DE FINANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VÍCIOS OCURTOS
MONTOS AFIANZADOS: \$162,013.52 \$46,555.61 \$50,783.98
AFIANZADORA: JUANZAS AVANZA, SA DE CV JUANZAS AVANZA, SA DE CV JUANZAS AVANZA, SA DE CV
No. DE FINANZA: 7406 7406 7406
FECHA: 04/04/2024 04/04/2024 23/06/2024
CONVENIO MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
MODIFICATORIO: PLAZO INICIAL FINAL
MONTOS TOTAL CONTRATADOS (CONVENIO CONTRATO) DE OBRA: \$540,045.08
Ing. Civil Víctor Hugo Hernández Pérez SUPERVISOR DE OBRAS

OBSERVACIONES:
Ing. Adán Burgos Montiel DIRECTOR DE OBRAS
FORMATO 11

*En caso de require mes fias en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
04/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 202430909062 DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE 3 CON PREPARACIONES DE RED

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE

ZONA: RURAL N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEOREFERENCIA LONGITUD -96.907018700

LATITUD 19.556690700

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA

RESTRINGIDA

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE 3 CON PREPARACIONES DE RED SANITARIA Y AGUA POTABLE EN CALLES RIO SOTO LA MARINA, RIO COLORADO, RIO SAN ANDRES Y RIO SORDO, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	Monto con IVA	Pólizas Cheque		Facturas				Importe Neto
		No.	Monto	No.	Monto	5 Millar	Cambio Adicionales	
2N	\$672,879.78	SPEI	\$462,314.82	146	\$672,879.78	\$2,900.34	\$5,800.69	\$462,314.82
1A	\$125,253.58	SPEI	\$86,057.85	144	\$125,253.58	\$37,576.07	\$1,079.77	\$86,057.85
1N	\$454,816.00	SPEI	\$312,489.96	141	\$454,816.00	\$1,960.41	\$3,920.83	\$312,489.96
Anticipo	\$678,331.47	SPEI	\$678,331.47	139	\$678,331.47	\$0.00	\$0.00	\$678,331.47
TOTALES	\$1,252,949.36		\$860,862.63		\$1,252,949.36	\$375,884.80	\$10,801.29	\$1,539,194.10

B) REPORTE

MONTO PAGADO EN EL MES:	\$462,314.82	FECHAS	28/10/2024
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$860,862.63		
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCION:			

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-061-2024 FECHA: 22/04/2024
CONTRATISTA: ACARREOS DE BASALTICO Y ASFALTO SA DE CV
RFC: ABA090901070
MONTO CONTRATADO: \$2,261,104.00 C/IVA
PERIODO DE EJECUCION: INICIO 13/04/2024 REAL 13/04/2024
TERMINO 09/09/2024
ANTICIPO: APLICA X NO APLICA 171
MONTO: \$678,331.20 PORCENTAJE: 30.00
FECHA DE PAGO: 17/04/2024

TIPO DE FINANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VITOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO: \$678,331.47 \$194,922.81
AFIANZADORA: ADORA INSURGENTES, SA DE CV
No. DE FINANZA: 8246-01197-6
FECHA: 12/04/2024
CONVENIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
MODIFICATORIO: PLAZO INICIAL FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$2,261,104.00 C/IVA

Ing. Civil Víctor Hugo Hernández Pérez
DIRECTOR DE OBRAS
SUPERVISOR DE OBRAS
FORMATO 11

*En caso de requerir más datos en el apartado de estado financiero utilizar 50+ hoja



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
04/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 202409090003		DESCRIPCION DE LA OBRA:	
Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		Antecedentes:		Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Circuito Las Flores, de Camino al Sumidero a Camino al Sumidero, Colonia El Tanque, Xalapa, Veracruz.	
Tipo de Obras Realizadas con Fism-Df:		Grado de Rezago Social:		Descripción detallada del objeto (meta) de la obra:	
Zona: Urbana		Puj Alto Medio Bajo		Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario y Red de Agua Potable en Calle Circuito Las Flores, de Camino al Sumidero a Camino al Sumidero, Colonia El Tanque, Xalapa, Veracruz.	
Se encuentra en una Zap:		Tipo de Contribución del Proyecto:		Descripción del avance físico de la obra en el mes:	
Se encuentra en el Catálogo		Directa X Complementaria		Avance físico de la obra del 99%	
Coordenadas de Georreferencia		Longitud -96.893537600			
Latitud 19.594085200					
C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*					
Facturas					
No. Est.	No. Poliza	No. Cheque	No. Factura	No. Factura	No. Factura
3N	SP01	\$96,378.17	123	\$96,378.17	\$96,378.17
2A	SP01	\$96,615.50	A115	\$96,615.50	\$96,615.50
Anticipo	SP01	\$216,842.70	3956C	\$216,842.70	\$216,842.70
1N	SP01	\$214,054.65	609D0	\$214,054.65	\$214,054.65
2N	SP01	\$148,915.60	A114	\$148,915.60	\$148,915.60
3A	SP01	\$98,782.68	A122	\$98,782.68	\$98,782.68
	SP01	\$25,106.76		\$25,106.76	\$25,106.76
TOTAL ES \$670,464.32 \$465,298.71 \$201,739.30 \$2,889.94 \$1,136.37 \$687,141.41					
B) REPORTE					
Avance Físico Real					
Avance					
Programado					
Real					
Acumulado					
Atraso (%)					
Observaciones:					
Monto pagado en el mes: \$171,464.93					
Monto pagado acumulado: \$465,298.71					
Finiquito con IVA: \$0.00					
Acta entrega recepción:					
Observaciones:					

*En caso de requerir más líneas de aperturas de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. Guillermo Montero Pérez
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Carlos Gustavo Hernández Paredes
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 311

[illegible]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024305090068

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISH-DF: CLAVE AGE: N/A
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.546992300 LONGITUD -96.884036400

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE LACANDON, ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMIANARO, COLONIA HIGUITAS, XALAPA, VERACRUZ

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	Monto con IVA	Pólizas Cheque		Facturas		Importe Neto
		No.	Monto	Importe con IVA	Cargos adicionales	
1N	\$527,916.30	SPEI	\$367,265.91	\$158,374.89	\$0.00	\$367,265.91
Anticipo	\$449,968.44	SPEI	\$449,968.44	\$0.00	\$0.00	\$449,968.44
1A	\$25,898.61	SPEI	\$18,017.42	\$7,769.59	\$0.00	\$18,017.42
TOTALES	\$553,814.94		\$385,283.33	\$166,144.48	\$0.00	\$385,251.77

B) REPORTE

EXISTE: \$0.00
Monto pagado en el mes: \$367,265.91
Monto pagado acumulado: \$0.00
Finiquito con IVA: \$0.00
Acta entrega recepción:

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	7.65	43.41	14.83	10.06	21.04	0	0	0	0
REAL	0	0	0	1.17	7.65	0.5	8.5	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	1.17	35.76	90.5	99	99	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	14.33	1.56	27.04	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

FECHA DE ELABORACION: 22/11/2024
MES QUE SE REPORTA: OCTUBRE

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE LACANDON, ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMIANARO, COLONIA

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CHARPILACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE LACANDON, ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAM Y CALLE KILIMIANARO, COLONIA HIGUITAS, XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

Monto autorizado: \$1,600,000.00
Monto del presupuesto base: \$1,600,000.00
Validación del proyecto: EXISTE X NO EXISTE
Dependencia que otorga: CMAS
Dependencia que otorga la: CMAS
Factibilidad: EXISTE X NO EXISTE
Permisos y concesiones: EXISTE X NO EXISTE
Dependencia que otorga: H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
Tipo de licitación: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS EXISTE
Licitación pública: X

No. de contrato: CMAS-OP-063-2024
Contratista: GARCIA RIVAS CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SA DE CV
RFC: GRC03012 ITU1
Monto contratado: \$1,499,894.80
Programa: REAL
Periodo de ejecución: INICIO 18/04/2024
Termino 15/08/2024
Días 170
Aplica: X NO APLICA
Anticipo: MONTO: \$449,968.44 PORCENTAJE: 30.00
Fecha de pago: 26/04/2024

Tipo de fianza: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
Monto afianzado: \$449,968.44 \$129,301.28 \$138,897.82
Afianzadora: SURADORA ASERTA, SA (SURADORA ASERTA, SA B)
No. de fianza: 3679-03447-5 3679-03447-5 3679-03576-2
Fecha: 17/04/2024 17/04/2024 25/07/2024
Convenio: EXISTE IMPORTE/PERIODO
Modificatorio: MONTO PLAZO INICIAL FINAL
Monto total contratado (convenio): NO APLICA X
Monto total contratado (convenio): \$1,499,894.80 C/IVA

Ing. Acacio Burgos Montiel
DIRECTOR DE OBRAS
Acq. Carlos Gustavo Hernández Paredes
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de liquidez mas flex en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



FECHA DE ELABORACION:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

^aEn caso de requerir más filas en el apartado financiero utilizar otra hoja.

AVANCE FISICO DEL 90%

TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE
ADJUDICACIÓN DIRECTA	
INVITACIÓN A MENOS DE 3 PERSONAS	X
licitación pública	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$1,242,211.24	\$356,457.25	
AFIANZADORA:	INSTITUCION DE GARAN	INSTITUCION DE GARAN	
No. DE FIANZA:	2508/280	7908790	
FECHA:	12/04/2024	12/04/2024	
	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO	MONTO	INICIAL	FINAL
MODIFICATORIO:	PLAZO		
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO +			
CONTRATO DE OBRA:		\$4,140,464.00	C/DMA

Ing. Adán Burgos Montiel
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Juan Carlos Jara
RESIDENTE DE OBRA EN FUNCIONES DE SUPERVISOR DE OBRA

FORMATO 11

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA *									
No. EST.	PÓLIZAS CUILQUI			FACTURAS					
	MONTO CON IVA	No.	MONTO	No.	MONTO CON IVA ESTIMACION	ANEXOS CONTINUA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
4B	\$140,230.23	SPFI	\$97,556.72	00725	\$140,230.23	\$42,069.07	\$604.44	\$0.00	\$97,556.72
4N	\$681,257.50	SPFI	\$473,943.80	00725	\$681,257.50	\$704,377.25	\$2,946.45	\$0.00	\$473,943.80
1A	\$91,324.19	SPFI	\$63,533.29	00691	\$91,324.19	\$27,397.26	\$393.64	\$0.00	\$63,533.29
ANTICIPO	\$1,242,211.24	SPFI	\$1,242,211.24	684	\$1,242,211.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,211.24
1N	\$840,744.45	SPFI	\$584,897.21	00692	\$840,744.45	\$252,773.34	\$3,623.90	\$0.00	\$584,897.21
2N	\$270,285.57	SPFI	\$188,034.88	00699	\$270,285.57	\$81,085.67	\$1,105.02	\$0.00	\$188,034.88
2A	\$255,208.91	SPFI	\$177,546.20	00698	\$255,208.91	\$76,562.67	\$2,100.04	\$0.00	\$177,546.20
3N	\$194,662.98	SPFI	\$135,425.03	00714	\$194,662.98	\$58,398.89	\$839.06	\$0.00	\$135,425.03
3A	\$106,294.25	SPFI	\$73,947.81	00716	\$106,294.25	\$31,888.28	\$458.16	\$0.00	\$73,947.81
TOTALES	\$2,580,008.08		\$1,794,884.94		\$2,580,008.08	\$774,002.43	\$11,176.71	\$0.00	\$2,580,008.08

OBSERVACIONES:



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
22/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPALIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUILZ DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ROBLE ENTRE LAS CALLES OLMO Y CEDRO, EN LA CALLE CEDRO ENTRE LAS CALLES

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

XALAPA-ENRIQUILZ 2024-2030-00071

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE AGE: N/A
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD -96.881248800

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ROBLE ENTRE LAS CALLES OLMO Y CEDRO, EN LA CALLE CEDRO ENTRE LAS CALLES FRAMBOYANES Y LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA LOS CEDROS, EN LA RESERVA TERRITORIAL Y EN LA CALLE OLMO ENTRE LAS CALLES CIPRES Y EUCALIPTO EN LA COLONIA ROSALES DE LAS LOMAS DE XALAPA, VER. C/IVA

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	Monto con IVA	Polizas que se		No.	Monto	Facturas		Importe
		No.	Monto			\$ MILAR	Importes	
3A	\$55,140.82	SPEI	\$38,300.80	00706	\$55,140.82	\$16,642.25	\$237.68	\$38,300.80
3N	\$154,712.81	SPEI	\$107,632.10	00705	\$154,712.81	\$46,013.44	\$666.87	\$107,632.10
1B	\$203,953.44	SPEI	\$141,888.30	00693	\$203,953.44	\$61,186.03	\$879.11	\$141,888.30
1N	\$678,904.26	SPEI	\$472,306.67	00694	\$678,904.26	\$203,671.28	\$7,926.31	\$472,306.67
ANTICIPO	\$638,921.80	SPEI	\$638,921.80	688	\$638,921.80	\$0.00	\$0.00	\$638,921.80
2N	\$207,441.45	SPEI	\$144,314.88	00703	\$207,441.45	\$62,732.43	\$894.14	\$144,314.88
2A	\$295,446.42	SPEI	\$205,539.01	704	\$295,446.42	\$88,633.93	\$1,273.48	\$205,539.01
4N	\$140,268.20	SPEI	\$97,583.14	00718	\$140,268.20	\$42,080.46	\$604.60	\$97,583.14
4A	\$33,321.34	SPEI	\$23,181.31	0719	\$33,321.34	\$9,996.40	\$243.63	\$23,181.31
5N	\$267,469.49	SPEI	\$186,075.75	00723	\$267,469.49	\$80,240.85	\$1,152.89	\$186,075.75
5A	\$57,575.66	SPEI	\$40,054.75	00724	\$57,575.66	\$17,272.70	\$248.17	\$40,054.75
TOTALES	\$1,084,233.89		\$1,456,936.84		\$2,084,233.89	\$628,270.17	\$9,026.88	\$1,084,233.89

B) REPORTE

EXISTE \$0.00

FECHAS

MONTO PAGADO EN EL MES: \$1,456,936.84

MONTO PAGADO ACUMULADO: \$0.00

FINQUITO CON IVA: \$0.00

ACTA ENTREGA RECEPCION:

OBSERVACIONES:

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MONTO AUTORIZADO: \$2,550,000.00 C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$2,550,000.00 C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS
FACTIBILIDAD: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
LOS PERMISOS: EXISTE

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA
INVITACION A MENOS 3 PERSONAS
X
NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-064-2024
FECHA: 17/04/2024
CONTRATISTA: GR INFRASSTRUCTURA CIVIL E INMOBILIARIA SA DE CV
RFC: GIC041120FS2
MONTO CONTRATADO: \$2,129,739.34
PERIODO DE EJECUCION: INICIO 18/04/2024 REAL 18/04/2024
TERMINO 14/05/2024
DIAS 150
APLICA X NO APLICA 19/
MONTO: \$638,708.82
FECHA DE PAGO: 19/04/2024
PORCENTAJE: 29.99

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO
MONTO AFIANZADO: \$638,921.80
AFIANZADORA: INSTITUCION DE GARANTIA INSTITUCION DE GARANTIA
FECHA: 29/08/2024
MONTO EXISTE 29/08/2024
CONVENIO EXISTE 29/08/2024
MODIFICATORIO: MONTO EXISTE 29/08/2024
PLAZO EXISTE 29/08/2024
INICIAL FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO CONTRATO) DE OBRA: \$2,129,739.34
C/IVA
Ing. Civil Gilberto Montero Pérez
OTRO EN FUNCIONES DE SUPERVISOR DE OBRA
Ing. Adán Vargas Montiel
DIRECTOR DE OBRAS
FORMATO 11

*En caso de requerir más días de el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

[illegible]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
04/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA, ENRIQUETZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRAS: 2024300090073 DESCRIPCION DE LA OBRA:

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: SI X NO
TIPO DE ZONA: RURAL N/A
URBANA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO
CLAVE AGE: N/A
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD 96.893816100
LATITUD 19.522619800

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL: PUY ALTO MEXICO BAJO PUY BAJO X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA
DIREC: DIRECTA

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL SUMIDERO ENTRE CALLES

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL SUMIDERO ENTRE CALLES CALICASSO Y LAGOS DE IGUAZU; CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MACALES HIMALAYA, ENTRE CALLES LAGOS DE IGUAZU Y CASILLA, ENTRE CASILLA Y

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 75%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	POLIZAS CHEQUE	No.	MONTO	MONTO CON IVA	FACTURAS				IMPORTE NETO
					PROYECTO OBRAS	IMPORTE CON IVA	IMPORTE CON IVA	CARGOS ADICIONALES	
3N									
ANTICIPO									
1N									
2N									
TOTALES									

MONTO AUTORIZADO:	\$40,000,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$40,000,000.00	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA:	EXISTE	NO EXISTE
FECHABILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FECHABILIDAD:	EXISTE	NO EXISTE
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	EXISTE	NO EXISTE
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE
	INVITACION A MENOS DE 3 PERSONAS	EXISTE
	LICITACION PUBLICA	EXISTE

NO. DE CONTRATO: CMAS-01-058-2024
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LUPAMA SA DE CV
RFE: CL1840203RVA
MONTO CONTRATADO: \$39,145,996.60
PERIODO DE EJECUCION: INICIO 25/04/2024 REAL 25/04/2024
TERMINO 20/12/2024
DIAS 240
APLICA X NO APLICA
MONTO: \$11,743,798.98 PORCENTAJE: 30.00
FECHA DE PAGO: 09/05/2024

B) REPORTE			AVANCE FISICO REAL												
EXISTE		FECHAS													
		30/10/2024													
MONTO PAGADO EN EL MES:		\$4,388,847.40													
MONTO PAGADO ACUMULADO:		\$10,572,050.33													
FINQUITO CON IVA:		\$0.00													
ACTA ENTREGA RECEPCION:															

AVANCE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMA/PROYECTO	REAL	0	0	0	0	5,892	14,171	9,671	11,174	12,887	13,407	0	0
ACUMULADO	REAL	0	0	0	0	1	8	23	32	52	65	0	0
AVANZO (%)		0	0	0	1	9	50	33	45	50	75	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	7.85	0	0	0

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$39,145,996.60	C/IVA
---	-----------------	-------

Ing. Adalberto Aguilar
DIRECTOR DE OBRAS

Arg. Carlos Gustavo Hernandez Paredes
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*El caso de requerimiento para el aporte de apoyo financiero utilizar otra hoja



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA, ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024308050074 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE XALAPA.

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE: N/A AGEB: NO X
ZONA: URBANA SI NO X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI NO X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA COMPLEMENTARIA
RESTRENCIA: RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD: -96.885448300

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS		AVANCE		IMPORTE		C/IVA
	MONTO CON IVA	MONTO	No.	MONTO	AVANCE CON IVA	AVANCE SIN IVA	S MILLAR	CENTAVOS DECIMALES	
2N	\$718,581.09	\$571,767.54	203	\$718,581.09	\$143,716.22	\$3,097.33	\$571,767.54		C/IVA
1N	\$213,145.51	\$169,397.67	179	\$213,145.51	\$42,628.11	\$0.00	\$169,397.67		C/IVA
ANTICIPO	\$398,957.29	\$398,957.29	ED4F3	\$398,957.29	\$0.00	\$0.00	\$398,957.29		X
TOTALES	\$931,726.60	\$741,365.21		\$932,726.60	\$186,345.33	\$4,016.06	\$1,140,322.50		

B) REPORTE		FECHAS	
EXISTE		09/10/2024	
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$571,767.54		
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$741,365.21		
FINQUITO CON IVA:	\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCION:			

AVANCE FISICO REAL											
AVANCE											
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA COMPLEMENTARIA
RESTRENCIA: RESTRINGIDA

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE DEL 96.58%

MONTO AUTORIZADO:	\$2,000,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,000,000.00	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA:	EXISTE	NO EXISTE
FACTIBILIDAD:	EXISTE	NO EXISTE
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA:	EXISTE	NO EXISTE
LOS PERMISOS:	EXISTE	NO EXISTE

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA
INVITACION A MENOS 3 PERSONAS
LICITACION PUBLICA

NO. DE CONTRATO:	CMAS-SR-002-2024	FECHA:	01/06/2024
CONTRATISTA:	GRUPO NOVAC MIMIC SA DE CV		
RFC:	GNM341201116		
MONTO CONTRATADO:	\$1,994,786.44	PROGRAMADA	REAL
PERIODO DE EJECUCION:	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024
INICIO	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024
TERMINO	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
DIAS	180	180	180
APLICA	X	NO APLICA	153
MONTO:	\$398,957.28	MONTO:	153
FECHA DE PAGO:	18/06/2024	PORCENTAJE:	20.00

TIPO DE FLANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VILLOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$398,957.29	\$171,961.35	
AFIANZADORA:	IN LEMRY, ASESURADORIA Y SERVICIOS FINANCIEROS		
NO. DE FLANZA:	2281144	2281146	
FECHA:	01/06/2024	01/06/2024	FECHA
CONVENIO	EXISTE	EXISTE	FECHA
MODIFICATORIO:	MONTO	PLAZO	INICIAL
	PLAZO	FINAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO:	NO APLICA		
CONTRATO DE OBRA:	\$1,994,786.44		

Inf. Adm. Burgos Montiel
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Gilberto Montero Perez
OTRO EN FUNCIONES DE SUPERVISOR

*En caso de cualquier mal funcionamiento en el aplicativo de estado financiero utilizar otra hoja

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUETZ	A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024-090900075	DESCRIPCION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NABOR TEJEDA, ENTRE LA CALLE PROL. ADOLFO RUIZ CORTINES Y LIQUIDAMBAR, Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NABOR TEJEDA, ENTRE LA CALLE PROL. ADOLFO RUIZ CORTINES Y CEDRO, EN LA COLONIA 21 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:				ANTECEDENTES:			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				SI	X	NO	
TIPO DE ZONA:				CLAVE			
RURAL				AGEB:			
URBANA					N/A	MUY ALTO	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
					ALTO	MEDIO	MUY BASTO
							X
				TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:			
				SI	NO	X	

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NABOR TEJEDA, (ENTRE LA CALLE PROL. ADOLFO RUIZ CORTINES Y LIQUIDAMBAR) Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NABOR TEJEDA, (ENTRE LA CALLE PROL. ADOLFO RUIZ CORTINES Y CEDRO), EN LA COLONIA 21 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	LONGITUD	-96.931103200
LATITUD	19.574044900	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

FACTURAS				FUTURAS			
No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE	No.	MONTO	No.	MONTO	IMPORTE NETO
3N	\$306,182.92	SPEI	\$304,863.17	2567	\$306,182.92	\$0.00	\$304,863.17
TOTALES	\$306,182.92		\$304,863.17	\$0.00	\$1,319.75	\$0.00	\$304,863.17

B) REPORTE		AVANCE FISICO REAL												AVANCE				EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:		CONVENIO		PLAZO		EXISTE		MODIFICATORIO:	
------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------------	--

OBSERVACIONES:	
----------------	--

Ing. Adan Burgos Montiel	Ing. Heber Al Montenegro Morales
DIRECTOR DE OBRAS	SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

* En caso de reportar más de una obra, se debe utilizar el formato 11.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
04/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUETZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	NO. DE OBRA: 2024309050077
DESCRIPCION DE LA OBRA:	

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (CIRCUITO QUETZALCOATL) ENTRE LAS CALLES TEMASCALTEPEC Y XOLOTL, COL. RESERVA TERRITORIAL EN XALAPA, VERACRUZ.	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DE OBRA DEL 100%	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	Monto con IVA	Polizas cheque	Facturas					Importe neto	CIVA
			No.	No.	Importe obra con IVA	Importe obra con IVA	5 MILLAR		
3W	\$390,006.38	SPFI	25844		\$390,006.38	\$117,001.91	\$1681.06	\$271,373.41	CIVA
3A	\$59,584.51	SPFI	94702		\$59,584.51	\$17,875.35	\$256.83	\$41,452.33	CIVA
2N	\$251,329.87	SPFI	10109		\$251,329.87	\$75,398.96	\$1,083.32	\$174,817.59	NO APLICA
ANTICIPO	\$499,918.37	SPFI	F0182		\$499,918.37	\$0.00	\$0.00	\$499,918.37	NO APLICA
	\$550,241.63	SPFI	25579		\$550,241.63	\$165,071.49	\$2,371.73	\$382,797.41	CMAS
	\$61,351.30	SPFI	67879		\$61,351.30	\$18,405.39	\$264.45	\$42,681.46	NO APLICA
	\$37,014.39	SPFI	FF152		\$37,014.39	\$11,104.32	\$159.54	\$25,750.53	EXISTE
									EXISTE

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-076-2024	FECHA:	10/05/2024
CONTRATISTA:	NAHUALTEC CONSTRUCCIONES, SA DE CV		
RFC:	NO1302266E1		
Monto contratado:	\$1,666,394.55	PROGRAMADA	REAL
Periodo de ejecución:	11/05/2024	INICIO	11/05/2024
	07/09/2024	TERMINO	07/09/2024
	120	DIAS	120
Anticipo:	X	APLICA	NO APLICA
	\$499,918.36	Monto	Porcentaje: 30.00
	15/05/2024	Fecha de pago:	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
Monto afianzado:	\$499,918.37	\$243,654.70	\$195,258.31
Afianzadora:	SITIO DE OBRAS DE GARANTIA INSTITUCION DE GARANTIA		
No. de fianza:	2915899	2015003	3978425
Fecha:	10/05/2024	10/05/2024	30/05/2024
Convenio	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
Modificatorio:	X	314188.09	25/11/2024
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	11/05/2024	22/09/2024	25/11/2024
Monto total contratado (convenio + contrato) de obra:	\$1,980,583.24		CIVA

OBSERVACIONES:	
Ing. Heber Al Montemayor Medel SUPERVISOR DE OBRAS	
FORMATO 11	

*En caso de requerir más días en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUITZ		A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2024-30000078		DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LA CALLE LAS PALMAS E INGENIO LA GLORIA, COL. NACIONAL Y	
ANTECEDENTES:					
Cuenta con Proyecto Ejecutivo: SI X NO					
Obras Realizadas con FISM-DF: CLAVE N/A					
Tipo de Zona: RURAL AGEB: SI X NO					
SE Encuentra en una Zap: SI X NO					
SE Encuentra en el Catálogo: SI X NO					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD: 19.564483000 LONGITUD: -96.901510600					
C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*					
FACTURAS					
No. EST.	Monto con IVA	No.	Monto	5 MILLAR	Importe Neto
26	\$176,012.10	552	\$176,012.10	\$758.67	\$177,528.94
IN	\$660,561.42	544	\$660,561.42	\$2,847.25	\$659,545.74
Anticipo	\$287,016.04	E1744	\$287,016.04	\$0.00	\$287,016.04
LA	\$137,077.05	548	\$137,077.05	\$590.85	\$95,363.08
TOTALES \$973,650.57 \$287,016.04 \$4,196.77 \$0.00 \$969,453.80					
B) REPORTE					
Monto Pagado en el Mes: \$127,528.94 02/10/2024					
Monto Pagado Acumulado: \$682,437.76					
Finiquito con IVA: \$0.00					
Acta Entrega Recepción:					
OBSERVACIONES:					
D) PLAN DE AVANCE					
Monto Autorizado: \$1,160,000.00					
Monto del Presupuesto Base: \$1,160,000.00					
Validación del Proyecto: Existe X No Existe					
Dependencia que Valida: CMAS					
Factibilidad del Proyecto: Existe X No Existe					
Dependencia que Otorga la Factibilidad: CMAS					
Permisos y Concesiones: Existe X No Existe					
Dependencia que Otorga los Permisos: H. Ayuntamiento de Xalapa					
Tipo de Licitación: Adjudicación Directa					
Licitación a Menos de 3 Personas: Existe X					
Licitación Pública: Existe X					
E) DATOS DE LA OBRA					
No. de Contrato: CMAS-OP-070-2024					
Contratista: CONSTRUCTORA RUIZACERO DE XALAPA SA DE CV					
RFC: CRO10307KAI					
Monto Contratado: \$956,720.34					
Programada: REAL					
Periodo de Ejecución: Inicio 24/04/2024					
Termino 01/08/2024					
Días: 191					
Anticipo: Aplica X No Aplica					
Monto: \$286,920.36					
Porcentaje: 29.99					
Fecha de Pago: 06/05/2024					
F) DATOS DE FINANZAS					
Tipo de Fianza: Anticipo					
Monto Afianzado: \$287,016.04					
Afianzadora: PRATICAL FINANZAS MEXICANAS S.A. DE CV					
No. de Fianza: BKY-0001-0199667					
Fecha: 24/04/2024					
Convenio: Importe/Per.000					
Modificatorio: Monto X					
Plazo: Plazo X					
Monto Total Contratado: \$1,128,988.14					
Convenio: NO APLICA					
Contrato de Obra: \$1,128,988.14					
Ing. Adm. Ingresos Municipales					
Ing. Heber Ali Montemayor Medel					
SUPERVISOR DE OBRAS					
FORMATO 1.1					

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	DESCRIPCION DE LA OBRA:
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL MIRADOR, ENTRE CALLES AV. PRINCIPAL Y FINAL DE PRIVADA EL MIRADOR, DE LA COLONIA EL MORAL.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 707243095080081	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:				SI		X		NO		ANTECEDENTES:			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:													
TIPO DE ZONA:		CLAVE AGEN:		N/A									
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO		X							
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO		SI		NO		X							
										GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
		MUY ALTO		ALTO		MEDIO		BAJO		MUY BAJO		X	
										TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
		DIRECTA		X		COMPLEMENTARIA				RESERVA			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA													
LATITUD		19.566438520		LONGITUD		-96.920506300							

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
		POLIZAS CHEQUE			FACTURAS				
No. EST.	MONTO CON IVA	No.	MONTO	No.	MONTO CON IVA ESTIMACION	ANOTACION CON IVA	\$ MILLAR	LARGAS ADICIONALES	IMPORTE NETO
1A	\$27,373.88	SPEI	\$19,043.73	870	\$27,373.88	\$8,212.16	\$117.99	\$0.00	\$19,043.73
1N	\$165,408.31	SPEI	\$115,072.85	869	\$165,408.31	\$49,622.49	\$712.97	\$0.00	\$115,072.85
ANTICIPO	\$299,166.80	SPEI	\$299,166.80	83788	\$299,166.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,166.80
2N	\$431,616.58	SPEI	\$300,271.19	874	\$431,616.58	\$129,484.97	\$1,860.42	\$0.00	\$300,271.19
2A	\$63,811.72	SPEI	\$44,393.15	876	\$63,811.72	\$19,243.52	\$275.05	\$0.00	\$44,391.15
TOTALES	\$688,210.49		\$478,280.92		\$688,210.49	\$206,463.14	\$2,966.43	\$0.00	\$777,947.72

B) REPORTE		EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00		
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$478,780.92		
FINQUITO CON IVA:	\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:			

OBSERVACIONES:

MONTO AUTORIZADO:		\$1,000,000.00		C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,000,000.00		C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA		CMAS			
FACTIBILIDAD:					
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA			
LOS PERMISOS:		EXISTE			
TIPO DE LICITACIÓN:		X			
ADJUDICACIÓN DIRECTA					
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS					
LICITACIÓN PÚBLICA					
NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-071-2024		FECHA: 01/05/2024	
CONTRATISTA:		GAMA-PAP, SA DE CV			
RFC:		GAM210611MN2			
MONTO CONTRATADO:		\$997,222.68		C/IVA	
		PROGRAMA		REAL	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO		01/05/2024	
		TERMINO		08/08/2024	
		DÍAS		100	
APLICA		X		NO APLICA	
ANTICIPO:		MONTO:		PORCENTAJE: 29.99%	
		\$299,166.80		06/05/2024	
		FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$299,168.80	\$85,967.17	\$90,722.27
AFIANZADORA:	458 FIATLAS MONTE-RE-UB	FIATLAS MONTE-RE-UB	FIATLAS MONTE-RE-UB
NO. DE FIANZA:	273873	2273878	2309630
FECHA:	04/05/2024	01/05/2024	22/10/2024
	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO): DE OBRAS:		\$907,222.68	CAVA

Ing. Adrián Burgos Montañal
DIRECTOR DE OBRAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024



FECHA DE ELABORACIÓN:
22/11/2024

MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS LAS TORRES,

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS LAS TORRES, REVOLUCIÓN, HIGUERAS, AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO, ALVARO OBREGÓN, AMPLIACIÓN RENACIMIENTO, VERACRUZ Y EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VER.

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 99%

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS LAS TORRES, REVOLUCIÓN, HIGUERAS, AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO, ALVARO OBREGÓN, AMPLIACIÓN RENACIMIENTO, VERACRUZ Y EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VER.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 99%

MONTO AUTORIZADO: \$1,500,000.00 C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,500,000.00 C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
FACTIBILIDAD:
DEPENDENCIA Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
LOS PERMISOS: CMAS
TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
LICITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS
EXISTE X
LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-078-2024 FECHA: 01/06/2024
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RUZACENO DE XALAPA SA DE CV
RFC: CRO10307KA1
MONTO CONTRATADO: \$1,377,472.60 C/IVA
PROGRAMADA: REAL
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 01/06/2024 01/06/2024
TERMINO 28/09/2024
DÍAS 120
APLICA X NO APLICA 122
MONTO: \$413,104.03 PORCENTAJE: 29.99
FECHA DE PAGO: 11/06/2024
ANTICIPO:

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO: \$413,241.78 \$118,747.64
AFIANZADORA: INSTITUCIÓN DE CARRAN INSTITUCIÓN DE CARRAN
NO. DE FIANZA: 24428246 24428246
FECHA: 01/06/2024 01/06/2024
CONVENIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
MODIFICATORIO: PLAZO INICIAL FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$1,377,472.60 C/IVA

Ing. Adalberto Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Arg. Luis Ángel Medellín Marín
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 31

PLANIFICACIÓN Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024306090082

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO

GRADO DE REZAGO SOCIAL:
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
DIRECTA X COMPLEMENTARIA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.558475000 LONGITUD -96.887201700

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

FACTURAS

IMPORTE NETO \$413,241.78

IMPORTE \$413,241.78

IMPORTE \$413,241.78

IMPORTE \$413,241.78

B) REPORTE

EXISTE \$0.00

EXISTE \$0.00

MONTO PAGADO EN EL MES: \$0.00

MONTO PAGADO ACUMULADO: \$0.00

FINQUITO CON IVA: \$0.00

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE \$0.00

AVANCE \$0.00

AVANCE \$0.00

AVANCE \$0.00

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir más flujo en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

1 de 1

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACIÓN:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

[illegible]

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:	LOCALIDAD:	LOCALIDAD:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
			XALAPA-ENRIQUEZ	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MARIA ENRIQUETA CAMARILLO, ENTRE LAZARO CÁRDENAS Y
			No. DE OBRA:	
				20243020900085

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		Antecedentes:	
SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE CLAVE			
ZONA: RURAL N/A			
AGEB: SI NO X			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI NO			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD		LONGITUD	
19.561043300		-96.976253300	

GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	
DIRECTA	COMPLEMENTARIA
X	

RESTRICCION	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
POLIZAS CHEQUE			FACTURAS						
NO. EST.	MONTO CONTINUA	NO.	MONTO	NO.	IMPORTE MONTO CONTINUA ESTIMACION	IMPORTE CONTINUA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
3B	\$156,071.94	SPEI	\$116,720.18	T130	\$156,071.94	\$46,821.58	\$672.72	-\$8,142.54	\$116,720.18
ANTICIPO	\$682,304.11	SPEI	\$682,304.11	9928	\$682,304.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,304.11
1N	\$450,294.13	SPEI	\$363,045.81	20634	\$550,294.13	\$165,088.24	\$2,371.96	\$19,788.12	\$363,045.81
2N	\$501,138.22	SPEI	\$333,051.02	T124	\$501,138.22	\$150,341.47	\$2,160.08	\$15,585.65	\$333,051.02
3N	\$560,159.30	SPEI	\$412,023.01	08464	\$560,159.30	\$168,047.79	\$2,414.48	\$27,325.98	\$412,023.01
2B	\$34,263.54	SPEI	\$26,135.17	C2790	\$31,263.54	\$9,379.06	\$134.76	-\$4,585.45	\$26,135.17
TOTALES	\$1,798,927.13		\$1,251,175.19		\$1,798,027.13	\$530,678.14	\$7,754.00	\$539.80	\$1,933,478.30

B REPORTE		FECHAS	
EXISTE			
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$555,078.36	15/10/2024	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,271,175.19		
FINQUITO CON IVA:	\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCION:			

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir más frías en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

MONTO AUTORIZADO:		\$2,400,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$2,400,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA			CMAS
FACTIBILIDAD:			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA			
LOS PERMISOS:			H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA

TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE
ADJUDICACIÓN DIRECTA	
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
licitación pública	

NO. DE CONTRATO:	CMAS-01-080-2024	FECHA:	01/06/2024
CONTRATISTA:	TAMARINDO CONSTRUCCIONES SA DE CV		
RFC:	TC0130829EEA		
MONTO CONTRATADO:	\$2,274,347.03	C/IVA	
	PROGRAMA	HFAL	
	INICIO	01/06/2024	01/06/2024
	TERMINO	08/09/2024	
	DIAS	100	153
	APLICA	X	NO APLICA
ANTICIPO:	MONTO:	\$682,304.10	PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		05/06/2024

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	5682,304.11	\$196,064.40	
AFIANZADORA:	DAL COMPANIA DE GARANTIA COMPANIA DE GARANTIA		
NO. DE FIANZA:	BRY-0335-0204198	BRY-0235-0204199	
FECHA:	01/06/2024	01/06/2024	
CONVENIO	MONTO	EXISTE	IMPORTE PERIODO:
MODIFICATORIO:	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATOS DE OBRA:		\$2,214,347.03	CIVA

Ing. Adán Burgos Murrill
DIRECTOR DE OBRAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024



MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA ENRIQUEZ	A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2024309050086	DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CAIZADA LUZ DEL BARRIO (ENTRE RESIDENCIAL EL ENCINO Y CALLE CERRADA LUZ DEL BARRIO) Y	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO	Antecedentes:	
Obras Realizadas con FISM-DF:		SI	X	NO	Grado de Rezag Social:	
Zona:		RURAL			MUY ALTO	
Zona:		URBANA			ALTO	
Se encuentra en una ZAP:		SI	X	NO	MUY BAJO	
Se encuentra en el Catálogo		SI	X	NO	BAJO	

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LONGITUD		LATITUD	
19.550382700		-96.953411200			

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:		AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 76.57%	
---	--	-------------------------------------	--

No. EST.	Monto con IVA	Polizas Cheque	Facturas				Importe Neto
			No.	Monto	Antes del IVA	Con IVA	
1N	\$1,745,573.22	SPEI	880	\$1,214,377.23	\$523,671.97	\$7,524.02	\$1,214,377.23
1A	\$1,809,908.27	SPEI	00243	\$1,809,908.27	\$0.00	\$0.00	\$1,809,908.27
	\$183,995.87	SPEI	881	\$123,819.42	\$55,108.76	\$793.09	\$123,819.42

No. de Contrato:	CMAS OP 081-2024	Fecha:	25/06/2024
Contratista:	CONSTRUCCION MARINA Y TERRESTRE SA DE CV		
RFC:	CM1040521JH8		
Monto Contratado:	\$6,033,027.56	Programada	REAL
Periodo de Ejecución:	Inicio 25/06/2024	Término 25/06/2024	25/06/2024
	Días 180		129
Anticipo:	Aplica X	No aplica	
	Monto: \$1,809,908.26	Porcentaje: 30.00	
	Fecha de Pago:	28/06/2024	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
Monto Afianzado:	\$1,809,908.27	\$85,967.47	
Afianzadora:	1000 FIANZAS MONITRIUM FIANZAS MONITRIUM		
No. de Fianza:	2284573	2287574	
Fecha:	25/06/2024	25/06/2024	
Convenio Modificatorio:	Monto Existe	Importe/Periodo	Fecha
	Plazo	Inicial	Final
	No aplica X		
Monto Total Contratado (Convenio + Contrato) de Obra:	\$6,033,027.56		

OBSERVACIONES:		Ing. Adán Burgos Montiel	
		Supervisor de Obras	

*En caso de requerir más folios en el apartado de estado financiero utilizar esta hoja.

FORMATO 11



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACIÓN:	04/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: XALAPA - ENRIQUEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

No. DE OBRA: 2024-309090088

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PERLA, CONSTRUCCIÓN DE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PERLA, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALIF JOSE VASCONCELOS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN XALAPA VERACRUZ.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/11/2024

MES QUE SE REPORTA: OCTUBRE

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

OBRA REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL URBANA

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI NO

CLAVE AGEB: N/A

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA

RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD 96.947990300

LATITUD 19.565783600

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS QUE QUE	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA, DEDUCCIÓN	No.	MONTO	5 MILLAR	CARGOS AUTORIZADOS	IMPORTE NETO
2A	\$183,135.90	SPEI	\$183,135.90	37	\$127,405.75	\$789.38	\$0.00	\$127,405.75
2N	\$567,023.87	SPEI	\$567,023.87	36	\$394,557.89	\$2,444.07	\$85.25	\$394,557.89
ANTICIPO	\$1,220,339.48	SPEI	\$1,220,339.48	13	\$1,220,339.48	\$0.00	\$0.00	\$1,220,339.48
1N	\$559,629.87	SPEI	\$559,629.87	30	\$389,243.46	\$2,412.20	\$85.25	\$389,243.46
TOTALES	\$1,309,789.64		\$1,309,789.64		\$911,207.10	\$5,645.65	\$0.00	\$2,131,546.58

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

30/10/2024

MONTO PAGADO EN EL MES: \$521,963.64

MONTO PAGADO ACUMULADO: \$911,207.10

FINIQUITO CON IVA: \$0.00

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO	ATRASO (%)
ENE	0	0	0	0
FEB	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0
MAY	0	0	0	0
JUN	0	0	0	0
JUL	0	0	0	0
AGO	0	0	0	0
SEP	0	0	0	0
OCT	0	0	0	0
NOV	0	0	0	0
DIC	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

MONTO AUTORIZADO: \$4,150,000.00

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$4,150,000.00

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE

DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: CMAS

PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE

DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

ADJUDICACIÓN A MENOS 3 PERSONAS

EXISTE X

NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-101-2024

FECHA: 19/07/2024

CONTRATISTA: CINDY VAMILETH LOZANO RAFAEL

RFC: LORC970117NMB

MONTO CONTRATADO: \$4,067,798.25

PROGRAMADA

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 20/07/2024

TERMINO 20/07/2024

DÍAS 16/12/2024

APLICA X NO APLICA

MONTO: \$1,220,339.47

PORCENTAJE: 30.00

FECHA DE PAGO: 26/07/2024

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO

MONTO AFIANZADO: \$1,220,339.48

AFIANZADORA: ASESORIA INSURGENTES S.S. DE CV. ALICIA INSURGENTES S.S. DE CV.

FECHA: 10020-01147-2

19/07/2024

10020-01146-5

19/07/2024

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE

PLAZA INICIAL

FINAL

CONVENIO MODIFICATORIO: NO APLICA X

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO CONTRATO) DE OBRA: \$4,067,798.25

CMVA

Ing. Marian Burgos Montiel

DIRECTOR DE OBRAS

Arg. Blanca Aurora Ancoy Rojas

SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

1 de 1



EJERCICIO 2024

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
XALAPA-ENRIQUEZ 2024309090089

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO CIJIRA (ENTRE AJAMO Y JOSÉ MARÍA MORÓS) Y

— 100 —

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

ALTA	MEDIO	Bajo	MUY BAJA	X
TÍPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROVECTOR.				

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	
X	COMPLEMENTARIA
	RESTRINGIDA

Journal of Management Education 35(1) 3-12
© The Author(s) 2011
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/0095647210392811
<http://jme.sagepub.com>

OBRA® FACTURAS

CONTRIBUENDO COP 100	5 MILLAR ADHESIVOS	CARTELAS ADHESIVAS	IMPORTE NETO
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

2014	2013	2012	2011	2010
\$21,413.60	\$307.67	\$0.00	\$49,657.40	\$0.00
\$176,704.67	\$1,064.30	\$4,553.00	\$321,559.20	\$0.00

5371,558.36	\$4,551.99	\$1,964.10	5371,558.36
\$723,250.15	\$0.00	\$0.00	\$723,250.15

\$1,467.43	\$4,551.99	\$232,290.94
\$3,343.34	\$0.00	\$539,615.53
\$232,696.66		

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523</
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

[illegible][illegible]

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

5492,944.90	\$7,082.54	\$0.00	\$3,806,372.38
-------------	------------	--------	----------------

AVANCE FISICO REAL

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
1980	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1981	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1982	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1983	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1984	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1985	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1986	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1987	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1988	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1989	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1990	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1991	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1992	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1993	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1994	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1995	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1996	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1997	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1998	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1999	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2000	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2001	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2002	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2003	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2004	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2005	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2006	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2007	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2008	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2009	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2010	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2011	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2012	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2013	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2014	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2015	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2016	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2017	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2018	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2019	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2020	76	76	76	7								

[illegible][illegible][illegible]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		REHABILITACION
LOCALIDAD:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CALLES
XALAPA-ENRIQUEZ		
OBRA:	2024309090090	

ANTECEDENTES:					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUY ALTO	A.L.T.O.	MEDIO	B.AJO	MUY B.AJO	X
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RENTINGIDA		

[illegible]

AVANCE FISICO REAL												MONTO	
AVANCE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0.66	12.90	26.54	31.31	34	0	0
REAL		0	0	0	0	0	2	22	35	45	41	0	0
ACUMULADO		0	0	0	0	0	2	16	46	94	135	0	0
ATRASO (%)		0	0	0	0	0	0	1.50	0	0	25	0	0

MONTO
CONTRA

[illegible]

TIPO DE MONTO	AFIANZADA	NO. DE FECHA:	CONVENIO	MODIFICADO	MONTO CONTRA							
\$1,032,900.21	\$309,840.08	\$9,451.73	\$0.00	\$1,583,545.33								
2024												
AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0.66	17.39	26.72	10.51	24	0	0
REAL	0	0	0	0	0	2	22	35	45	1	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	2	16	49	94	95	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	5.39	0	0	23	0



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	04/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA, PARRIQUETZ	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	
No. DE OBRAS: 202439090091	
A) PLANACION Y DATOS GENERALES	
DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ACUEDUCTO E HISTORIAS PREHISPANICAS, DE LA COLONIA	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:	
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE
ZONA: RURAL	URBANA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI
COORDENADAS DE GEOREFERENCIA	
LATITUD	19.55877700
LONGITUD	-96.940131400

ANTECEDENTES:	
GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
MUY ALTO	ALTO
MEDIO	BAJO
MUY BAJO	X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	
DIRECTA	X
COMPLEMENTARIA	
DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO CEIBA, (ENTRE ALAMO Y JOSE MARIA MORELOS), Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA CALLE PINOS (ENTRE JESUS CARRANZA Y JOSE MA. MORELOS) Y EN CIRCUITO CEIBA (ENTRE JOSE MA. MORELOS Y FINAL DEL CIRCUITO DE LA COLONIA LINEA ORL EN XALAPA, VERACRUZ)	
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 98%	

MONTOS AUTORIZADOS:	
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,361,000.00
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
TIPO DE LICITACION:	
ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE X
INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	
LICITACION PUBLICA	

NO. DE CONTRATO:	
CONTRATISTA:	LORENZO GONZALEZ SANCHEZ
RFC:	GOSL5708103WA
MONTOS CONTRATADOS:	
INICIO	\$1,122,600.96
TERMINO	PROGRAMADA
FECHA DE EJECUCION:	27/06/2024
DIAS	100
APLICA	X
NO APLICA	127
ANTICIPO:	
MONTO:	\$336,780.28
FECHA DE PAGO:	04/07/2024
TIPO DE FIANZA:	
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO
MONTOS AFIANZADOS:	\$336,780.28
AFIANZADOR:	INSTITUCION DE GARANTIA INSTITUCION DE GARANTIA
No. DE FIANZA:	2934309
FECHA:	27/06/2024
CONVENIO MODIFICATORIO:	
MONTO	EXISTE
PLAZO	228989.40
FECHA	27/10/2024
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	
MONTOS TOTAL	\$1,351,380.36
CONTRATO	C/IVA

B) REPORTE	
EXISTE	
FECHAS	
MONTOS PAGADOS EN EL MES:	
MONTOS PAGADOS ACUMULADOS:	
FINIQUITO CON IVA:	
ACTA ENTREGA RECEPCION:	
OBSERVACIONES:	

MONTOS PAGADOS EN EL MES:	
MONTOS PAGADOS ACUMULADOS:	
FINIQUITO CON IVA:	
ACTA ENTREGA RECEPCION:	
OBSERVACIONES:	

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
04/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUETZ	DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO SECO, ENTRE RIO JORDAN Y CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO; Y REHABILITACION DE RED DE AGUA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 202430090002	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DE:	CLAVE	SI	X	NO
ZONA:	BURIAL			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA			
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO		SI	X	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	19.56430900	LONGITUD	-96.905235100	

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO SECO, ENTRE RIO JORDAN Y CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO; Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SECO, ENTRE RIO CONSOLATA Y CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

ESTA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 99%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS							IMPORTE NETO
	MONTO CON IVA	No.	MONTO	No.	IMPORTE CON IVA MONTO CON IVA SUTRACION	AMONTUADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ACCIONALES		
2N	\$773,302.41	SPEI	\$531,312.09	A175	\$773,302.41	\$231,980.72	\$3,333.20	\$6,666.40	\$531,312.09	
ANTICIPO	\$434,148.23	SPEI	\$434,148.23	A162	\$434,148.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,148.23	
TOTALES	\$773,302.41		\$531,312.09		\$773,302.41	\$231,980.72	\$3,333.20	\$6,666.40	\$965,460.32	

B) REPORTE

Monto pagado en el mes:	Monto pagado acumulado:	Finiquito con IVA:	Acta entrega recepcion:	FECHAS											
				EXISTE	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
\$531,312.09	\$531,312.09	\$0.00													

OBSERVACIONES:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MONTO AUTORIZADO:	\$1,813,000.00	C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,500,000.00	C/IVA	
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS		
PACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA PACTIBILIDAD:	CMAS		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.		
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE	
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	X	
	licitacion publica		

NO. DE CONTRATO:	CMAS-09-089-2024	FECHA:	01/07/2024
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GARPE SA DE CV		
RFC:	CCA190206NR1		
MONTO CONTRATADO:	\$1,447,160.76	PROGRAMADA	REAL
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO 01/07/2024	TERMINO 01/07/2024	
	DIAS 08/10/2024		
ANTICIPO:	APLICA X	NO APLICA	123
	MONTO: \$434,148.23	PORCENTAJE:	30.00
	FECHA DE PAGO:	19/07/2024	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$434,148.23	\$124,755.24	
AFIANZADORA:	ERREY ASESURADORA DE SEGUROS Y RESEGUROS		
FECHA:	22/8/23	22/8/2024	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,447,160.76		

Ing. Adrian Burgos-Montiel
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Salvador Al. Montemayor-Medel
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas, fíase el aporamiento de estado financiero utilizar: 05011098

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUÉZ	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LINDEROS, ENTRE CALLES 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE Y REHABILITACIÓN DE RED DE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024309090093	

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	CLAVE AGE:	SI	NO	X
RURAL				
URBANA				
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO				
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		19.553400000		
LATITUD	LONGITUD	96.884686700		

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.		MUNDO CON IVA		PULIZAS CHEQUE		FACTURAS					
				No.	MONTO	No.	IMPORTE CON IVA ESTIMACION	APORTILLADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
2A		\$185,814.04		SPEI	\$129,768.91	292	\$185,814.04	\$55,764.21	\$800.92	\$0.00	\$129,268.91
2N		\$466,705.76		SPEI	\$324,682.37	291	\$466,705.76	\$140,011.73	\$2,011.66	\$0.00	\$324,682.37
ANTICIPO		\$458,999.06		SPEI	\$458,999.06	287	\$458,999.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,999.06
1N		\$362,963.22		SPEI	\$252,509.75	289	\$362,963.22	\$108,888.97	\$1,564.50	\$0.00	\$252,509.75
1A		\$65,565.08		SPEI	\$45,612.95	290	\$65,565.08	\$19,669.52	\$787.61	\$0.00	\$45,612.95
TOTALES		\$1,081,048.10			\$752,073.98		\$1,081,048.10	\$324,314.43	\$4,650.69	\$0.00	\$1,217,073.04

REPORT

FECHAS	EXISTE	FECHAS
07/10/2024	\$453,951.28	
	\$752,073.98	
	\$0.00	

RESERVATIONS:

OBSERVACIONES:

*También de realizar actividades en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-090-2024	FECHA:	01/07/2024
CONTRATISTA:	GRUPO CONS INSTRUCTOR QUALITY SA DE CV		
RFC:	GCO03013:BVO		
MONTO CONTRATADO:	\$1,529,996.87	C/IVA	
	PROGRAMADA	REAL	
	01/07/2024	01/07/2024	
	08/10/2024	08/10/2024	
	DIAS	100	100
	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	5458,846.06	PORCENTAJE:
ANTICIPO:	FFCHA DE PAGO:	10/07/2024	20.99

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$458,999.06	\$13,896.28	\$152,999.69
AFIANZADORA:	INSTITUCION DE GARAN, INSTITUCION DE GARANTIA		
No. DE FIANZA:	7936337	2936340	2974294
FECHA:	01/07/2024	01/07/2024	11/10/2024
	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO	MONTO	INICIAL	FINAL
MODIFICATORIO:	PLAZO		
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO/CONVENIO + CONTRATO DE OBRA:		\$1,529,996.87	C/VA

Ing. Adán Burgos Montiel
DIRECCIÓN DE OBRAS

Arq. Luis Ángel Avelino Marín
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	04/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES									
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA ENRIQUETZ		DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR AZALEA ENTRE CALLES LOMAS DE XALAPA Y LOMAS DE LA VILLA, COL. LOMAS VERDES, EN XALAPA, VERACRUZ.					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2024309090095							

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:									
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR AZALEA ENTRE CALLES LOMAS DE XALAPA Y LOMAS DE LA VILLA, COL. LOMAS VERDES, EN XALAPA, VERACRUZ.									

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:									
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 96%									

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:									
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 96%									

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:									
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 96%									

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:									
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 96%									

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:									
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 96%									

Ing. Adán Burgos Montiel
Ing. Oscar Rojas-Oroz
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir más flujos en el reportado de estado financieros utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUETZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024309090027
DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y VICENTE GUERRERO, COL. NACIONAL.	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-OF:	CLAVE: N/A
ZONA: RURAL	AGEB: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD	LONGITUD
19.560851700	-96.901611700

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*	
FACTURAS	
No. EST.	No.
ANTICIPO	14009

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE	No.	MONTO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$574,888.22	SPEI	\$574,888.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,888.22
TOTALES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,888.22

B) REPORTE	
FECHAS	
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00
FINQUITO CON IVA:	\$0.00
ACTA ENTREGA RECEPCION:	

AVANCE FISICO REAL	
AVANCE	0
REAL	0
ACUMULADO	0
ATRASO (%)	0

OBSERVACIONES:	

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y VICENTE GUERRERO, COL. NACIONAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y VICENTE GUERRERO, COL. NACIONAL - EN XALAPA, VERACRUZ	
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 95%	

MONTO AUTORIZADO:	\$1,960,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,960,000.00	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS	NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS	NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA	NO APLICA
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACION PUBLICA	

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-100-2024	FECHA:	15/07/2024
CONTRATISTA:	INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACION SA DE CV		
RFC:	INC060126CK8		
MONTO CONTRATADO:	\$1,916,294.06	PROGRAMADA	RFPI
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO 16/07/2024	TERMINO 16/07/2024	
	DIAS 120		77
ANTICIPO:	APLICA X	NO APLICA	
	MONTO: \$574,888.22	PORCENTAJE:	30.00
	FECHA DE PAGO:		25/07/2024

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$574,888.22	\$165,197.46	
AFIANZADOR:	U.G. OBRA ASERTA, S.A. DE CV		
No. DE FIANZA:	4125-01250-0	4175-1751-1	
FECHA:	15/07/2024	15/08/2024	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO CONTRATO) DE OBRA:	\$1,916,294.06		

Ing. Adán Burgos Manrí	
DIRECTOR DE OBRAS	
Arq. Luis Ángel Avelino Marín	
SUPERVISOR DE OBRAS	
FORMATO 11	

*En caso de requerir más filas en el apartado de estados financieros utilizar otra hoja.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
22/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUETZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090099 DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALBERTO UREÑA, ENTRE CALLES (MACADAMIA Y PRIVADA ABEDUL) DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A
ZONA: RURAL URBANA SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD -96.899160000 LATITUD 19.537896700

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALBERTO UREÑA, ENTRE CALLES (MACADAMIA Y PRIVADA ABEDUL) DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA EL CASTILLO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE FERNANDO ZIMCERADO ENTRE CALLE (TRANSVERSAL 2 Y HERIBERTO JARA CORONAL CALLE TRANSVERSAL 3 ENTRE CALLES ACOMULTEMEYES DE 38C2 Y

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 95%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA *									
No. EST.	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO	
	No.	MONTO	No.	MONTO CON IVA ESTIMACION	AVANCE CON IVA	5 MILLAR	LABORES NOCTURNOS		
ANTICIPO	SPEI	\$680,676.31	P91E6	\$680,676.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,676.31

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:	LOCALIDAD:
XALAPA-ENRIQUÉZ		
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MONTE URALES, ENTRE CALLE PROMOCIÓN JAMAICA Y AV. MONTE EVEREST, COL.		
PROYECTO DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:
		2024309090100

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		Antecedentes:	
Obras Realizadas con FISM-DF:		SI	X
Tipo de Zona:		Clave	
RURAL		N/A	
URBANA		N/A	
Se encuentra en una Zap:		SI	X
Se encuentra en el Catálogo		SI	X
Grado de Rezago Social:		Muy Alto	
Alto		Medio	
Bajo		Muy Bajo	
Tipo de Contribución del Proyecto:		Directa	
Complementaria		Restringida	
Coordenadas de Georreferencia		Latitud	
19.54768°000		Longitud	
-96.889288300			

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA *									
No. EST.	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS						
	MONTO CON IVA	No.	MONTO	NO.	IMPORTE MONTO CON IVA ESTIMACION	APORTE CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$270,173.13	5PEI	\$270,173.13	55914	\$270,173.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,173.13
TOTAL FS	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,173.13

[illegible]

OBSERVACIONES:

MONTOS AUTORIZADOS:		\$981,000.00	C/IVA
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:		\$950,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS		NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA	CMAS		NO APLICA
FACTIBILIDAD:			CMAS
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA			NO APLICA
LOS PERMISOS:			H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X
	licitación pública		

NO. DE CONTRATO:	CIAS-OP-087-2024		FECHA:	27/06/2024
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES TL CINCO S DE SA DE CV			
RFC:	CIC140313QJ9			
MONTO CONTRATADO:	\$900,577.11	CIVA		
	PROGRAMADA	REAL		
	INICIO	27/06/2024		27/06/2024
	TERMINO	04/10/2024		
	DIAS	100	95	
	APLICA	X	NO APLICA	
ANTICIPO:	MONTO:	\$270,083.07	PORCENTAJE:	29.99
	FECHA DE PAGO:			09/07/2024

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$770,173.12	\$77,635.96	
AFIANZADORA:	INSTITUCION DE GARAN: INSTITUCION DE GARAN		
NO. DE FIANZA:	2935597	2935598	
FECHA:	27/06/2024	27/06/2024	
CONVENIO	MONTO	EXISTE	FECHA
MODIFICATORIO:	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO/APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATOS DE OBRA:		\$900,577.11	
		C/NA	

Ing. Adán Burgos Monzó
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Luis Ángel Avelino Marín
SUPERVISOR DE OBRA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
22/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309080102

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
DESCRIPCION DE LA OBRA:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
CLAVE AGEB: N/A
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: RURAL URBANA
ZONA: SI NO X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LONGITUD -96.904326700
LATITUD 19.553226300

ANTECEDENTES:
GRADO DE REZAGO SOCIAL: BUEN ALTO MEDIO BAJO X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA
RESTRINGIDA.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
POLIZAS CHEQUE					FACTURAS				
No. EST.	MONTO CON IVA	No.	MONTO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	CARGOS AUXILIARES	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$286,720.87	SPEI	\$286,720.87	01A4C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,720.87	\$286,720.87

D) REPORTE									
EXISTE					FECHAS				
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00								
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00								
FINQUITO CON IVA:	\$0.00								
ACTA ENTREGA RECEPCION:									

E) AVANCE FISICO REAL											
AVANCE FISICO REAL											
AVANCE	PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO	ATRASO (%)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

Ing. Adolfo Burgos Martín
DIRECTOR DE OBRAS

Atq. Luis Ángel Avelino Manríquez
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



EJERCICIO 2024

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024-309090103	DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MOA ENTRE LAS CALLES FLAMINGOS Y FINAL DE CALLE MOA EN LA COLONIA ZIPOR EN XALAPA, VERACRUZ.	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		ANTECEDENTES:	
TIPO DE OBRA: RURAL	CLAVE AGE: N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL: NUY ALTO ALTO MEDIO BUENO	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI	SI	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA	
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI	SI	RESTRINGIDA	

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	LONGITUD	-96.884055000
LATITUD	19.50493300	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
FACTURAS									
No. EST.	Monto con IVA	POLIZAS CHEQUE	No.	Monto	Importe con IVA	Importe con IVA	Cargos adicionales	Importe neto	
2N	\$201,016.26	SPEI	202	\$138,328.64	\$201,016.26	\$60,304.88	\$1,516.79	\$138,328.64	
AMTICPO	\$304,128.37	SPEI	14769	\$304,128.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,128.37	
1N	\$460,275.52	SPEI	200	\$460,275.52	\$138,082.66	\$1,983.95	\$9,471.91	\$316,737.00	
1A	\$87,781.07	1A	201	\$87,781.07	\$26,334.32	\$178.37	\$667.14	\$60,406.24	
TOTALES	\$749,072.85			\$515,471.88	\$216,721.86	\$3,228.77	\$5,650.74	\$819,600.25	

NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-102-2024	FECHA: 22/07/2024
CONTRATISTA: FAUSTO CESAR GARCIA MARTINEZ	
RFC: GAMF880225F9	
Monto contratado: \$1,024,804.39	REAL
Periodo de ejecución: INICIO 22/07/2024	22/07/2024
TERMINO 29/10/2024	
APLICA: 100	102
MONTO: \$304,059.46	NO APLICA
FECHA DE PAGO: 26/03/2024	PORCENTAJE: 29.67

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
Monto afianzado: \$307,441.32	\$88,345.21	
Afianzadora: ADORA INSURGENTES, S. de RL		
No. de fianza: 1254-09013-5		
Fecha: 22/07/2024		
CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE	IMPORTE PERIODO	FECHA
PLAZO INICIAL	FINAL	
NO APLICA		
Monto total contratado (convenio + contrato) de obra: \$1,024,804.39		C/N/A

Ing. Oscar Jairo Rojas Ortiz
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. Adán Burepos Montiel
DIRECTOR DE OBRAS

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

FORMATO 11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024



MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUILIZ	A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2024309090105	DESCRIPCION DE LA OBRA:	
REFABRICACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS, ENTRE CALLE DURAZNOS Y AV. TREBOL, COLONIA LOS PRADOS Y				

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		Antecedentes:				
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE AGEB:	GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
RURAL	SI	MUY ALTO	ALTO	BASTO	MUY BASTO	X
URBANA	SI	N/A				
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:		RESTRICTIDA		
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO		DIRECTA		X		COMPLEMENTARIA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		96.908343300	
LATITUD	19.557415000		

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
POLIZAS CHEQUE		FACTURAS							
No. EST.	MONTO CON IVA	No.	MONTO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO
2N	\$438,212.27	SPFI	\$294,211.36	\$1,845.74	\$3,691.49	\$294,211.36	\$3,691.49	\$294,211.36	\$3,691.49
2N	\$463,154.60	SPFI	\$318,219.15	\$1,996.36	\$3,992.71	\$318,219.15	\$3,992.71	\$318,219.15	\$3,992.71
ANTICIPO	\$366,560.19	SPFI	\$366,560.19	\$0.00	\$0.00	\$366,560.19	\$0.00	\$366,560.19	\$0.00
TOTALES	\$891,366.87		\$612,430.51	\$891,366.87	\$267,410.06	\$3,842.10	\$7,684.20	\$978,990.70	\$7,684.20

B) REPORTE		FECHAS	
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$294,211.36	EXISTE	07/10/2024
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$612,430.51		
FINQUITO CON IVA:	\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCION:			
OBSERVACIONES:			

AVANCE FISICO REAL	
AVANCE	PROGRAMA
REAL	ACUMULADO
AL RASO (%)	
OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:	
Ing. Adolfo Burpo-Monfil	
SUPERVISOR DE OBRAS	
Arq. Luis Angel Avelino Martin	
FORMATO 11	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024



FECHA DE ELABORACION:
02/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024-50000106

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CHOPERES, COL. ARBOLEDAS DEL TRONCONAL EN LA CALLE ARRANCANES ENTRE CALLE MACADAMIA Y CALLE LAGUNILLA, SANITARIO EN LA CALLE ARRANCANES ENTRE CALLE MACADAMIA Y CALLE LAGUNILLA, COL. ARBOLEDAS DEL TRONCONAL EN XALAPA, VERACRUZ

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A AGEB: SI X NO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 19.566496700 LONGITUD -96.899273300

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CHOPERES, COL. ARBOLEDAS DEL TRONCONAL EN LA CALLE ARRANCANES ENTRE CALLE MACADAMIA Y CALLE LAGUNILLA, SANITARIO EN LA CALLE ARRANCANES ENTRE CALLE MACADAMIA Y CALLE LAGUNILLA, COL. ARBOLEDAS DEL TRONCONAL EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTOS CON IVA	POLIZAS CHEQUE		MONTOS	No.	BUDGET CASH MONTO CONTIN. ESTIMADO	AMORTIZACION CONTINUA	CARGOS MULTIMEDIALES	IMPORTE NETO
		No.	MONTOS						
2N	\$343,564.25	SPEI	\$239,034.09	\$450A	6450A	\$343,564.25	\$103,069.28	\$0.00	\$239,034.09
ANTICIPO	\$396,070.83	SPEI	\$396,070.83	7F379		\$396,070.83	\$0.00	\$0.00	\$396,070.83
LN	\$448,098.70	SPEI	\$311,737.63	EE13B		\$448,098.70	\$134,429.61	\$0.00	\$311,737.63
TOTALES	\$791,662.95		\$550,751.72			\$791,662.95	\$237,498.89	\$0.00	\$594,822.55

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

09/10/2024

MONTOS PAGADOS EN EL MES:

\$739,014.09

MONTOS PAGADOS ACUMULADO:

\$550,751.72

FINQUITO CON IVA:

\$0.00

ACTA ENTREGA RECEPCION:

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	24,651	37,086	35,411	23,421	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	30	32	36	21	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	30	62	78	99	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	11	10	10	2	0	0

NO. DE CONTRATO:

CMAS OP 094 2024

FECHA:

10/07/2024

CONTRATISTA:

IGH CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

RFC:

GCC21107FE5

MONTOS CONTRATADOS:

\$1,320,236.09

PROGRAMADA

REAL

PERIODO DE EJECUCION:

INICIO

11/07/2024

TERMINO

18/10/2024

DIAS

100

APLICA

X

NO APLICA

113

ANTICIPO:

MONTOS

\$395,938.80

PORCENTAJE:

29.99

FECHA DE PAGO:

16/07/2024

TIPO DE FIANZA:

ANTICIPO

CUMPLIMIENTO

VICIOS OCULTOS

MONTOS AFIANZADOS:

\$396,070.83

\$113,813.46

AFIANZADORA:

URADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA, S.A. D

No. DE FIANZA:

3763-01019 0

3763-01020 0

FECHA:

10/07/2024

10/07/2024

CONVENIO MODIFICATORIO:

MONTOS

EXISTE

IMPORTE/PERIODO

FECHA

PLAZO

INICIAL

FINAL

MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO CONTRATO) DE OBRA:

\$1,320,236.09

C/IVA

OBSERVACIONES:

Ing. Adán Burgos Montiel
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Luis Ángel Arreola Marín
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir más líneas al espacio de estado financiero utilizar el "x" hoja.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FIJEROCYO 2024

FECHA DE ELABORACION:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		DESCRIPCION DE LA OBRA:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CUSTAVO DIAZ VARDIAZ ENTRE LAS CALLES LUIS DONALDO COLONSO Y CALLE VICENTE
MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	
INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	2024300900109

ANTECEDENTES:		SI		NO		X	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:							
TIPO DE	CLAVE	GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
ZONA:	AGER:	MUY ALTO					
		MEDIO					
		BAJO					
		MUY BAJO					
		X					

SE ENCUENTRA EN OBRAS		SI	X	NO		DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA		RESTRICTADA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LATITUD 19.56.1008.360 LONGITUD -96.900290000											
C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*											

No. EST.	MONTOS CON IVA	No.	MONTOS	IMPORTE OTRA MONEDA	IMPORTE MONEDA LOCAL	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$331,843.56	SIPI	\$331,843.56	\$331,843.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,843.56

NO. DE CONTRATO:	CMIAS-OP-096-2024	FECHA:	10/07/2024
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA XAMIO SA DE CV		
RFC:	CXA1409241U3		
Monto CONTRATADO:	\$1,06,145.20	REAL	C/IVA
	PROGRAMADA		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	10/07/2024	10/07/2024
	TERMINO	17/10/2024	
	DIAS	100	83
	APLICA	X	NO APLICA
ANTICIPO:	Monto:	\$331,843.56	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	24/07/2024	

TOTAL F5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,843.36	
BIREPORTE											
		EXISTE	FECHAS								
MONTO PAGADO EN EL MES:		\$0.00									
MONTO PAGADO ACUMULADO:		\$0.00									
FINQUITO CON IVA:		\$0.00									
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:											
OBSERVACIONES:											

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMATICO	0	0	0	0	0	0	17.37	29.19	43.56	8.10	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	25	27	67	3	0	13
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	25	52	94	99	0	0
ATRASSO (%)	0	0	0	0	0	0	2.19	3.51	1.07	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$331,843.36	\$95,357.35	
AFIANZADORA:	INSTITUCION DE GARAN INSTITUCION DE GARAN		
No. DE FIANZA:	2939785	2939790	
FECHA:	10/07/2024	10/07/2024	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE PERIODO	
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,106,145.20	C/JVA

Ing. Luis Ángel Avelino Marín
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FECHA DE ELABORACION:
04/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

EJERCICIO 2024



MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUETZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 20243050090110

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DOROTEO ARANGO ENTRE LA AVENIDA ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y LA CALLE FEDERALISMO Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA 1 (ENTRE LA CALLE DOROTEO ARANGO Y FINAL DE LA PRIVADA 1) Y EN LA PRIVADA 2 (ENTRE LA CALLE DOROTEO ARANGO Y FINAL DE LA PRIVADA 3) EN LA COLOMBIA

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A

ZONA: RURAL URBANA

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.539943300 LONGITUD -96.897095000

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL:
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
DIRECTA X COMPLEMENTARIA

FACTURAS

No. EST.	MONTOS CON IVA	POLIZAS CHEQUE	MONTOS	No.	IMPORTE NETO
2N	\$445,840.30	SPEI \$310,166.48	22	\$133,752.09	\$310,166.48
1A	\$80,943.86	SPEI \$63,268.70	20	\$397.00	\$63,268.70
1N	\$621,845.60	SPEI \$432,611.55	19	\$2,680.37	\$432,611.55
ANTICIPO	\$352,295.63	SPEI \$352,295.63	C2379	\$0.00	\$352,295.63

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTOS CON IVA	IMPORTE NETO	CARGOS ADICIONALES	5 MILLAR	IMPORTE NETO
2N	\$445,840.30	\$310,166.48	\$0.00	\$1,921.73	\$310,166.48
1A	\$80,943.86	\$63,268.70	\$0.00	\$397.00	\$63,268.70
1N	\$621,845.60	\$432,611.55	\$0.00	\$2,680.37	\$432,611.55
ANTICIPO	\$352,295.63	\$352,295.63	\$0.00	\$0.00	\$352,295.63

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DOROTEO ARANGO ENTRE LA AVENIDA ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y LA CALLE FEDERALISMO Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA 1 (ENTRE LA CALLE DOROTEO ARANGO Y FINAL DE LA PRIVADA 1) Y EN LA PRIVADA 2 (ENTRE LA CALLE DOROTEO ARANGO Y FINAL DE LA PRIVADA 3) EN LA COLOMBIA

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

MONTO AUTORIZADO: \$1,281,000.00 C/IVA

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,200,000.00 C/IVA

VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA: CMAS

FACTIBILIDAD: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA: H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA

LOS PERMISOS: EXISTE X

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA

INVITACION A MENOS 3 PERSONAS

EXISTE X

NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-098-2024 FECHA: 10/07/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DELCON, SA DE CV

RFC: CM0230200X1

MONTO CONTRATADO: \$1,174,318.76 C/IVA

PERIODO DE EJECUCION: INICIO 10/07/2024 REAL 10/07/2024

TERMINO 17/10/2024 17/10/2024

APLICA X NO APLICA

MONTO: \$352,295.63 PORCENTAJE: 30.00

FECHA DE PAGO: 26/07/2024

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO: \$352,295.63 \$101,234.38 \$128,050.10

AFIANZADORA: MEXICO COMPANIA AFIANZADORA DE SEGUROS Y REASEGUROS

No. DE FIANZA: 096173-00000 096176-00000 103310-00000

FECHA: 10/07/2024 10/07/2024 28/10/2024

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE PERIODO

PLAZO INICIAL FINAL

NO APLICA X

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO CONTRATO) DE OBRA: \$1,174,318.76 C/IVA

Ing. Adán Burgos Mendiola
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Ruben Omar Morales Bandala
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

* El caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			DESCRIPCION DE LA OBRA:	REHABILITACION DE SURCOLECTOR SANITARIO POR METODO DE PERFORACION DIRECCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CADENAM EN Q 0+000 EN LA CALLE
MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XATAPA ENRIQUETZ	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	2024-3029/09/0111	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		Antecedentes:	
Obras Realizadas con Fism-Df:	SI	X	NO
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO
CLAVE AGE: N/A	SI	X	NO
GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO	MUY ALTO	ALTO	MEDIO
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: COMPLEMENTARIA RESTRICTIVA	DIRECTA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA 19.15.68924520 LONGITUD		-96.897561000	
LATITUD			

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE CHEQUE MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	APORTILLADO CON IVA	FACTURAS		IMPORTE NETO
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
ANTICIPO	\$758,574.21	SPEI	\$758,574.21	89968	\$758,574.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,574.21
1N	\$1,797,330.24	SPEI	\$1,750,384.06	1163	\$1,797,330.24	\$539,199.07	\$7,747.11	\$0.00	\$1,250,384.06
TOTALES	\$1,797,330.24		\$1,250,384.06		\$1,797,330.24	\$539,199.07	\$7,747.11	\$0.00	\$2,008,956.27

[illegible]

TIPO DE AFIANZA:	AVANZADO	COMPLEMENTO	VIGENCIA
MONTO AFIANZADO:	\$758.5 M.21	\$217.981.10	
AFIANZADORA:	INSTITUCION DE GARAN INSTITUCION DE GARAN		
No. DE AFIANZA:	29416R3	19416R1	
FECHA:	15/06/2024	15/07/2024	
CONVENIO	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
MODIFICATORIO:	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO	CONVENIO +		
CONTRATO DE OBRA:			\$2,528,580.71
			C/N/A

Ing. Adrián Burgos Montiel
DIRECTOR DE OPERACIONES

Ing. Civil Juan Ortiz Leguñe
SUPERVISOR DE OBRAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
06/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE



MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA ENRIQUETZ	
DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LAS PARCELAS Y CALLE 22 DE FEBRERO, DE LA COLONIA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024309090113

Cuenta con Proyecto Ejecutivo: SI X NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A	
TIPO DE ZONA: RURAL	GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: MUY BAJO X
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO	COMPLEMENTARIA X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD -96.904498300	
LATITUD 19.369433300	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. ESE	Monto con IVA	Pólizas Cheque		Facturas		Importe Neto		Cargas Anticipadas	
		No.	Monto	No.	Importe con IVA	5 Millar	5 Millar	Anticipadas	Neto
2N	5353,533.43	SPEI	\$245,949.55	112	\$106,060.03	\$1,523.85	\$245,949.55	\$0.00	\$245,949.55
ANTICIPO	\$279,860.99	SPEI	\$279,860.99	19AAL6C	\$0.00	\$0.00	\$279,860.99	\$0.00	\$279,860.99
1N	\$285,211.65	SPEI	\$198,418.79	109	\$85,563.50	\$1,229.36	\$198,418.79	\$0.00	\$198,418.79
1A	\$15,977.14	SPEI	\$11,115.13	108	\$4,793.14	\$68.87	\$11,115.13	\$0.00	\$11,115.13
2A	\$64,437.07	SPEI	\$48,828.20	113	\$19,331.22	\$277.75	\$48,828.20	\$0.00	\$48,828.20
TOTALES	\$719,159.29		\$500,311.67		\$215,747.79	\$3,039.83	\$500,311.67	\$0.00	\$780,172.66

NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-105-2024	FECHA: 26/07/2024
CONTRATISTA: MANUEL ALBERTO GRANILLO QUIROZ	
RFC: GNMDB0504R90	
Monto Contratado: \$932,869.97	REAL
Periodo de Ejecución: INICIO 26/07/2024	TERMINO 26/07/2024
APLICA: 90	NO APLICA: 98
MONTO: \$279,767.70	PORCENTAJE: 29.99
FECHA DE PAGO: 13/08/2024	

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
Monto Afianzado: \$279,860.99	\$80,419.83	
Afianzadora: INSTITUCION DE GARANTIA	2945213	
FECHA: 26/07/2024	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE	INICIAL	FINAL
PLAZO		
NO APLICA: X		
Monto Total Contratado (Convenio + Contrato) de Obra: \$932,869.97		C/JIVA

Ing. Adán Bureos Monfil	Ing. Oscar Jair Rojas Ortiz
DIRECTOR DE OBRAS	SUPERVISOR DE OBRAS
FORMATO 11	

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	04/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE



MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUITZ	A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024309030114	DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR NEYRA, REHABILITACION Y RAFAEL MURILLO VIDAL Y FINAL DEL ANDADOR NEYRA, REHABILITACION Y	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		ANTECEDENTES:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
TIPO DE ZONA: RURAL	SI	MUY ALTO	
TIPO DE ZONA: URBANA	NO	ALTO	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	MEDIO	
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	NO	BAJO	
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:		MUY BAJO	
DIRECTA		X	
COMPLEMENTARIA		X	
RESTRINGIDA		X	

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD	19.506718300
LONGITUD	-95.875026700

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	Monto con IVA	POLIZAS CHEQUE		Monto	No.	Monto con IVA	Monto con IVA	Monto con IVA	Importe Neto
		No.	Monto						
3IN	\$428,054.90	SPEI	\$297,793.37	126	\$428,054.90	\$128,416.47	\$0.00	\$0.00	\$297,793.37
ANTICIPO	\$701,402.95	SPEI	\$701,402.95	98452	\$701,402.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,402.95
TOTALES	\$428,054.90		\$297,793.37			\$128,416.47	\$1,845.06	\$0.00	\$999,196.32

B) REPORTE		FECHAS	
Monto pagado en el mes:	\$297,793.37	14/10/2024	
Monto pagado acumulado:	\$297,793.37		
Finiquito con IVA:	\$0.00		
Acta entrega recepción:			
OBSERVACIONES:			

OBSERVACIONES:	
Ing. Adolfo Burgos Montiel DIRECTOR DE OBRAS	
Ing. Civil Ruben Omar Morales Bandala SUPERVISOR DE OBRAS	

*En caso de requerir más líneas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
25/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA, ENRIQUEZ		DESCRIPCION DE LA OBRA:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 20243090900115	
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			
Cuenta con Proyecto Ejecutivo: SI X NO			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A			
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO			
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD -96.893975700			
ANTECEDENTES:			
GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAO MUY BAO X			
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA			
DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTOR PLUVIAL Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MALLORCA, ENTRE CALLES CASTILLA Y APALACHES, CALLE CIRCUITO MOGAL, ENTRE CALLES APALACHES Y AV. NIAGARA, AND. EL ROBLE, ENTRE CTO. NOGAL Y CALLE LA CAÑADA, CALLE LA CAÑADA, ENTRE CALLE APALACHES Y AND. ROBLE, CALLE APALACHES, ENTRE CALLE LA CAÑADA Y AV. MONTE FUEFEST, COL. LOMAS DE CASA			
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 15%			
MONTOS AUTORIZADOS: \$5,200,000.00 CIVA			
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE: \$5,200,000.00 CIVA			
VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA			
DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA			
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: CMAS			
PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA			
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.			
TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA EXISTE X			
INVITACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA			
NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-113-2024 FECHA: 22/08/2024			
CONTRATISTA: GRUPOVER SA DE CV			
RFC: GRU040402C49			
MONTOS CONTRATADOS: \$4,992,048.88 CIVA			
PROGRAMADA 22/08/2024 REAL			
PERIODO DE EJECUCION: INICIO 22/08/2024			
TERMINO 09/12/2024			
DIAS 110			
APLICA MONTO: \$0.00 NO APLICA X			
FECHA DE PAGO: PORCENTAJE: 0.00			
ANTICIPO: MONTO: \$0.00			
FECHA DE PAGO: PORCENTAJE: 0.00			
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS			
MONTOS AFIANZADOS: \$1,497,614.66 \$430,349.04			
AFIANZADORA: INSTITUCION DE GARANTIA DE CREDITO			
No. DE FIANZA: 2956856			
FECHA: 22/08/2024			
IMPORTE/PERIODO			
CONVENIO MONTO EXISTE INICIAL FINAL			
MODIFICATORIO: PLAZO NO APLICA X			
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$4,992,048.88 CIVA			
Ing. Adan Burgos Bonfil DIRECTOR DE OBRAS			
Arq. Carlos Gustavo Hernandez Parades SUPERVISOR DE OBRAS			
FORMATO 11			

* En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FECHA DE ELABORACIÓN:	04/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

EJERCICIO 2024



A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA, ENRIQUETZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TUNEL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA VICENTE GUERRERO, CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, 23 DE MARZO.
No. DE OBRA: 2024300000116	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:										ANTECEDENTES:									
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:																			
TIPO DE ZONA:		CLAVE		AGEB:		MUY ALTO		ALTO		MEDIO		BAJO		MUY BAJO		X			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO		X		NO		X		NO		NO					
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO		SI		X		NO		NO		NO		NO		NO					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA																			
LATITUD		19.564113500		LONGITUD		-96.835761300													

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:									
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA VICENTE GUERRERO, CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, 23 DE MARZO, CONSTITUCIÓN DEL SUMIDERO Y ENCANTOS DEL SUMIDERO, EN XALAPA, VERACRUZ.									
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:									
AVANCE DEL 45%									

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
POLIZAS CHEQUE		FACTURAS							
No. EST.	MONTO CON IVA	No.	MONTO	IMPORTE NETO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO		
IN	\$592,355.18	SPFI	\$412,095.37	\$177,706.55	\$2,553.26	\$0.00	\$412,095.37		
ANTICIPO	\$1,225,476.91	SPFI	\$1,225,476.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,476.91		
1A	\$46,879.85	SPFI	\$32,613.82	\$16,063.96	\$202.07	\$0.00	\$32,613.82		
TOTALES	\$639,235.03		\$444,709.19	\$191,770.51	\$2,755.33	\$0.00	\$5,670,186.30		

B) REPORTE		FECHAS	
EXISTE			
MONTO PAGADO EN EL MES:		\$444,709.19	
MONTO PAGADO ACUMULADO:		\$444,709.19	
FINIQUITO CON IVA:		50.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:			
OBSERVACIONES:			

AVANCE FÍSICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
AVANCE	0	0	0	0	0	0	0.31	15.55	35.66	42.74	0
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	1	1	2	20	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	1	3	25	45	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	17.55	1.66	27.46	0

MONTO AFANZADO:		\$1,225,476.91	3352,148.54	
AFIANZADORA:		INSTITUCION DE GARANTIA INSTITUCION DE GARANTIA		
No. de FIANZA:		2945335	2945338	
FECHA:		26/07/2024	26/07/2024	
		MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
CONVENIO		PLAZO	INICIAL	FINAL
MODIFICATORIO:		NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO CONTRATO) DE OBRA:		\$4,084,923.02		
		C/IVA		

AVANCE FISICO REAL											
AVANCE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT
PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MONTO AFIANZADO:	\$1,225,476.91	\$352,148.54		
AFIANZADORA:	INSTITUCION DE GARANTIA	INSTITUCION DE GARANTIA		
No. DE FIANZA:	2945335	2945338		
FECHA:	26/07/2024	26/07/2024	FECHA	
	EXISTE	IMPORTE/PERIODO		
CONVENIO	MONTO			
MODIFICATORIO:	PLAZO	INICIAL	FINAL	
	NO APLICA	X		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO CONTRATO) DE OBRA:		\$4,084,923.02		C/JVA

Ing. Adán Ríos Morales
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Juan Ortiz Lagunes
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir más datos se le apartará de estado financiero utilizar 002 hoja.

FORMATO 11

EJERCICIO 2024

[illegible]

*En caso de requerir más filas en el apartado de egresos financieros utilizar otra zona.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACIÓN:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA, ENRIQUETZ	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. de obra: 202430900120	
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LAUREL, ENTRE CALLES HUIZACHAL Y ENCINOS, COLONIA HIGUERAS Y REHABILITACIÓN	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE
ZONA:	URBANA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD	19.550148000
LONGITUD	-96.885171700

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LAUREL, ENTRE CALLES HUIZACHAL Y ENCINOS, COLONIA HIGUERAS Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 2DA DE SCHUBERT ENTRE CALLE HAVEL Y AREA VERDE DE TRACCIONAMIENTO INDICO ANIMAS, COL INDICO ANIMAS EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 93%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*	
FACTURAS	
No. EST.	POLIZAS CHEQUE
No. EST.	MONTO CON IVA
ANTICIPO	\$361,952.40
TOTALES	\$0.00

MONTO AUTORIZADO:	\$1,250,000.00
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,250,000.00
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA	CMAS
FACTIBILIDAD:	EXISTE
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
LOS PERMISOS:	EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS
	LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-110-2024
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS FRIYA SA DE CV
RFC:	IFR200525013
MONTO CONTRATADO:	\$1,206,508.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO 08/08/2024
	TERMINO 05/11/2024
	DÍAS 90
ANTICIPO:	MONTO: \$0.00
	FECHA DE PAGO: PORCENTAJE: 0.00

B) REPORTE	
FECHAS	
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO
MONTO AFIANZADO:	\$361,952.40
AFIANZADORA:	SITUACIÓN DE GARANTÍA INSTITUCIÓN DE GARANTÍA
FECHA:	29/03/2024
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO INICIAL FINAL
	EXISTE 08/08/2024 08/08/2024
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRAS:	\$1,206,508.00

Ing. Oscar Rojas Ortiz
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir más folios en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN VARIAS CALLES (FRESNO, EUCAUPTO, ENCINOS, HAYAS Y NISPEROS), Y REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRESNO, EUCAUPTO Y HAYAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL INTEROCEANICO Y CALLE NISPEROS, DE LA COL. UNION FERROCARRILERA, EN XALAPA, VER.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024309080123		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	SI	NO
ZONA: RURAL	N/A		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	AGEB:	SI	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	19.555075000	LONGITUD	-98.911250000

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
POLIZAS CHEQUE					FACTURAS				
No. FST.	MONTO CON IVA	No.	MONTO	No.	MONTO CON IVA	MONTO CON IVA	MONTO CON IVA	MONTO CON IVA	MONTO CON IVA
ANTICIPO	\$1,202,148.84	5PEI	\$1,202,148.84	789633	\$1,202,148.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,202,148.84
TOTALES									
	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,202,148.84

B) REPORTE		AVANCE FISICO REAL											
EXISTE		FECHAS											
MONTO PAGADO EN EL MES:		\$0.00											
MONTO PAGADO ACUMULADO:		\$0.00											
FINQUITO CON IVA:		\$0.00											
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:													
OBSERVACIONES:													

MONTO AFIANZADO:		\$1,202,148.84		5345,445.07		TARADORA ASERTA, SA. CUIJAGORRA ASERTA, SA. C	
AFIANZADORAS:		4290-00268-0		4290-00269-0			
NO. DE FIANZA:		16/08/2024		16/08/2024			
FECHA:		EXISTE		IMPORTE/PERIODO		FECHA	
CONVENIO		MONTO		INICIAL		FINAL	
MODIFICATORIO:		PLAZO		NO APLICA		X	
MONTO TOTAL CONTRATO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:						\$4,007,162.80	
						C/IVA	

AVANCE FISICO REAL			
AVANCE	ENE	FEB	MAR
PROGRAMADO	0	0	0
REAL	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0

AVANCE FISICO REAL			
AVANCE	ENE	FEB	MAR
PROGRAMADO	0	0	0
REAL	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0

AVANCE FISICO REAL			
AVANCE	ENE	FEB	MAR
PROGRAMADO	0	0	0
REAL	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0

*En caso de requerir más días en el mes de estado financiero utilizar obra hoy.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FECHA DE ELABORACION:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

EJERCICIO 2024

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE Z. MERCADO, ENTRE CALLES AVENIDA FERROCARRIL INTEROCEANICO Y AVENIDA ENCANTO Y PRIVADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 20243000000124	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRA REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A

TIPO DE ZONA: URBANA

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD -96.907555000

LATITUD 19.566286700

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAO MUY BAO X

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

RESTRINGIDA

FACTURAS

5 MILLAR

IMPORTE NETO

\$356,750.16

\$356,750.16

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

FECHAS

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

AVANCE FISICO REAL

B) REPORTE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FECHA DE ELABORACION:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

EJERCICIO 2024

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINES, ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y PROLONGACION VILLA HERMOSA, EN	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 7024309090125		

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO	X
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	N/A	
ZONA: URBANA	AGEB:	SI	NO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	X	NO
COORDENADAS DE GEOREFERENCIA			
LATITUD	0.00000000	LONGITUD	0.00000000

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA *									
No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS				IMPORTE NETO	CARGOS ADICIONALES
		Nb.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA	IMPORTE NETO CON IVA	5 MILLAR		
ANTICIPO	\$520,324.25	5961	\$520,324.25	E4058	\$520,324.25	\$0.00	\$0.00	\$520,324.25	\$0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACIÓN:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090128		DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, ENTRE LAS FLORES Y EDUARDO MARQUINA, DE LA COLONIA	
ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO		GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO BAJO MUY BAJO X	
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A			
ZONA: RURAL URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO			
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD -95.906901700			
LATITUD 19.568463300			
C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*			
FACTURAS			
No. EST.	MONTO CON IVA	No. POLIZAS CHEQUE	MONTO
TOTALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00			
B) REPORTE			
EXISTE		FECHAS	
MONTO PAGADO EN EL MES: \$0.00			
MONTO PAGADO ACUMULADO: \$0.00			
FINQUITO CON IVA: \$0.00			
ACTA ENTREGA RECEPCION:			
OBSERVACIONES:			
Ing. Aden Rios Morales DIRECTOR DE OBRAS			
Ing. Oscar Benitez Ortiz SUPERVISOR DE OBRAS			
FORMATO 11			

*En caso de requerir más folios en el apartado de estado financiero utilizar otro hoja.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
04/11/2024
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA 3A PRIV. DE LINDO SERRANO ENTRE LINDO SERRANO Y FINAL DE LA PRIVADA Y AND. S/N ENTRE
MUNICIPIO:	MUNICIPALIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	DESCRIPCION DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	
NO. DE OBRA:		
	XALAPA EN RIQUIZ	
	2024.3/020901.29	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		ANTECEDENTES:	
SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE			
ZONA:			
AGEB:			
ET			
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO			
ALTO			
MEDIO			
BAJO			
MUY BAJO			
X			
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
NO			
SI			

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 90.30%.

MONTO AUTORIZADO:		\$1,150,000.00	CIVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,150,000.00	CIVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS		NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			CMAS
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA	NO APLICA
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X
	licitación pública		

NO. DE CONTRATO:	C/MAS-OP-114-2024		FECHA:	10/09/2024
CONTRATISTA:	FOXA SA DE CV			
RFC:	EX0070808V94			
Monto CONTRATADO:	\$958,571.88	C/IVA		
	PROGRAMADA	REAL		
	INICIO	11/09/2024		
	TERMINO	29/11/2024		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	DÍAS	80	51	
	APLICA	NO APLICA	X	
ANTICIPO:	MONTO:	\$0.00	PORCENTAJE:	0.00
	FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$287,571.56	\$82,635.51	
AFIANZADORA:		K INSTITUCION DE CARAK INSTITUTION DE CARAK		
No. DE FIANZA:		2959823	2959826	
FECHA:		10/09/2024	10/09/2024	
		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO		MONTO	INICIAL	FINAL
MODIFICATORIO:		PLAZO		
		NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO +		\$998,571.186		
CONTRATO DE OBRA:				

Ing. Adolfo Sampedro Mondul
DIRECTOR DE OBRAS

ste nash de nou, cu mai alina el se en el apartats de esbdu [mundu udgar] oca ho



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

[illegible]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024309090132	DESCRIPCION DE LA OBRA:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:				ANTECEDENTES:			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:							
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
ZONA: RURAL				ALTO			
ZONA: URBANA				MEDIO			
ZONA: SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				BAJO			
ZONA: SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				MUY BAJO			
ZONA: SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				X			

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RÍO AMARILLO, ENTRE CALLE RÍO FUERTE Y CALLE RÍO VERDE, DE LA COL. CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ	

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	LONGITUD	-96.908043000
LATITUD	19.562570000	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS						
	No.	MONTO	No.	MONTO	AVANCEADO CON IVA	IMPORTE NETO	CARGOS ASIGNACIONES	5 MILLAR	IMPORTE NETO
ANTICIPO	5741	\$227,125.81	36875	\$227,125.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,125.81
TOTALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,125.81

B) REPORTE		AVANCE FISICO REAL											
MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FICHAS											
	\$0.00	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINQUITO CON IVA:	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTA ENTREGA RECEPCION:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:													
Ing. Adolfo Suarez Montiel DIRECTOR DE OBRAS													

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar una hoja.

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO AMARILLO, ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE RIO VERDE, DE LA COL. CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FISICO DEL 48.8%

MONTO AUTORIZADO:		\$950,000.00		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$950,000.00		C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA			
TIPO DE LICITACION:	EXISTE			
	X			
	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-117-2024	FECHA:	10/09/2024
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CALMON SA DE CV		
RFC:	CGA100723HR1		
MONTO CONTRATADO:	\$757,086.04	PROGRAMADA	REAL
		11/09/2024	11/09/2024
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO	TERMINO	
	29/11/2024	29/11/2024	
	DIAS	80	51
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:	\$0.00	PORCENTAJE: 0.00
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$227,125.81	\$65,266.04	
AFIANZADORA:	4. INSTITUCION DE GARANTIA INSTITUCION DE GARAN		
No. DE FIANZA:	2957715	2957722	
FECHA:	10/09/2024	10/09/2024	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	NO APLICA	INICIAL
		X	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$757,086.04		C/IVA

Ing. Adolfo Suarez Montiel DIRECTOR DE OBRAS	Ing. Heber Ali Montiel Medel SUPERVISOR DE OBRAS
---	---

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024



FECHA DE ELABORACION:	25/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUET	DESCRIPCION DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 20243090901.34	

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO	X
CLAVE	N/A		
AGEB:	SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	X	NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO	ALTO	PUZLO	BAJO	MUY BAJO
				X

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:

DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD	19.573669500
LONGITUD	-96.895897100

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE				FACTURAS				IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	MONTO	No.	MONTO	No.	MONTO	
ANTICIPO	\$216,804.18	SI/EL	\$216,804.18	25472	\$0.00	SI/MILLAR	\$0.00	CARGOS AJUDICIALES	\$0.00	\$216,804.18
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$216,804.18

B) REPORTE

	EXISTE	AVANCE FISICO REAL											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00												
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00												
FINQUITO CON IVA:	\$0.00												
ACTA ENTREGA RECEPCION:													

OBSERVACIONES:

AVANCE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AVENIDA MARIIL, ESMERALDA, ROQUETA, AZABACHE, ZATIRO, CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2, ENTRE AVENIDA MARIIL Y PROPIEDAD PRIVADA, DE LA COLONIA EL ARENAL EN XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 60%

MONTO AUTORIZADO:	\$850,000.00	C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$850,000.00	C/IVA	
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS		NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE		NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE	X	NO EXISTE
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA		EXISTE
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA		X
	IMITACION A MENOS 3 PERSONAS		
	licitacion publica		

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-118-2024	FECHA:	10/09/2024
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IAMINIA SA DE CV		
RFC:	CCD70804EWA		
MONTO CONTRATADO:	\$722,680.61	PROGRAMADA	REAL
		11/09/2024	11/09/2024
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO	TERMINO	
	29/11/2024		
	DIAS		
	80		
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:	30.00	PORCENTAJE: 0.00
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO ATANZADO:	\$216,804.18	\$62,300.05	
AFIANZADORA:	AL COMPAÑIA DE GARANTIA COMPAÑIA DE CARAN		
NO. DE FIANZA:	BKY-0235-0220623		
FECHA:	10/09/2024	IMPORTE/PERIODO	FECHA
		10/09/2024	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	PLAZO	INICIAL
			FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO):	\$216,804.18		
CONTRATO DE OBRA:	NO APLICA		

Ing. Asist. Téc. Moisés Moisés
Ing. Civil Víctor Hugo Hernández-Pérez
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir más folios en el apartado de estado financiero se lleva una hoja.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	22/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUETZ		A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024304090137		DESCRIPCION DE LA OBRA:	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR ARBOLEDAZ ENTRE CALLE TUXTEPEC Y FINAL DE LA CALLE DE LA COLONIA			
DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:			
CONSTRUCCION DE AL CANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR ARBOLEDAZ ENTRE CALLE TUXTEPEC Y FINAL DE LA CALLE DE LA COLONIA RAFAEL HERNANDEZ OCIOJA EN XALAPA, VERACRUZ.			
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:			
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 39%			
MUNICIPIO AUTORIZADO: \$1,350,000.00		C/IVA	
MUNICIPIO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,350,000.00		C/IVA	
VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS		NO APLICA	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA		NO APLICA	
FACTIBILIDAD:		NO APLICA	
PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.	
LOS PERMISOS:		EXISTE	
TIPO DE LICITACION:		ADJUDICACION DIRECTA	
		LICITACION A MENOS DE 3 PERSONAS	
		LICITACION PUBLICA	
NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-122-2024	
CONTRATISTA:		SUPERVISION CONSTRUCCION Y EDIFICACION LEOSA DE CV	
RFC:		SCE110701N6	
MUNICIPIO CONTRATADO:		\$1,229,152.94	
PERIODO DE EJECUCION:		INICIO 01/10/2024	
		TERMINO 04/12/2024	
		DIAS 65	
		31	
APLICA		NO APLICA	
MUNICIPIO:		\$0.00	
FECHA DE PAGO:		PORCENTAJE: 0.00	
TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS	
MUNICIPIO FIANZADO:		\$368,745.88	
FIANZADOR:		FINANCIACION MUNICIPAL FINANZAS MEX	
NO. DE FIANZA:		BKY-0235-0223937 BKY-0235-0223942	
FECHA:		01/10/2024	
CONVENIO MODIFICATORIO:		MUNICIPIO EXISTE	
		MUNICIPIO FINAL	
MUNICIPIO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO+ CONTRATO) DE OBRA:		\$1,229,152.94	
		C/IVA	
Ing. Adm. y Finanzas		Arq. Blanca Aurora Arredondo	
DIRECTOR DE OBRAS		SUPERVISOR DE OBRAS	
		FORMA TO 11	

* En caso de requerir más días al supuesto de la entrega financiera o utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 20243090500138 DESCRIPCION DE LA OBRA:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A
ZONA: URBANA AGE: NO X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL: ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD -96.875341500 LATITUD 19.497653800

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*										
No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE			FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	IMP.	IMPORTE OBRA ACORDO CON DIA ESTIMACION	ANULIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ACCIONALES		
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

B) REPORTE											
FECHAS											
EXISTE											
Monto pagado en el mes:											
\$0.00											
Monto pagado acumulado:											
\$0.00											
Finiquito con IVA:											
\$0.00											
Acta entrega recepción:											

AVANCE FISICO REAL											
AVANCE											
PROGRAMADO											
REAL											
ACUMULADO											
ATRASO (%)											
OBSERVACIONES:											

*En caso de presentar más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

FECHA DE ELABORACION: 27/11/2024
MES QUE SE REPORTA: OCTUBRE

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
HILANDERAS ENTRE CALLES CIRCUITO 1 Y ESTIBADORES, COL. MIGUEL ALEMÁN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
HILANDERAS ENTRE CALLES CIRCUITO 1 Y ESTIBADORES, COL. MIGUEL ALEMÁN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FISICO DEL 3.7%

MONTO AUTORIZADO: \$850,000.00 C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$850,000.00 C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: CMAS
PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.
TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA EXISTE X
LICITACION A MENOS DE 3 PERSONAS
LICITACION PUBLICA

NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-123-2024 FECHA: 01/10/2024
CONTRATISTA: COMPAÑIA SERRANA DE CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: SCMD904031UD MONTO CONTRATADO: \$781,888.72 C/IVA
PROGRAMADA
PERIODO DE EJECUCION: INICIO 01/10/2024 REAL
TERMINO 29/11/2024 01/10/2024
DIAS 60
APLICA NO APLICA 31 X
MONTO: \$0.00 PORCENTAJE: 0.00
FECHA DE PAGO:

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO FIANZADO: \$234,566.62 \$67,404.20
FIANZADORA: MEXICO COMPAÑIA FINANCIERA APLICADA
NO. DE FIANZA: 101303-00000 101307-00000
FECHA: 01/10/2024 03/10/2024
CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE PERIODO FECHA
PLAZO INICIAL FINAL
MONTO TOTAL CONTRATO (CONVENIO CONTRATO) DE OBRA: \$781,888.72 C/IVA

Ing. Adán Burgos Montiel
Ing. Oscar Rojas Ortiz
SUPERVISOR DE OBRAS
FORMATO 11



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION: 22/11/2024
MES QUE SE REPORTA: OCTUBRE

[illegible]



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/11/2024
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined using a spectrophotometer (Shimadzu UV-1601) at 663 nm and 646 nm, respectively. The concentrations were calculated using the following equations: $Chl\ a = 12.7 \times OD_{663}$ and $Chl\ b = 22.9 \times OD_{646}$.

Supervisor de Obras



CRIMATO 11

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: INIPIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024309090003 Período: OCTUBRE Número de estimación:
Descripción: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
Fecha de revisión: 22/11/2024

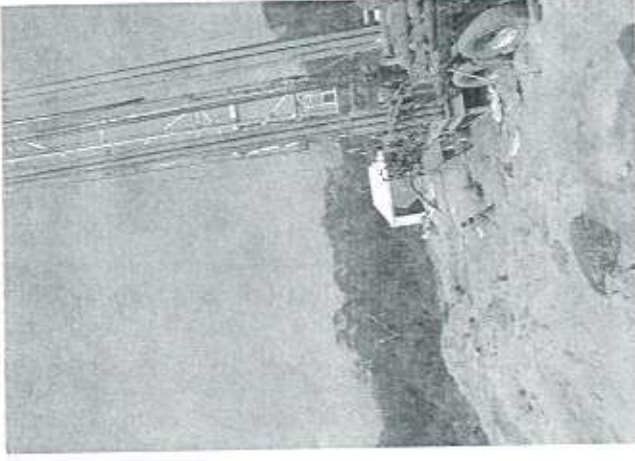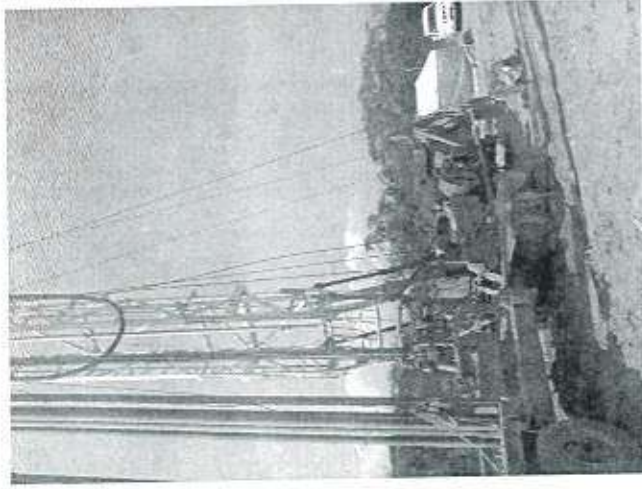

Concepto de obra ejecutado:

Maquinaria de perforación

Concepto de obra ejecutado:

Sitio de perforación

Observaciones:

Juan Olayo Raguines
Supervisor de Obras

ING. CIVIL
Profesión

C.C.P. Contador Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309090004

Descripción: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VIOLETAS (ENTRE CALLES EMILIO PORTES GIL Y



Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ

Periodo: OCTUBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 22/11/2024

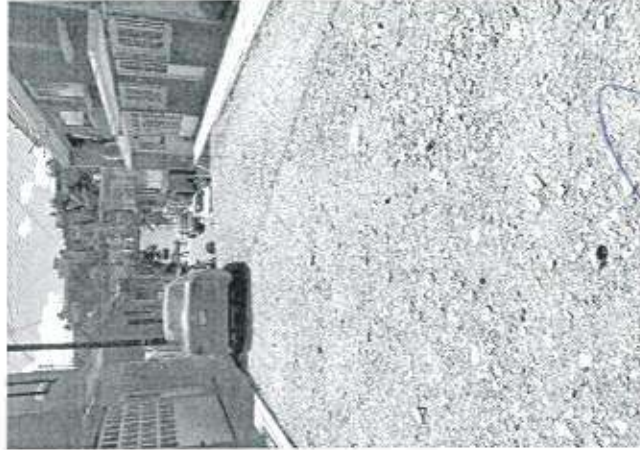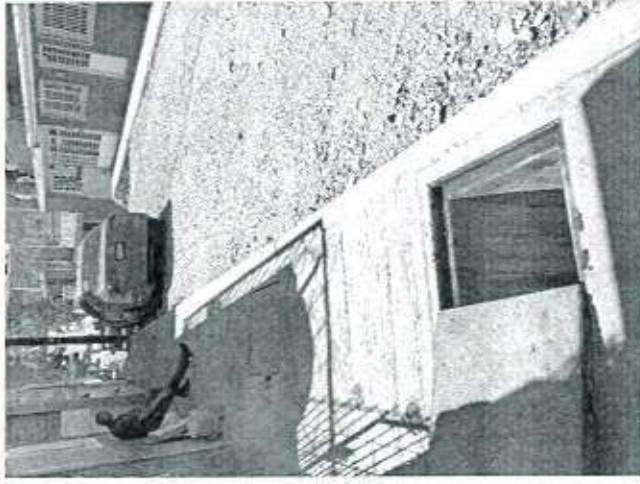

Concepto de obra ejecutado:

registros rehabilitados

Concepto de obra ejecutado:

colocación de caliza

Observaciones:

Ruben Cepal Morales Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL
Profesión

- X.C.P. Contralor Interno
- X.C.P. Tesorero Municipal
- X.C.P. Director de Obras Públicas
- X.C.P. Ofis

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024/09/090008

Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA ENTRE CALLES AVENIDA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, CALLE DURAZNO

Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ

Período: OCTUBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación:

Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 22/11/2024



Concepto de obra ejecutado: tendido de caliza en calle frambuesa

Concepto de obra ejecutado: construcción de registro albañal en calle durazno

Observaciones:

Victor Hugo Hernández Pérez

Supervisor de Obras

ING. CIVIL
Profesión

C.C.P. Contralor Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	JUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090009	Período:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO	Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado: Rodada de concreto

Concepto de obra ejecutado: pozo de visita existente

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de

Obra

AKQ.

Profesión

- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309090011

Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES HERREROS Y PINTORES (ENTRE AGUAS DE XALAPA Y LOS PINOS), Y

Localidad: XALAPA-ENRIQUÉZ



Período: OCTUBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación:

Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 22/11/2024

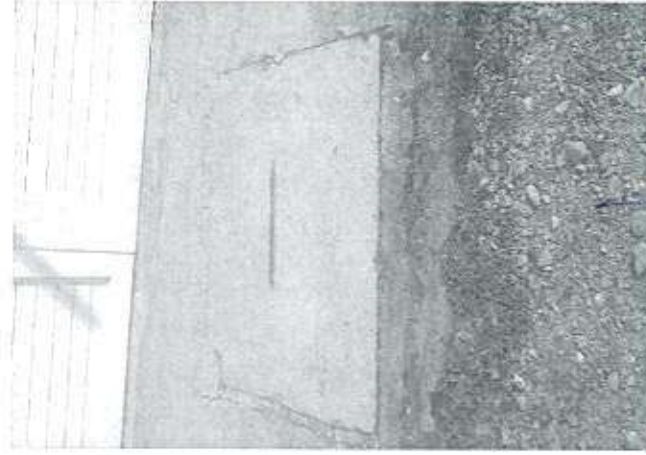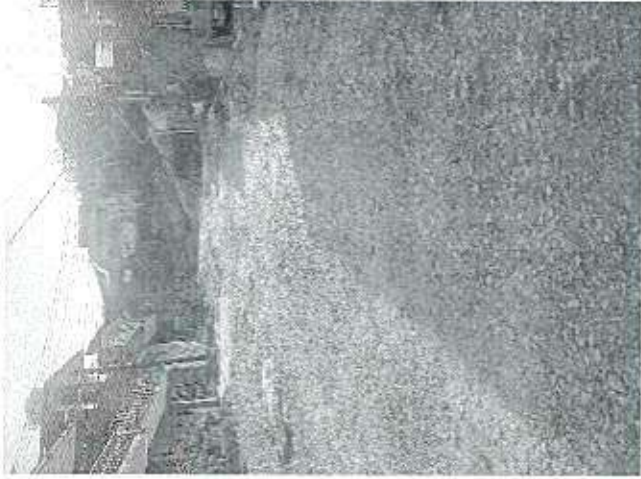

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de la obra

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Registro sanitario
Jesús Daniel Jiménez

Residente de Obra en funciones de Supervisor de

Obra

ARQ.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal


c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	JMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090015	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AV. DE LA REPÚBLICA Y	Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión:	22/11/2024
	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE				

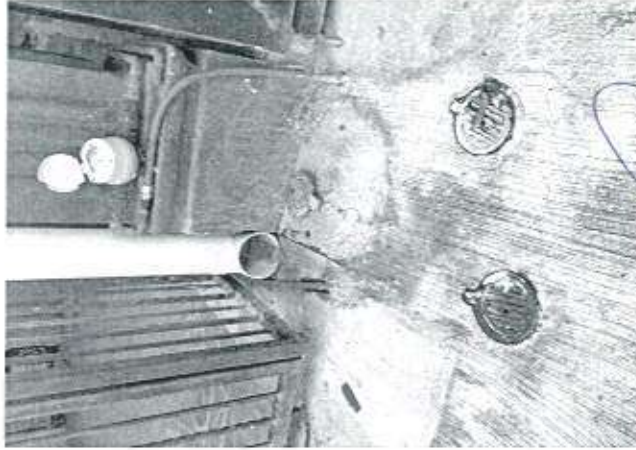

Concepto de obra ejecutado:

rehabilitación de registros sanitarios

Concepto de obra ejecutado:

tomas domiciliarias rehabilitadas

Observaciones:

Ruben Omar Morales Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

C.C.P.

Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

RE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: NIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024309090017 Período: OCTUBRE Número de estimación: INGRESOS PROPIOS
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Fuente de financiamiento: 22/11/2024
JORGE L. CASTILLO ENTRE FINAL DE LA CALLE Y PROLONGACIÓN BOLIVIA; PRIVADA Fecha de revisión:



Concepto de obra ejecutado:

Estado actual obra terminada

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual, obra terminada

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de


Obra ARQ.

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024309090019	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA LUZ DEL	Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión: 22/11/2024	

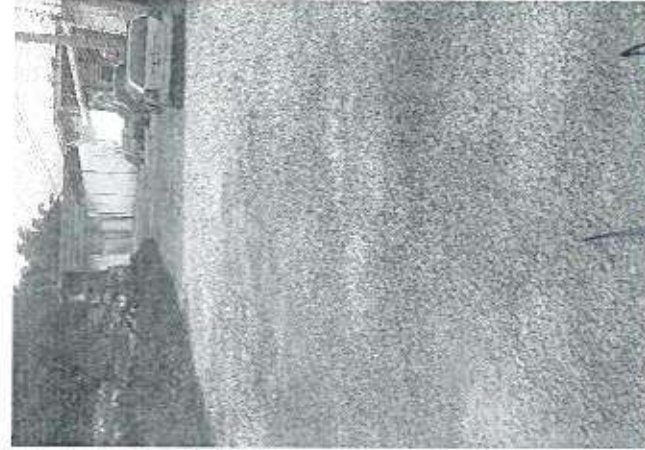

Concepto de obra ejecutado: Estado actual de la obra

Concepto de obra ejecutado: Estado actual de la obra

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de
Obra
ARQ.
Profesión
C.c.p. Contralor Interno
C.c.p. Tesorero Municipal
C.c.p. Director de Obras Públicas
C.c.p. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090020	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE	Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS		
	PRIVADA SATURNO ENTRE AVENIDA VIA LACTEA Y CALLE ANTARES, COLONIA ARROYO	Fecha de revisión:	22/11/2024		



Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de la obra

Concepto de obra ejecutado:

construcción de registros, albañal y toma domiciliaria

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de

Obra

ARQ.

Profesión


C.C.P. Contralor Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Orfís

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090022	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA PRIMAVERA, ENTRE				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024

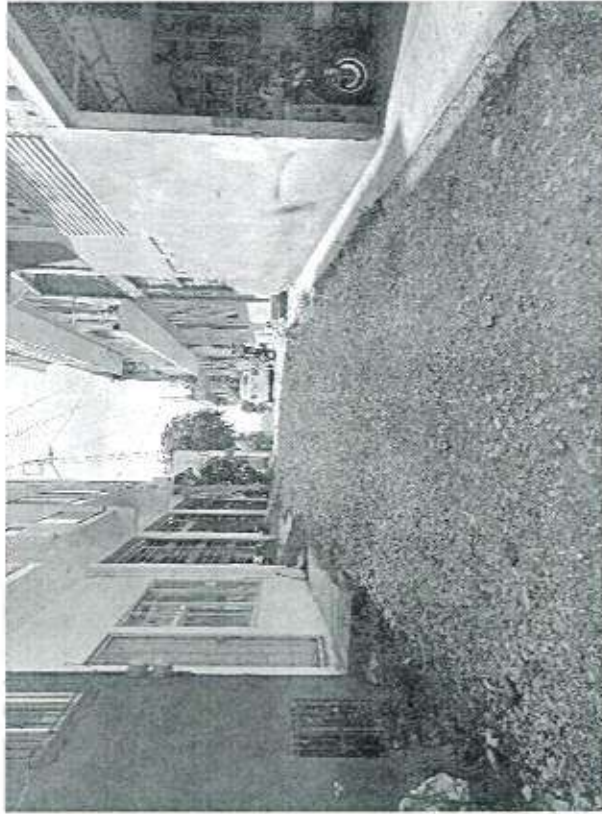

Concepto de obra ejecutado:

Estado Actual obra concluida

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de

Obra
ARQ.

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNCIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309090024

Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE

Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ


Período: OCTUBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación:

Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 22/11/2024

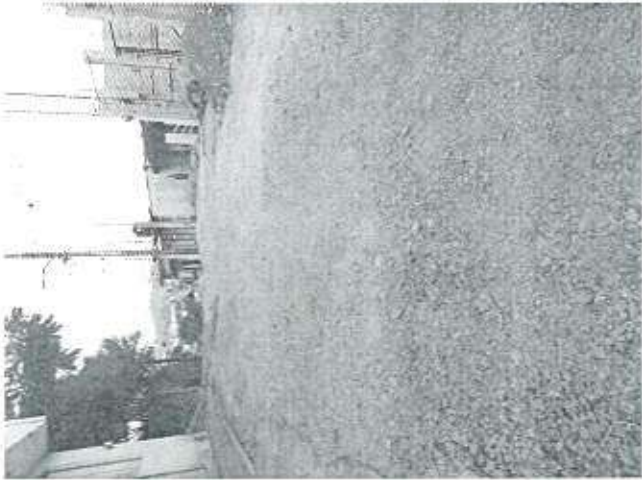

Concepto de obra ejecutado: Revestimiento con material calizo calle pinos

Concepto de obra ejecutado: Construcción de registro albañal

Observaciones:

Supervisor de Obras
Carlos Gustavo Hernández Paredes

ARQ. Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Otros

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 202430900034

Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE

Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ

Periodo: OCTUBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de revestimiento con material de base tipo calizo

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de revestimiento con material de base tipo calizo

Observaciones:

Juan Ortiz Lagunas

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

c.c.p. Controlador Interno

c.c.p. Tesorero Municipal


c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfís

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	JMPCIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024-305090035	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE OYAMEL, ENTRE CALLES (FRESNOS Y PANAMÁ), EN CALLE EBANO, ENTRE CALLES		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024

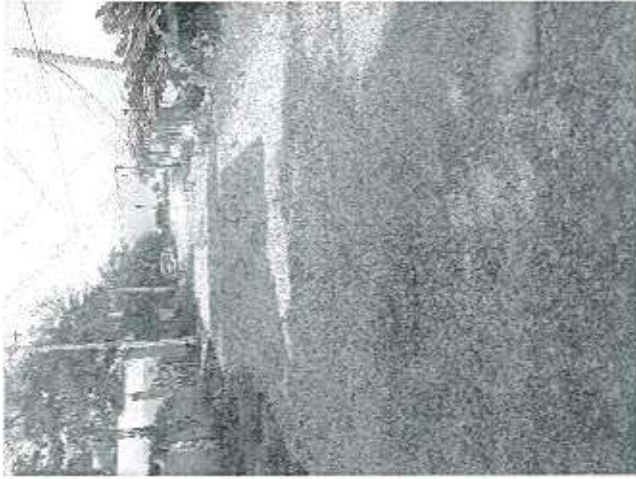

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de la obra

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de la obra

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de

Obra


ARQ.

Profesión

C.C.P. Controlador Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	JUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	202430900037	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAMINO A AGUA SANTA, ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. LAZARO CARDENAS EN		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024

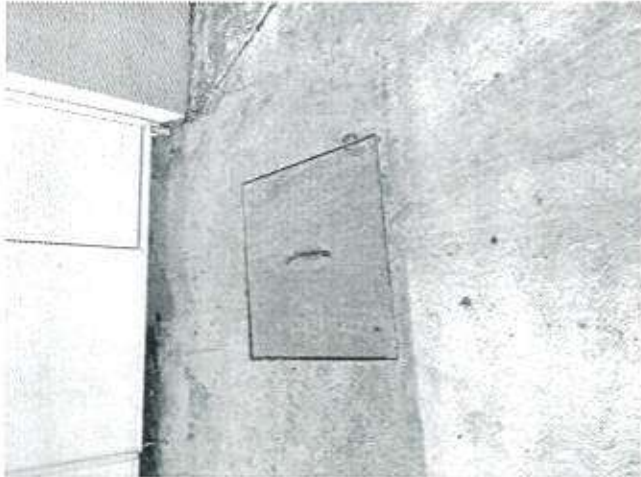

Concepto de obra ejecutado:

rehabilitado de registros sanitarios

Concepto de obra ejecutado:

pozos de visita rehabilitados

Observaciones:

Ruben Oyarzun Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesion

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orlis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	JNICIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090038	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA, CALLE		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de toma domiciliar y construcción de registro al baño

Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material calizo en calle, Andador camino antiguo a Naolingo

Observaciones:

Carlos Gustavo Hernández Paredes

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

c.c.p.

Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas


c.c.p. Ofis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	JINICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	202430900039	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTES PINO, ENTRE AV. IZALCO Y AV. LAGO IGUAZU, EN CALLE LAGO ONTARIO.				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024

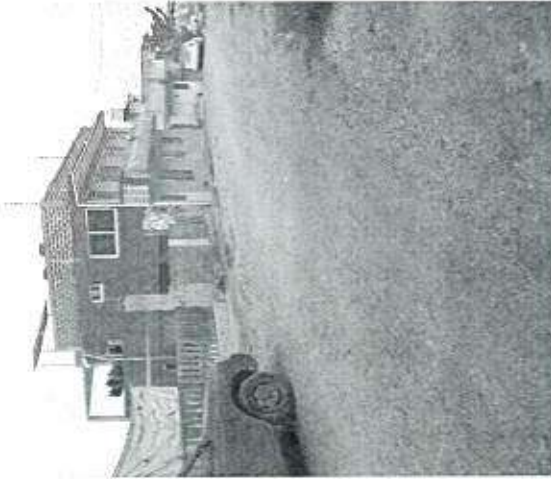

Revestimiento con material calizo

Concepto de obra ejecutado:



construcción de registro albañal

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Carlos Gustavo Hernández Paredes

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

E.C.P. Contralor Interno

E.C.P. Tesorero Municipal


E.C.P. Director de Obras Públicas

E.C.P. Otros

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio: JINICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			
Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ		Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024309050043		Número de estimación: OCTUBRE	
Descripción: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANDADOR XALAPA (ENTRE LUIS DONALDO COLOSTO Y CIRCUITO		Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS	
		Fecha de revisión: 22/11/2024	

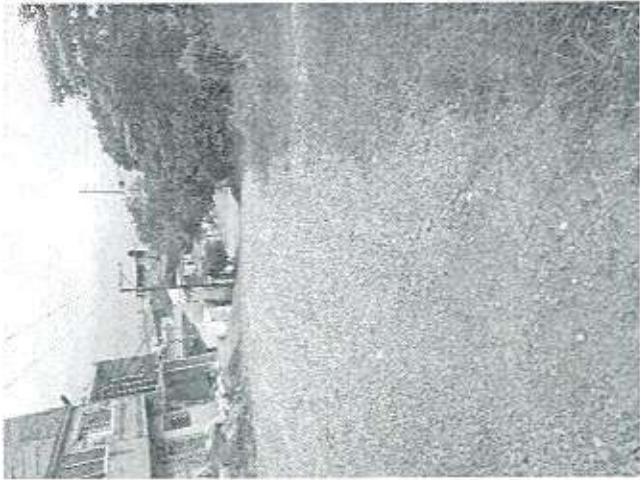

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual, obra terminada

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual, obra terminada

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra	
ARQ.	
Profesión	
Contralor Interno	
Tesorero Municipal	
Director de Obras Públicas	
Orfis	

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JINICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024/00090044

Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A COATEPEC ENTRE CALLE ENRIQUE RODRIGUEZ Y CALLE ESMERALDA Y RED DE AGUA

Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ

Período: OCTUBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material calizo

Concepto de obra ejecutado:

construcción de caja de operación de válvulas

Observaciones

Supervisor de Obras

Carlos Gustavo Hernández Paredes

ARQ.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	JUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	20243090900-46	Período:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LUIS FERNANDO ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA Y FINAL DE LA CALLE LUIS FERNANDO DEL		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

Suministro y tendido de material Calizo

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:


Residente de Obra en funciones de Supervisor de	
Obra	Obra
ARQ.	ARQ.
Profesión	
c.c.p.	Contralor Interno
c.c.p.	Tesorero Municipal
c.c.p.	Director de Obras Públicas
c.c.p.	Orfis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
 No. de obra: 2024309090051 Periodo: OCTUBRE Número de estimación:
 Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE INGRESOS PROPIOS
 CARLOS LASCURAIN, ENTRE PROLONGACIÓN LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS, Fecha de revisión: 22/11/2024

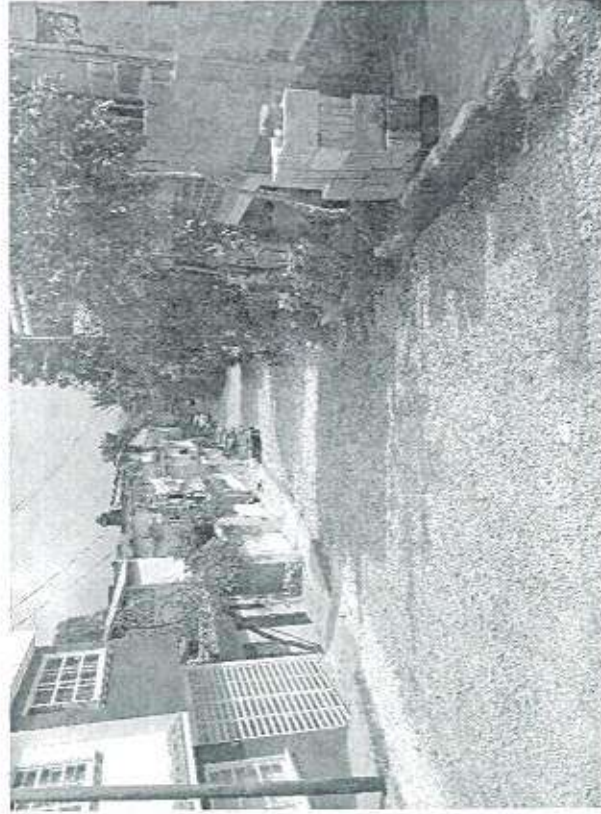

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual, obra terminada

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual, obra terminada

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de

Obra
ARQ.

Profesión del Supervisor


- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfís



AYUNTAMIENTO DE COMISI3N MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090054	Periodo:	OCTUBRE
Descripci3n:	REHABILITACI3N DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FIPILA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA INSURGENTES Y		
		N3mero de estimaci3n:	INGRESOS PROPIOS
		Fuente de financiamiento:	22/11/2024
		Fecha de revisi3n:	



Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de la obra

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Estado actual de la obra

Javier Jaime Jimenez

Residente de Obra en funciones de Supervisor de

Obra

ARQ.

Profesi3n

C.C.P.

Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras P3blicas

C.C.P. Orf3s

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	JNICIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024305090056	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO A SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES AZUCENA Y SANTA TEODORA EN LA		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado: instalación de toma domiciliaria en línea de 3 pulgadas en santa rosa

Concepto de obra ejecutado: instalación de tubería de 3 pulgadas en agua potable en santa rosa

Observaciones:	
Supervisor de Obras	
VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ PÉREZ	
ING. CIVIL	
Profesión	
C.C.P. Contralor Interno	
C.C.P. Tesorero Municipal	
C.C.P. Director de Obras Públicas	
C.C.P. Orfs	



AYUNTAMIENTO DE COMISI3N MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	JUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090061	Periodo:	OCTUBRE	N3mero de estimaci3n:	
Descripci3n:	REHABILITACI3N DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL BARRAGAN, ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. LUIS DONALDO COLOSTO, DE				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisi3n:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:	drenaje sanitario en Miguel Barrag3n esq Av Donaldo colostio	Concepto de obra ejecutada:	construcci3n de caja de v3lvulas en Miguel Barrag3n esq con Av Donaldo colostio
Observaciones:			
<div>Supervisor de Obras</div> <div>ING. CIVIL</div> <div>Profesi3n</div> <div>C.C.P. Contralor Interno</div> <div>C.C.P. Tesorero Municipal</div> <div>C.C.P. Director de Obras P3blicas</div> <div>C.C.P. Orfs</div>			

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2024-309090062	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE 3, CON PREPARACIONES DE RED		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado: poro de visita en alcantarillado y caja de válvulas en calle río Ierna y río sordo



Concepto de obra ejecutado: caja de válvulas y reposición de concreto en calle tres y río

Greenprint

Supervisor de Obras
Víctor Hugo Hernández Pérez

Supervisor de Obras

ING, CIVIL

Profesión

Y.C.D. Contralateral Internig

C.C.P.: Tesorero Municipal

C.C.O. Director de Obras Públicas

J.C.D. Orlitz



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024-309030063	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación: INGRESOS PROPIOS	
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIRCUITO LAS FLORES, DE CAMINO AL SUMIDERO A CAMINO AL SUMIDERO, COLONIA EL		Fuente de financiamiento: 22/11/2024	



Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de toma domiciliar

Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de toma domiciliar

Observaciones:

Carlos Gustavo Hernández Parodés

Supervisor de Obras

ARQ. Profesión


- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER
E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090064	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACION DE RED DE DE AGUA POTABLE EN CALLE MAGNOLIA, ENTRE CALLE CLAVES Y CALLE JUAN PABLO ALDASORO CON REHABILITACION DE RED DE DE AGUA				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024

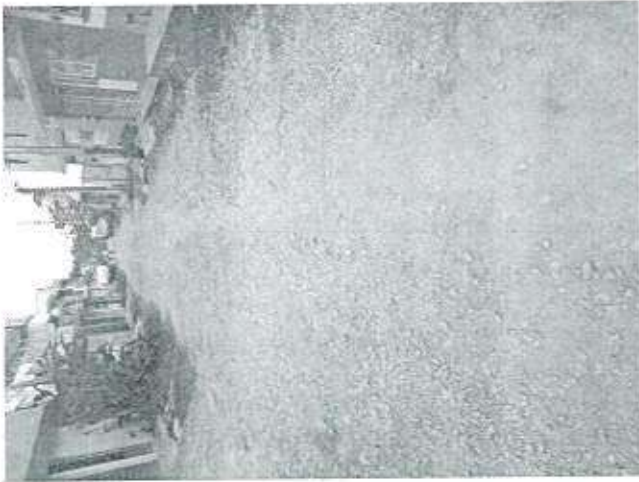

Concepto de obra ejecutado:

tendido de base de caliza en calle magnolia

Concepto de obra ejecutado:

tomas domiciliaria en calle magnolia

Observaciones:

Victor Hugo Hernández Pérez
Supervisor de Obras

ING. CIVIL
Profesión

c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Publicas
c.c.p. Ofis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JMNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024309090065 Período: OCTUBRE Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE HUAJE (ENTRE PRIV. LAS FUENTE de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
DALIAS Y SALVADOR ALLENDE) (ENTRE NARANJOS Y HUAJE) DE LA Fecha de revisión: 22/11/2024



compactado de material calizo

Concepto de obra
ejecutado:

compactado de material calizo

Observaciones:

Ruben Omar Morales Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas


C.C.P. Otros

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 20243090900068 Período: OCTUBRE Número de estimación: INGRESOS PROPIOS
Descripción: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE FUENTE de Financiamiento: 22/11/2024 Fecha de revisión:

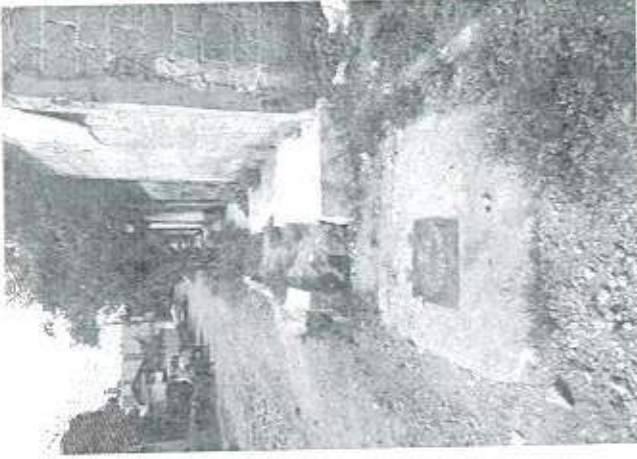

Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material calizo y suministro e instalación de brocal

Concepto de obra ejecutado:

caja de operación de válvulas

Observaciones:

Carlos Gustavo Hernández Paredes

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal


C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Otros

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER
E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	UNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090069	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LINO CHAVEZ ZAMUDIO, ENTRE CALLE LORENZO BARCELATA Y ELPIDIO				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024

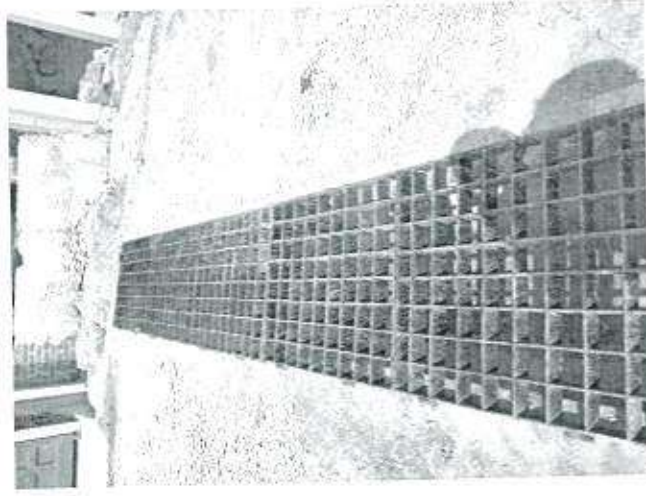

colocación de rejillas en tragatormantas

Concepto de obra ejecutado:

caja de válvulas rehabilitadas

Concepto de obra ejecutado:

Ruben Omar Morales Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL	Profesión
C.C.P. Contralor Interno	
C.C.P. Tesorero Municipal	
C.C.P. Director de Obras Públicas	
C.C.P. Otros	


Observaciones:

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 20243090300/0 Periodo: OCTUBRE Número de estimación: INGRESOS PROPIOS
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RUBÍ (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE Fecha de revisión: 22/11/2024

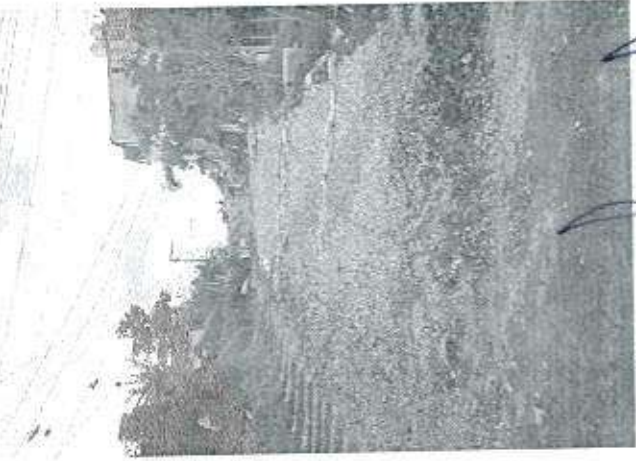

Concepto de obra ejecutado:

Limpieza, suministro y tendido de Calizo

Limpieza, Suministro y tendido de material Calizo

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de

Obra

ASQ:

Profesión



- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

TE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090071	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ROBLE ENTRE LAS CALLES OLMO Y CEDRO; EN LA CALLE CEDRO ENTRE LAS			Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	25/11/2024

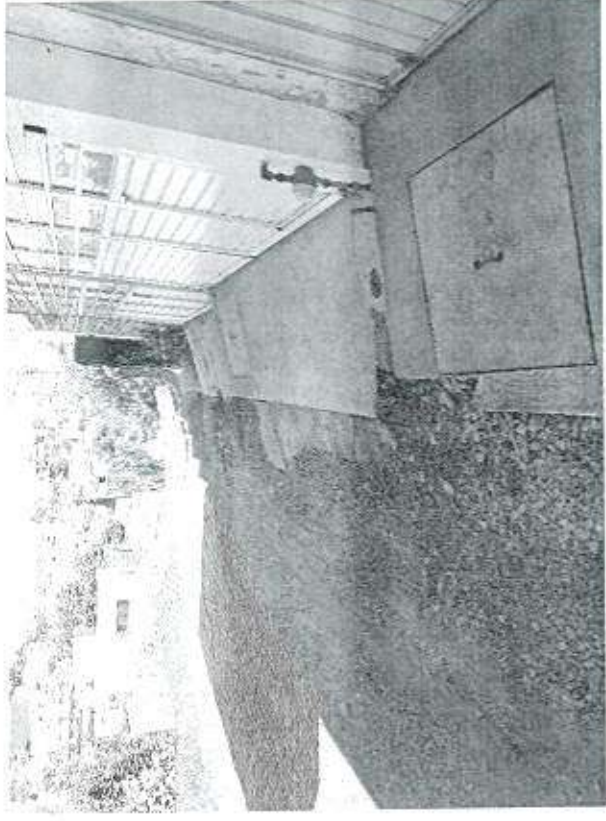

Concepto de obra ejecutado: Tendido de caliza

Registros sanitarios y tomas domiciliarias

Gilberto Montero Pérez

Otro en funciones de Supervisor de Obra

Observaciones:

ING. CIVIL
Profesión del Supervisor
c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfís

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER
E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	20243090900/2	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CINCO, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL, DE LA COLONIA EL MORAL, EN XALAPA, VERACRUZ.				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024



reconstrucción de muro de mampostería

Concepto de obra ejecutado:



construcción de tratamiento en privada cinco

Concepto de obra ejecutado:

Victor Hugo Hernández Pérez

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

C.C.P.

Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

Observaciones:


AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	INICIPIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	202430900073	Número de estimación:	INGRESOS PROPIOS
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL SUMIDERO ENTRE CALLES	Fecha de revisión:	22/11/2024

Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
Periodo:	OCTUBRE

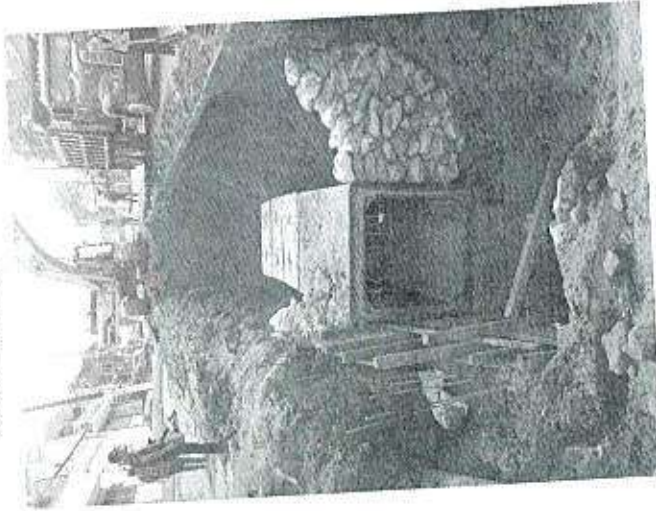

Concepto de obra ejecutado:

Instalación de cajón prefabricado de concreto de 1.5 m x 1.5 m



Concepto de obra ejecutado:

Excavación con equipo para red de drenaje sanitario

Observaciones:

Carlos Gustavo Hernández Paredes

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Ofis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER
E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES


Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024303090075 Período: OCTUBRE Número de estimación: INGRESOS PROPIOS
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NABOR TEJEDA, (ENTRE LA CALLE PROL. ADOLFO RUIZ CORTINES Y LIQUIDAMBAR) Y REHABILITACIÓN DE RED DE

Fecha de revisión: 22/11/2024



estado actual de brocal

Concepto de obra ejecutado:

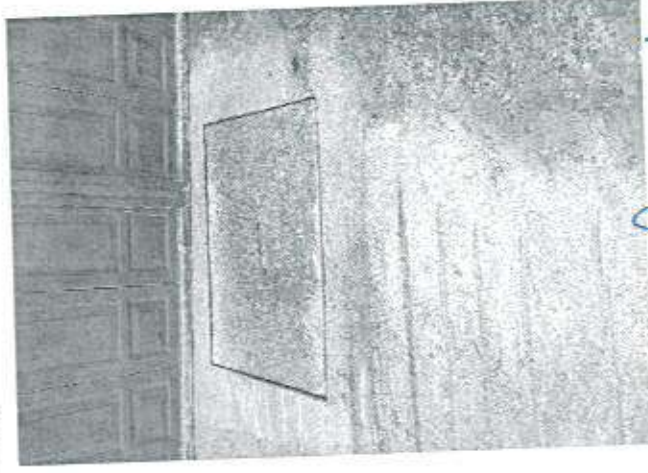

Concepto de obra ejecutado:

registro sanitario rehabilitado

Heber Al-Mordomira Nodel
Supervisor de Obras

Observaciones:

ING.
Profesión

C.C.P. Contralor Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Orfis


AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER




E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: INICIPIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024309090076 Periodo: OCTUBRE Número de estimación: INGRESOS PROPIOS
Descripción: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE Fuente de financiamiento: 22/11/2024
ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LAURELES, ENTRE CALLES CHIAPULTEPEC Y

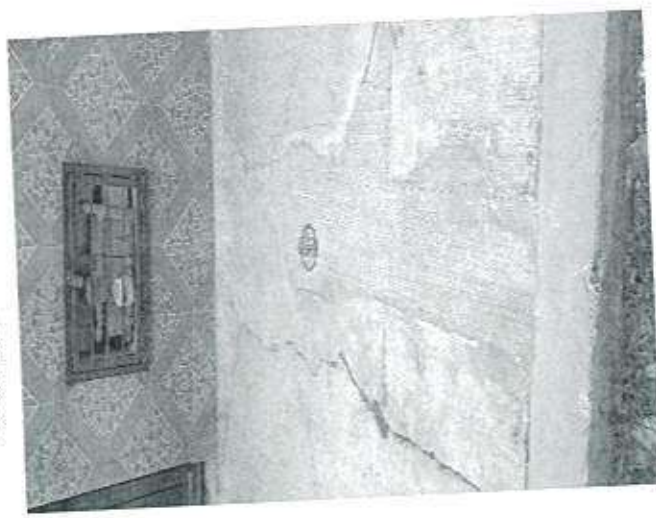

Concepto de obra ejecutado: toma domiciliaria rehabilitada

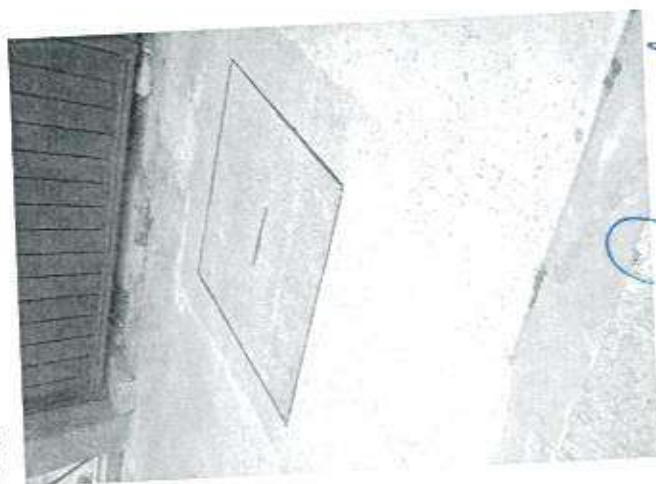

registro sanitario rehabilitado

Concepto de obra ejecutado:

toma domiciliaria rehabilitada

Observaciones:

Heber Alf. Montemayor Nodel
Supervisor de Obras

ING.


Profesión

- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Drfis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES	
Municipio: JINICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024309090077	Número de estimación: INGRESOS PROPIOS
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (CIRCUITO QUETZALCOÁTL) ENTRE LAS CALLES TEMASCALTEPEC Y	Fecha de revisión: 22/11/2024

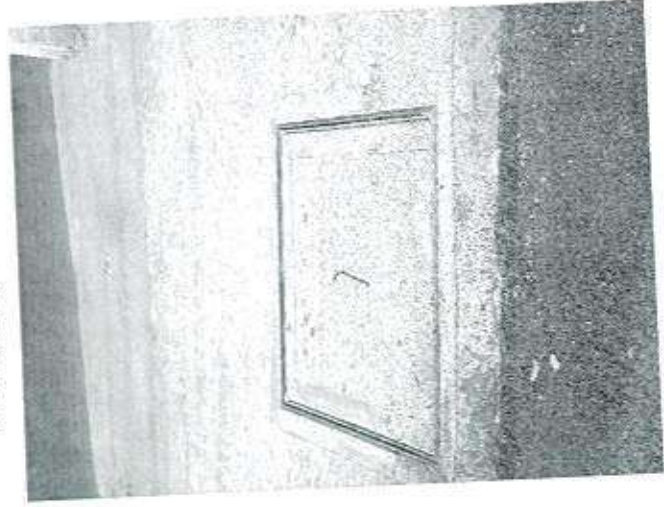

registro sanitario rehabilitado

Concepto de obra ejecutado:



toma domiciliaria rehabilitada

Concepto de obra ejecutado:


[Signature]
Supervisor de Obras

Observaciones:

ING.
Profesión
C.C.P. Contralor Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Orfía

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER


CALAS



E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES


Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090078	Período:	OCTUBRE	Número de estimación:	INGRESOS PROPIOS
Descripción:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LA CALLE LAS PALMAS E INGENIO LA GLORIA, COL. NACIONAL Y	Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión:	22/11/2024

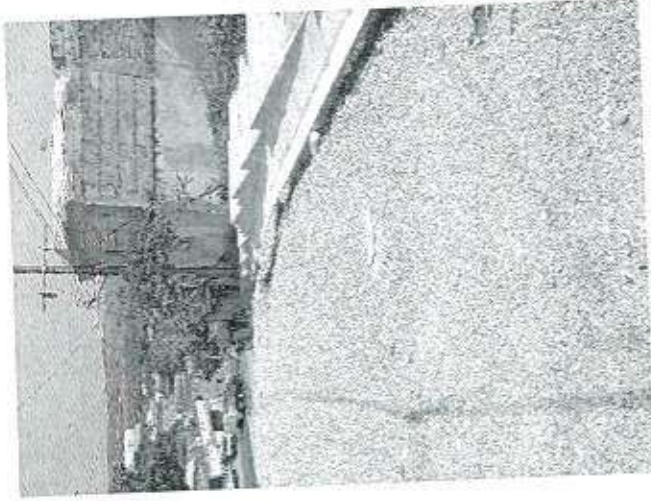

Concepto de obra ejecutado:

estado actual de escalinatas y material tipo calizo

Concepto de obra ejecutado:

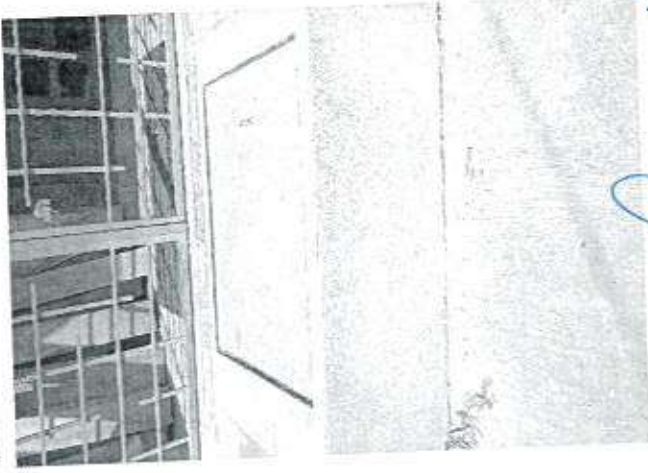

estado actual de registro sanitario


Observaciones:

Heber Almontemira Medel
Supervisor de Obras

ING.
Profesión

- c.c.p. Contralor interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orlis


AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER



E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090079	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PABLO H MEDINA ENTRE CALLES LUIS DORANTES Y DURAZNO Y CALLE MELÓN ENTRE				
				Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024

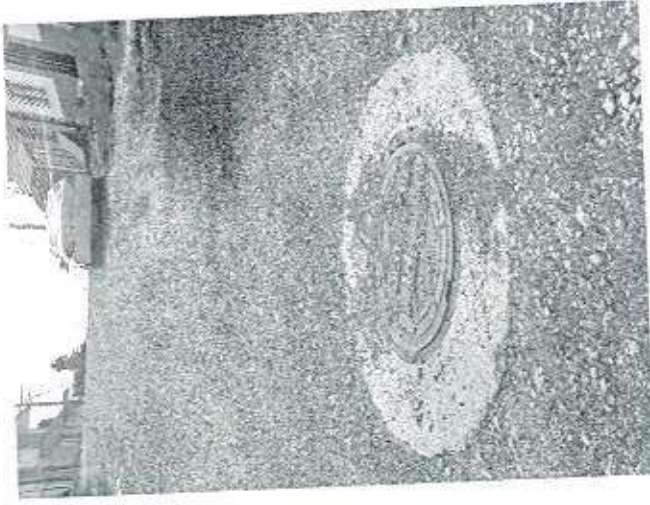

Concepto de obra ejecutado:

estado actual de brocales y vialidad

Concepto de obra ejecutado:



toma domiciliaria rehabilitada

Heber Guillermo Meléndez

Supervisor de Obras

Observaciones:

ING.

Profesión

C.C.P. Cantor Interior

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Oficio

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

CALAS

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
 No. de obra: 2024309090080 Período: OCTUBRE Número de estimación: INGRESOS PROPIOS
 Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22/11/2024
 TAJÍN ENTRE LAS CALLES PLAZA DE ARMAS Y HAYA, EN LA CALLE MAYA ENTRE LAS



Concepto de obra ejecutado: preparación para colado de contramarcos



Concepto de obra ejecutado: prueba hidrostática

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

prueba hidrostática


Supervisor de Obras

ING.

Profesión

- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfís

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER



E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÍEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	202430900081	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	INGRESOS PROPIOS
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL MIRADOR, ENTRE CALLES AV. PRINCIPAL Y FINAL DE PRIVADA EL MIRADOR, DE LA COLONIA EL MORAL; REHABILITACIÓN				
				Fuente de financiamiento:	22/11/2024
				Fecha de revisión:	



estado actual de vialidad

Concepto de obra ejecutado:



estado actual de registro sanitario

Observaciones:

Heber Ali Montemira Medel
Supervisor de Obras

ING.

Profesión

- C.C.P. Contralor Interno
- C.C.P. Tesorero Municipal
- C.C.P. Director de Obras Públicas
- C.C.P. Orlis


AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

CMAAS

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES	
Municipio: JNIPICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra: 2024305090082	Periodo: OCTUBRE
Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	
Fecha de revisión: 22/11/2024	

Descripción: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS LAS TORRES.

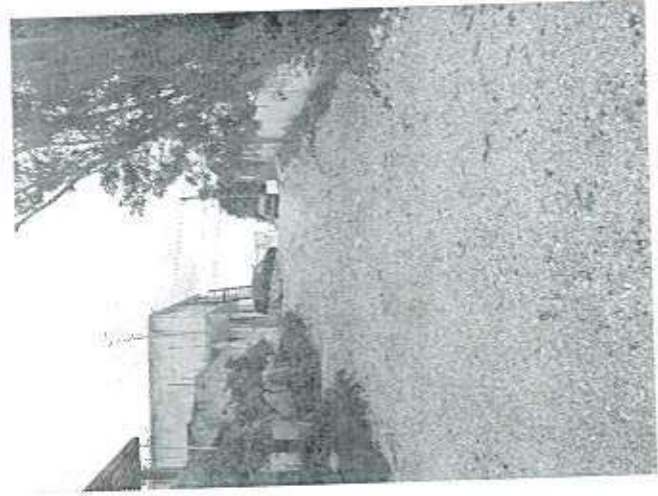

Reveslumiento con material calizo sobre calle Hueva

Concepto de obra ejecutado:



Instalación de brocal de polietileno sobre calle Hueva

Concepto de obra ejecutado:

Luis Ángel Avellano Marín
Supervisor de Obras

Observaciones:

ARQ.

Profesión


- C.C.P. Contralor Interno
- C.C.P. Tesorero Municipal
- C.C.P. Director de Obras Publicas
- C.C.P. Orfis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	JNICIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	202430900083	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	INGRESOS PROPTOS
Descripción:	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS ARBOLEADAS DEL				
				Fuente de financiamiento:	72/11/2024
				Fecha de revisión:	

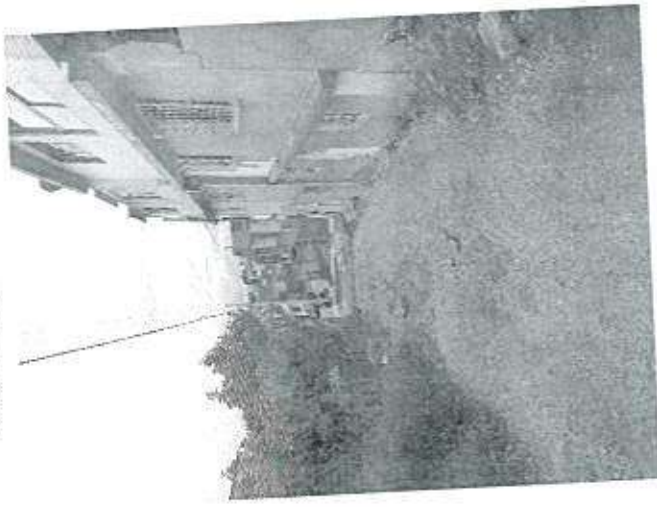


Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material calizo en calle Río Tecolutla

Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de banquetta de concreto en calle Río Tecolutla

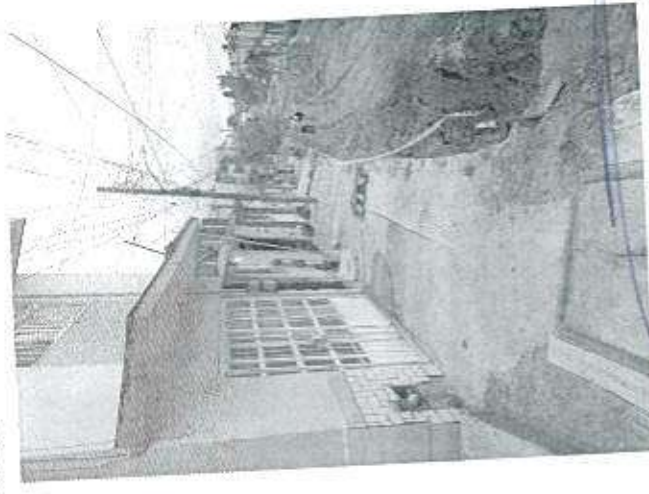

Luis Ángel Avelino Marín

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

- c.c.p. Contador Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfe



Observaciones:



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024309090084	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA MITIGACIÓN POR INUNDACIONES EN ANDADOR PINOS. CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS MIXTAS.		Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	
		Fecha de revisión: 22/11/2024	

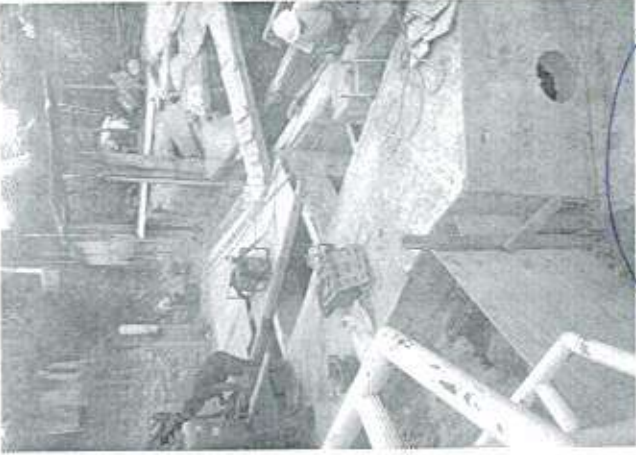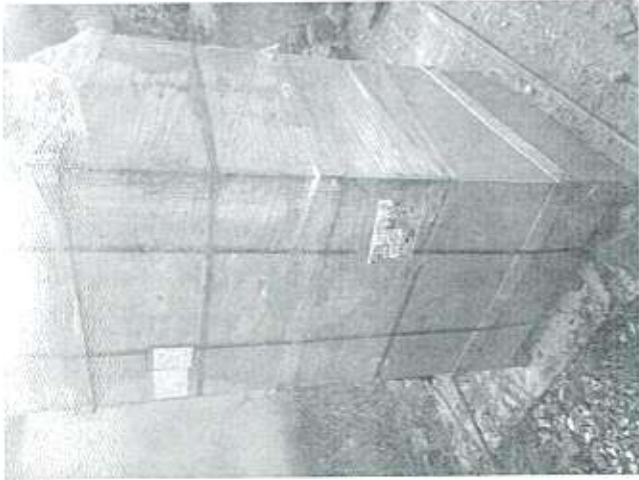

Concepto de obra ejecutado:

suministro de bomba sumergible de 75 hp

Concepto de obra ejecutado:

construcción de cárcamo de bombeo en andador pinos

Observaciones:

Victor Hugo Hernandez Perez


Supervisor de Obras

ING. CIVIL
Profesión


C.C.P. Contralor Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024300900085	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL, EN LA CALLE MARIA ENRIQUETA CAMARILLO, ENTRE LAZARO CARDENAS Y		Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	
		Fecha de revisión: 22/11/2024	

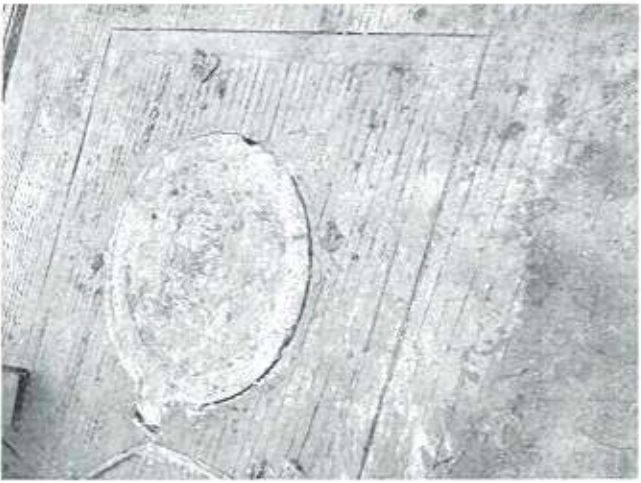

rehabilitado de brocales

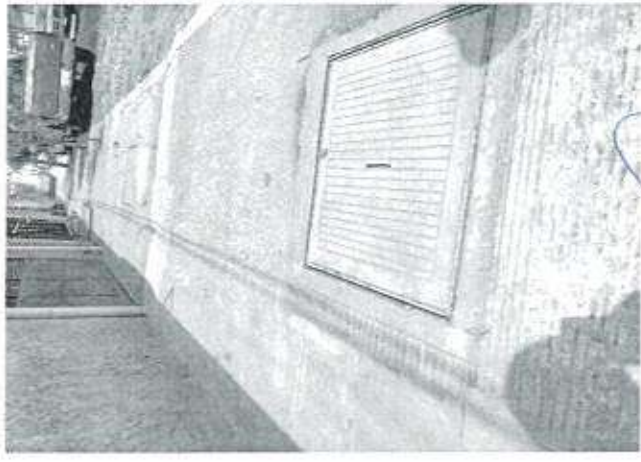

rehabilitado de registros sanitarios

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

Ruben-Olga Morales Bandala

Contralor Interno

Tesorero Municipal

Director de Obras Públicas



C.C.P. Orfis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	JUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090086	Período:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CALZADA LUZ DEL BARRIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS				
	(ENTRE RESIDENCIAL EL ENCINO Y CALLE CERRADA LUZ DEL BARRIO) Y REHABILITACIÓN				
	Fecha de revisión: 22/11/2024				

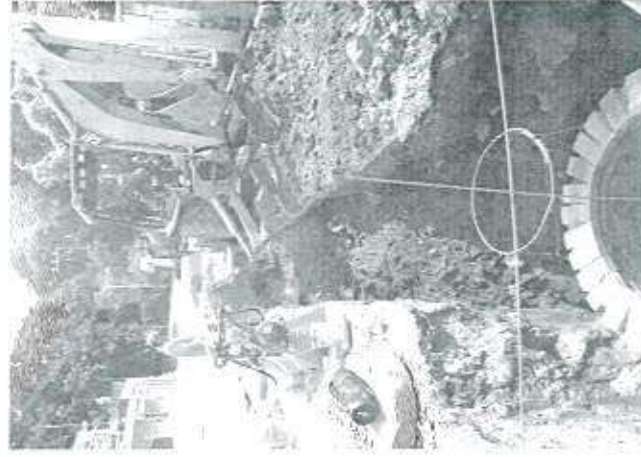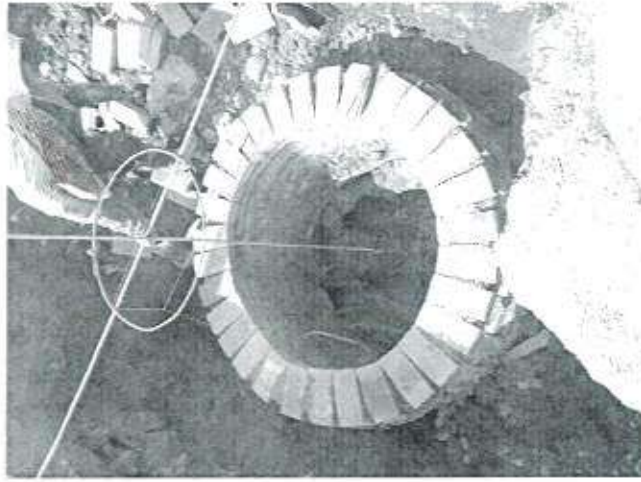

Concepto de obra ejecutado:

Construcción de pozo de visita

Concepto de obra ejecutado:

Excavación para zanja de drenaje sanitario

Observaciones:


Blanca Aurora Anali Flores
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión

c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	202430900088	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PERLA, CONSTRUCCIÓN DE		
		Número de estimación:	EJERCICIO 2024
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:	Excavación para zanja de agua potable	Concepto de obra ejecutado:	Excavación a mano para zanja de agua potable
Observaciones:			
		Supervisor de Obras	
		Blanca Aurora Anelli Flores	
		ARQ.	
		Profesión	
		C.C.P. Contralor Interno	
		C.C.P. Tesorero Municipal	
		C.C.P. Director de Obras Publicas	
		C.C.P. Orfis	

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024370900089

Descripción: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALcantarillado sanitario y red de agua potable en circuito Ceiba, (entre Alamo y José María Morelos), y

Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ


Periodo: OCTUBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación:

Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 22/11/2024

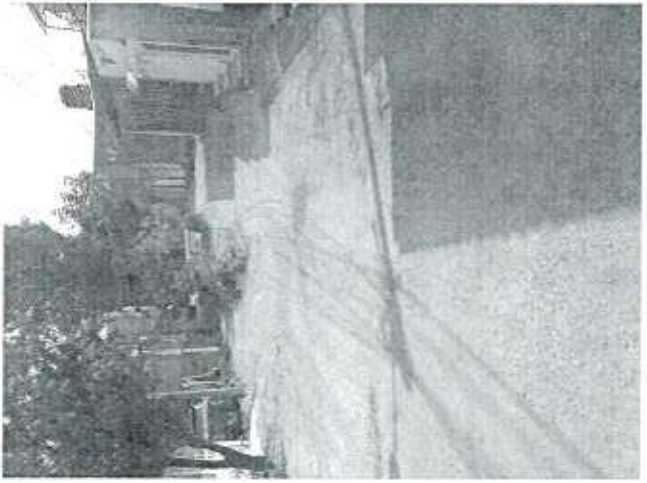

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de la obra

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Tendido de piedra caliza

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orlis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNIPICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309050090

Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CIRCUITO RIO SEDENO Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLES (MANANTIAL DE

Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ

Periodo: OCTUBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación:

Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

relleno de material producto de excavación

Concepto de obra ejecutado:

colocación de base cementada

Observaciones:

Ruben Ortiz Morales Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

C.C.P.

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas


C.C.P. Orfis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	JNIPICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024-309090091	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS				
	BENITO JUÁREZ (ENTRE ACUEDUCTO E HISTORIAS PREHISPÁNICAS), DE LA COLONIA Fecha de revisión: 22/11/2024				

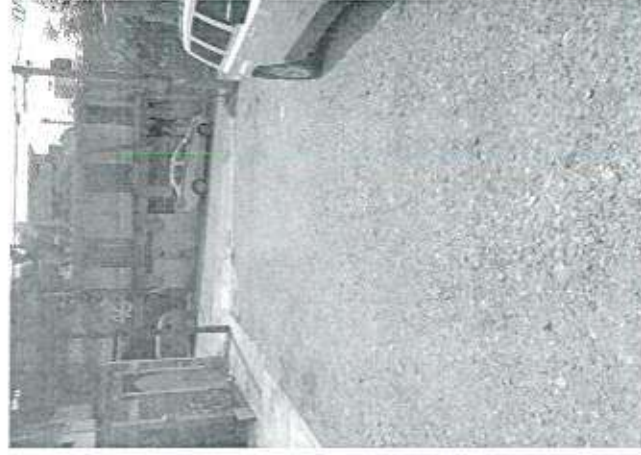

Concepto de obra ejecutado:

Tendido de piedra caliza

Concepto de obra ejecutado:

Tendido de piedra caliza

Observaciones:

Bianca Aurora Anel Flores

Supervisor de Obras

ARQ. Profesión

C.C.P. Contralor Interno


C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Ofis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2024309000002	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE AL CANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO SECO, (ENTRE RÍO JORDÁN Y CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO); Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024

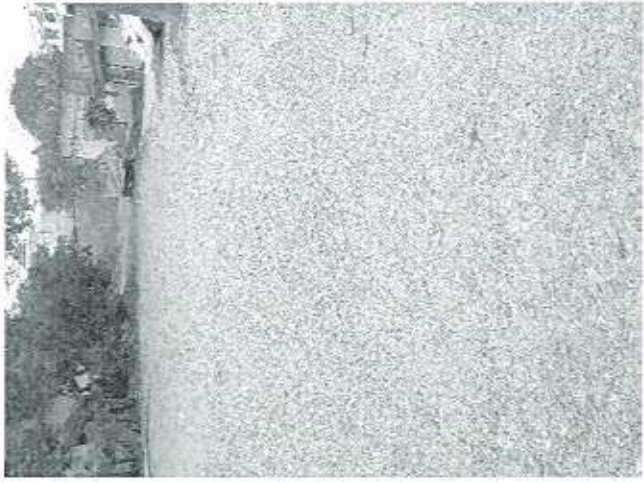

Concepto de obra ejecutado:

estado actual, material tipo calizo

Concepto de obra ejecutada:

registro sanitario rehabilitado

Observaciones:


Héber Al Montemayor Model
Supervisor de Obras

ING. Profesión

- ☐ c.c.p. Contralor Interno
- ☐ c.c.p. Tesorero Municipal
- ☐ c.c.p. Director de Obras Públicas
- ☐ c.c.p. Ofis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024/009/00093	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LINDEROS, ENTRE CALLES (13 DE SEPTIEMBRE Y CEIBA) Y REHABILITACIÓN DE RED DE		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024

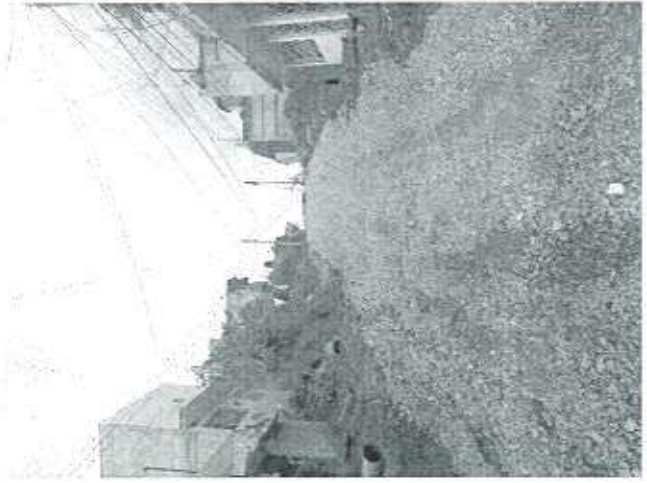

Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material calizo

Concepto de obra ejecutado:

Instalación de brocal de polietileno

Observaciones:

Luis Ángel Avellano Marín	
Supervisor de Obras	
ARQ.	Profesión
C.C.P.	Contralor Interno
C.C.P.	Tesorero Municipal
C.C.P.	Director de Obras Públicas
C.C.P.	Ofis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ

Periodo: OCTUBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024


Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309090095

Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR AZALEA ENTRE CALLES LOMAS DE XALAPA Y LOMAS DE LA VILLA, COL. LOMAS VERDES.

Número de estimación: INGRESOS PROPIOS.

Fecha de revisión: 22/11/2024

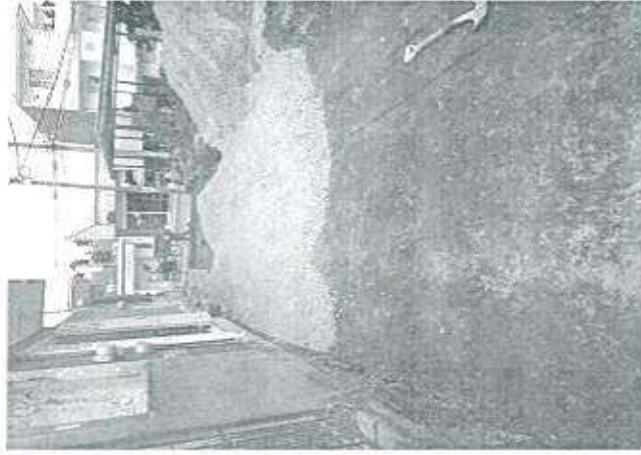

Concepto de obra ejecutado:

colocación de brocal

Concepto de obra ejecutado:

tendido de base de grava cementada

Observaciones:

Oscar Jey Rojas Ortiz
Supervisor de Obras

ING. Profesión

C.C.P. Contador Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 202430900096

Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PAGANINI, (ENTRE AV. PASEO DE LAS ARAUCARIAS Y BEETHOVEN), DE LA COLONIA

Localidad: XALAPA-ENRIQUÉZ

Periodo: OCTUBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación:

Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

reposición de concreto

Concepto de obra ejecutado:

acabado final con sellado

Observaciones:

Supervisor de Obras

Ruben Omar Morales Bandala

ING. CIVIL

Profesión

C.C.P.

Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024305090097 Período: OCTUBRE Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 5 Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
DE MAYO, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y VICENTE GUERRERO, COL. NACIONAL Fecha de revisión: 22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de tomas domiciliarias

Concepto de obra ejecutados:

Construcción de pozo de vista

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Marsh
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión

C.C.P. Contralor Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNIPICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309090098

Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SUR 6, (ENTRE FRANCISCO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y DIVISIÓN DEL NORTE), EN LA

Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ


Periodo: OCTUBRE

Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación:

Fecha de revisión: 22/11/2024

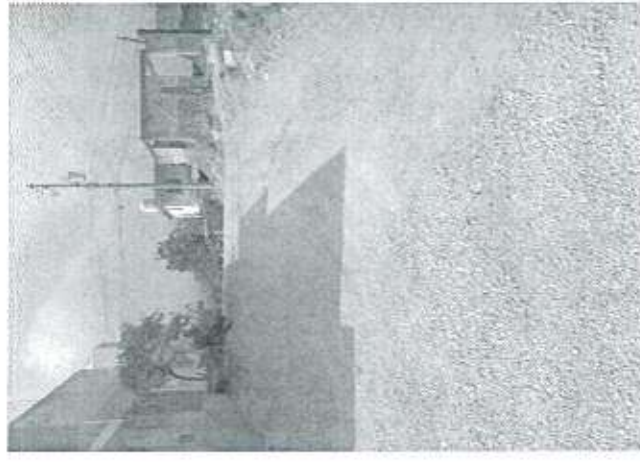

Concepto de obra ejecutado:

Tendido de piedra caliza

Concepto de obra ejecutado:

Tendido de piedra caliza

Observaciones:

Supervisor de Obras

Blanca Aurora Anell Pérez

ARQ.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	JINICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	20243090X0099	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALBERTO UREÑA, ENTRE CALLES (MACADAMIA Y PRIVADA ABECUL), DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA EL				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de caja de operación de válvulas

Concepto de obra ejecutado:

Excavación en roca

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Martín

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Drifts

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	JINICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	20243090901001	Período:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CALLE PROLONGACION JAMAICA Y AV. MONTE EVEREST, COL.		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de descarga domiciliar

Concepto de obra ejecutado:

Caja de operación de válvulas

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Marín
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión


C.C.P. Contralor Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Ofis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024309090102 Periodo: OCTUBRE Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
REHABILITACIÓN DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE PRIV. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, Fecha de revisión: 22/11/2024

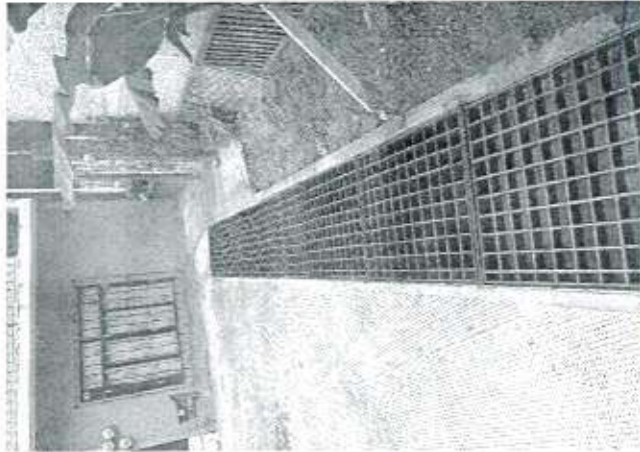

Concepto de obra ejecutado:

Instalación de brocal de polietileno

Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de tragatormentas

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Marín

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

C.C.P.

Contralor Interno


C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024		
No. de obra:	2024-3090900103		Periodo:	OCTUBRE		Número de estimación:			
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA							Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
	CALLE MOA ENTRE LAS CALLES FLAMINGOS Y FINAL DE CALLE MOA EN LA COLONIA ZIPOR							Fecha de revisión:	27/11/2024

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024		
No. de obra:	2024-3090900103		Periodo:	OCTUBRE		Número de estimación:			
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MOA ENTRE LAS CALLES FLAMINGOS Y FINAL DE CALLE MOA EN LA COLONIA ZIPOR							Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
								Fecha de revisión:	27/11/2024

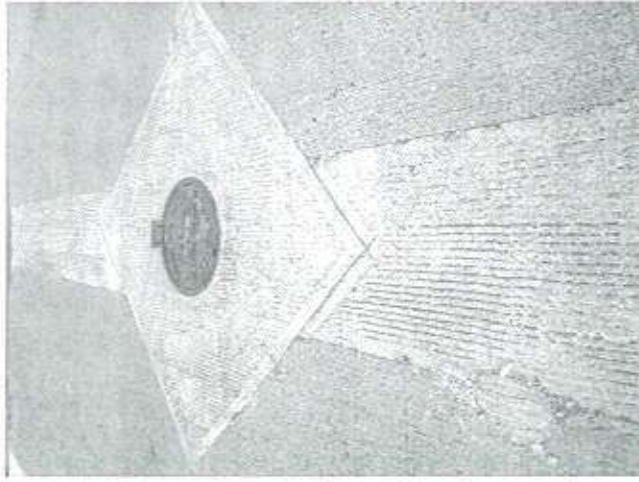

Concepto de obra ejecutado:

toma domiciliaria

Oscar Jay Rojas Ortiz

Supervisor de Obras

ING.

Profesión

 $\gamma, c, \rho,$

U.C.P. Control Interno

Dr. C. P. Tesorero Municipal

...c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p.: Orfis

RE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


DATOS GENERALES

Municipio:	NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090104	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE GAVILANES, IGNACIO ZARAGOZA, 2DA. PRIV. DE IGNACIO ZARAGOZA, CALLES SIN				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado: Concepto de obra ejecutado: Habilitado de tomas Domiciliares sobre Ignición Zaragoza

Observaciones:


Tabir Jaime Amémez

Residente de Obra en funciones de Supervisor de


Obra
ARQ.

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024309090105	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS, ENTRE CALLE DUJAZNOS Y AV. TEBOL, COLONIA LOS PRADOS Y		Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS	
		Fecha de revisión: 22/11/2024	

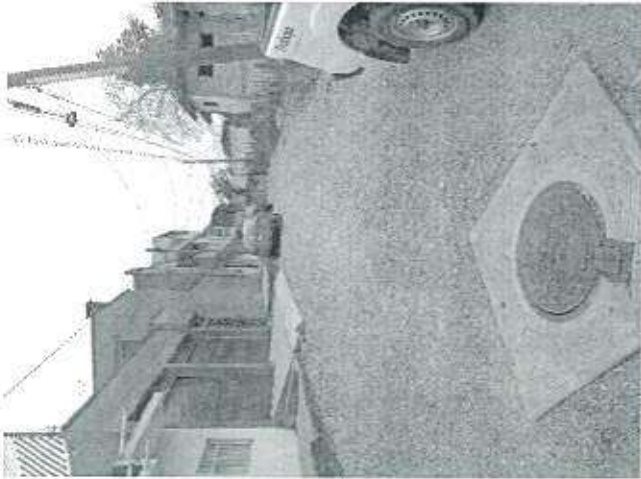

Concepto de obra ejecutado: Instalación de brocal de polietileno en calle Río Colorado



Concepto de obra ejecutado: Rehabilitación de descarga domiciliar en calle Río Colorado

Observaciones:


Luis Ángel Avelino Martín

Supervisor de Obras

ARQ. Profesión

- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfís



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	JMPCIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	202-4309090106	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS.				
	FRAMBOYANES ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CHOFERES, COL. ARBOLEDAS DEL				
	Fecha de revisión: 22/11/2024				



Concepto de obra ejecutado:

Instalación de piezas especiales de fo,fo sobre calle Arroyanos

Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material calizo

Observaciones:

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Publicas

C.C.P. Orfís

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	20243090107	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTUARIO EN LA CALLE JUPITER ENTRE LA AV. POPOCATEPETL Y FINAL DE LA CALLE, CALLE VENUS ENTRE CALLE				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

Instalación de adoquin

Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de toma domiciliar

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Mayán

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Ofici

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090109	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS.				
	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (ENTRE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSTIO Y CALLE VICENTE Fecha de revisión: 22/11/2024				



Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de descargas domiciliarias en calle Gustavo Díaz Ordaz

Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de pavimento de concreto en calle Gustavo Díaz Ordaz

Observaciones

--	--

Luis Angel Avelino Martín

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

C.C.P. Controlador Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	20243090901110	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DOROTEO ARANGO (ENTRE LA AVENIDA ANTONIO CHEDRAUI, CARAM Y LA CALLE				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado: rehabilitado de registros sanitarios

Concepto de obra ejecutado: rehabilitado de tomas domiciliarias

Observaciones:

Ruben Orta Morales Bandala
Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

c.c.p. Controlador Interno


c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090111	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO POR MÉTODO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA CALLE		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024

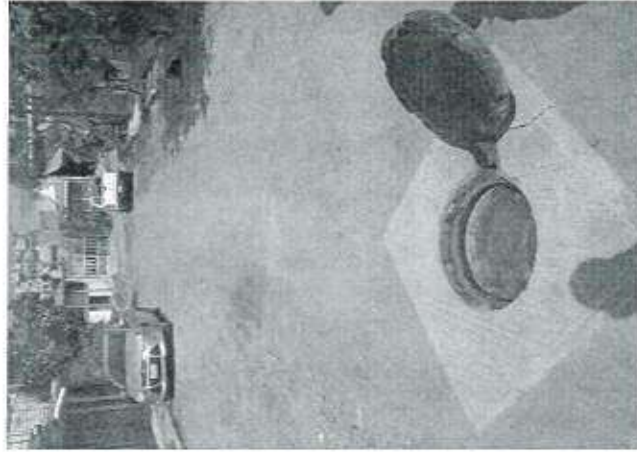

Concepto de obra ejecutado:	Estado actual de colocación de brocal de polietileno	Concepto de obra ejecutado:	Estado actual de colocación de brocal de polietileno
Observaciones:		Juan Ortiz Leguía Supervisor de Obras	
		ING. CIVIL Profesión	
		C.C.P. Contralor Interno	
		C.C.P. Tesorero Municipal	
		C.C.P. Director de Obras Públicas	
		C.C.P. Orfís	



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024309090112	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CIUDAD DE LAS FLORES ENTRE CALLES VERACRUZ Y DIODORO BATALLA EN LA COLONIA RUBÉN PABELLO ACOSTA, EN		Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	
		Fecha de revisión: 25/11/2024	



Concepto de obra ejecutado:

reposición de concreto hidráulico sistema pluvial

Concepto de obra ejecutado:

estado actual de escalinata

Observaciones:

Héctor Ali Montemirra Medel
Supervisor de Obras

ING.

Profesión

- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfís

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024-309090113	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LAS PARCELAS Y CALLE 22 DE FEBRERO, DE LA COLONIA				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

pozo de visita

Concepto de obra ejecutado:

registro sanitario

Observaciones:

Oscar Rojas Ortiz

Supervisor de Obras

ING.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Publicas

C.C.P. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090114	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR NEYRA ENTRE LA AV. RAFAEL MURILLO VIDAL Y FINAL DEL ANDADOR NEYRA; REHABILITACIÓN Y				
				Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

construcción de pozos de visita en calle neyra

Concepto de obra ejecutado:

punto de conexión del andador neyra

Observaciones:

Ruben Omar Morales Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

c.c.p.

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas


c.c.p. Orfís

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

TE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024309090115 Período: OCTUBRE Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTOR PLUVIAL Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MALLORCA, ENTRE CALLES CASTILLA Y APALACHES; CALLE CIRCUITO Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
Fecha de revisión: 22/11/2024

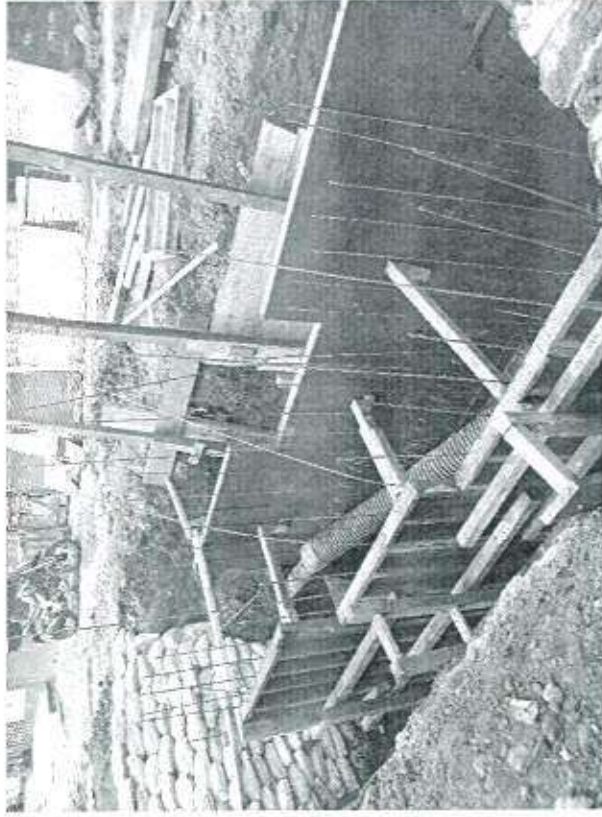

Concepto de obra ejecutado: Construcción de caja de caída escalonada tubería de PEAD de 1.20 m

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Carlos Gustavo Hernández Paredes
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión del Supervisor
c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	AYUNTAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090115	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTOR PLUVIAL Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MALLORCA, ENTRE CALLES CASTILLA Y APALACHES, CALLE CIRCUITO		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado: construcción de caja de caída escalonada para tubería de 1.20 m

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:	
Supervisor de Obras	
Carlos Gustavo Hernández Paredes	
A.R.Q.	
Profesión	
C.C.P. Contralor Interno	
C.C.P. Tesorero Municipal	
C.C.P. Director de Obras Públicas	
C.C.P. Orfís	

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024		
No. de obra:	2024309090116		Periodo:	OCTUBRE		Número de estimación:			
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA VICENTE GUERRERO, CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, 23 DE MARZO,							Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
								Fecha de revisión:	22/11/2024

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024		
No. de obra:	2024309090116		Periodo:	OCTUBRE		Número de estimación:			
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA VICENTE GUERRERO, CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, 23 DE MARZO,							Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
								Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra
ejecutado:

Observaciones:

ING. CIVIL
Profesión

x.c.p.
x.c.p. Contralor Interno
x.c.p. Tesorero Municipal
x.c.p. Director de Obras
c.c.p. Ofis.

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	JUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024300900118	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS				
	LAUREL, (ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y CIPRES), EN LA COLONIA BOSQUES DE LAS				
	Fecha de revisión: 22/11/2024				



Concepto de obra ejecutado:

construcción de registro sanitario

Concepto de obra ejecutado:

construcción de pozo de visita

Observaciones:

Oscar Jay Rojas Ortiz

Supervisor de Obras

TNG.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	JMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024/09/090120	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LAUREL, ENTRE CALLES HUIZACHAL Y ENCINOS, COLONIA HIGUERAS Y REHABILITACION		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

registro sanitario

Concepto de obra ejecutado:

registro sanitario

Observaciones:

Oscar Jay Rojas Ortiz
Supervisor de Obras

ING.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Publicas

C.C.P. Oficia

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	JUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309080123	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN VARIAS CALLES (FRESNO, EUCALIPTO, ENCINOS, HAYAS Y NISPEROS), Y REHABILITACIÓN DE				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

Concepto de registro de albañal

Observaciones:

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Ofiis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	JUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309080124	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE Z, MERCADO, ENTRE CALLES AVENIDA FERROCARRIL INTEROCEANICO Y AVENIDA ENCANTO Y PRIVADA		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

tendido de calizo

Concepto de obra ejecutado:

toma domiciliaria

Observaciones:

Oscar Jari Rojas Ortiz
Supervisor de Obras


ING.

Profesión

- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Publicas
- c.c.p. Orfis

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


DATOS GENERALES			
Municipio:	NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090125	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINES, ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y PROLONGACIÓN VILLA HERMOSA, EN		
	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024	
	Número de estimación:		
	Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS	
	Fecha de revisión:	22/11/2024	

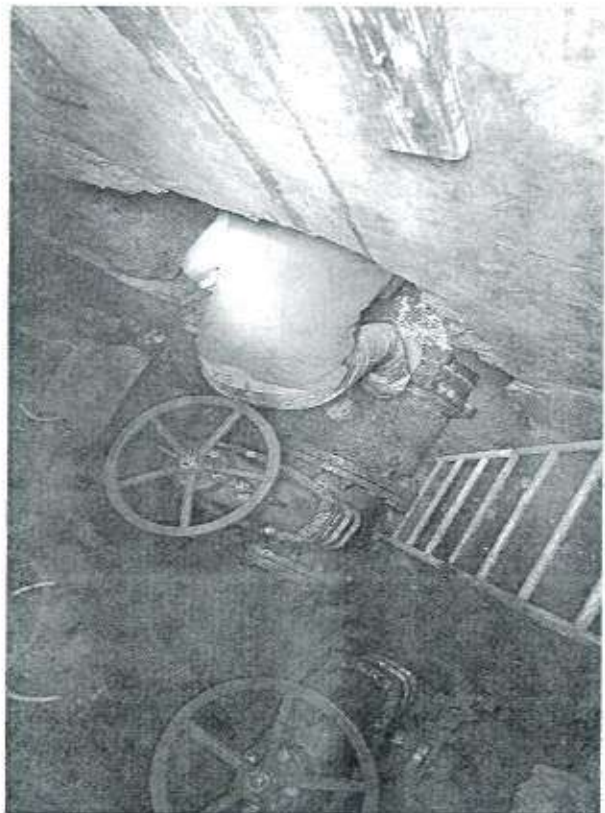

Concepto de obra ejecutado: Lique en valvulas de 18" sobre cruce Acueducto con Av. Ruiz Cortinez

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:


Jabir Jamez Jimenez
Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra ARQ.

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024-309090127	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HIGUERAS, PRIVADA HIGUERAS, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA, PRIVADA HIGUERAS,				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material de base tipo calizo

Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material de base tipo calizo

Observaciones:


Juan Ortiz Valdes	Supervisor de Obras
ING. CIVIL	Profesión
C.C.P. Contralor Interno	
C.C.P. Tesorero Municipal	
C.C.P. Director de Obras Publicas	
C.C.P. Orfis	

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUÉZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024309090128 Período: OCTUBRE Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
RICARDO FLORES MAGÓN, ENTRE LAS FLORES Y EDUARDO MARQUINA, DE LA COLONIA Fecha de revisión: 22/11/2024

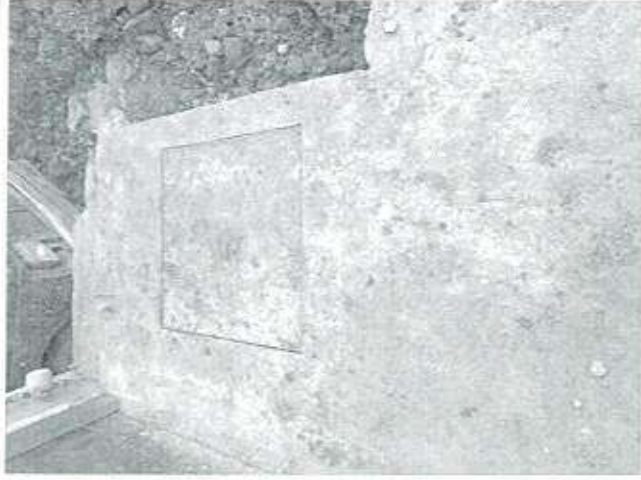

Concepto de obra ejecutado:

registro sanitario

Concepto de obra ejecutado:

construcción de registro sanitario

Observaciones:

Oscar Jall Rojas Ortiz

Supervisor de Obras

ING.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Otros

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024309060179	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA 3A PRIV. DE LINO SERRANO ENTRE LINO SERRANO Y FINAL DE LA PRIVADA Y AVD. SIN		Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	
		Fecha de revisión: 22/11/2024	



Concepto de obra ejecutado:

Pozo de Visita sobre Andador sin nombre y relleno de Zanja con material de excavación

Concepto de obra ejecutado:

Demolición de concreto en barqueta para excavación de Zanja para red hidráulica

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra

ARQ.

Profesión

C.C.P.

Contralor Interno


C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024309080130	Período: OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ZAFIRO, ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y CALLE ZAFIRO; REHABILITACIÓN		Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	
		Fecha de revisión: 22/11/2024	

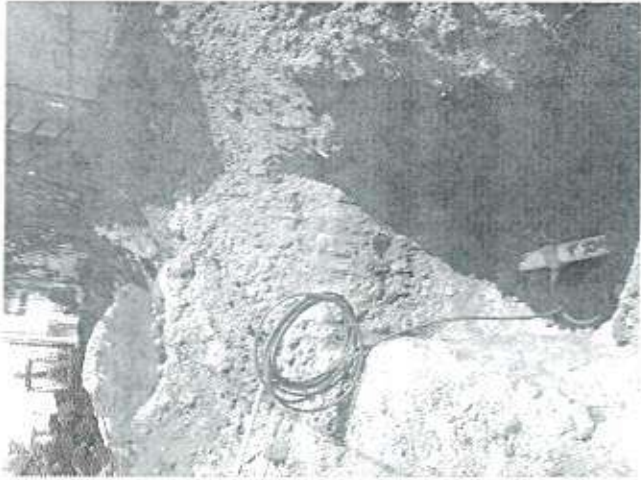

Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de toma domiciliaria

Concepto de obra ejecutado:

Construcción de registro de albanil

Observaciones:

Juan Ortiz Yagüez	
Supervisor de Obras	
ING. CIVIL	Profesión
C.C.P. Contralor Interno	
C.C.P. Tesorero Municipal	
C.C.P. Director de Obras Públicas	
C.C.P. Otros	

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	LOCALIDAD:	Ejercicio fiscal:
AYUNTAMIENTO	XALAPA-ENRIQUEZ	2024
No. de obra:	Periodo:	Número de estimación:
202409090131	OCTUBRE	1
Descripción:	Fuente de financiamiento:	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CARLOS R. SMITH, CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PRIMAVERA Y REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE	INGRESOS PROPIOS	
		Fecha de revisión:
		22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

colocación de piezas en cruce

Concepto de obra ejecutado:

colocación de piezas en cruce

Observaciones:


Blanca Aurora Anell Flores

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

- c.c.p. Controlador Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orlis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090132	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO AMARILLO, ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE RIO VERDE, DE LA COL. CAROLINO ANAYA.		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

demolición de concreto para red de agua potable

Concepto de obra ejecutado:

excavación para construcción de pozo de visita

Observaciones:

Héber A. Montemirza Medel
Supervisor de Obras

ING.
Profesión
C.C.P. Contralor Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Orllis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	UNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024	
No. de obra:	2024-309090133	Período:	OCTUBRE	Número de estimación:		
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4, ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y ANDADOR D, DE LA COLONIA PREDIO DE					
					Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
					Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

Relleno producto de excavación en zanja de agua potable

Concepto de obra ejecutado:

relleno producto de banco en zanja de agua potable

Observaciones:

Juan Ortiz Lagunas	
Supervisor de Obras	
ING. CIVIL	
Profesión	
c.c.p.	Contralor Interno
c.c.p.	Tesorero Municipal
c.c.p.	Director de Obras Públicas
c.c.p.	Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	202430900134	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AVENIDA MARFIL, ESMERALDA, ROQUETA, AZABACHE, ZAFIRO, CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2, ENTRE		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:	instalación de piezas especiales en andador sin nombre	Concepto de obra ejecutado:	instalación de tubería en avenida marfil
Observaciones:			
		<div><div>Juan Ortiz Lagunes</div><div>Supervisor de Obras</div><div>ING. CIVIL</div><div>Profesión</div></div>	
		<div><div>X.C.P.</div><div>Contralor Interno</div><div>X.C.P.</div><div>Tesorero Municipal</div><div>X.C.P.</div><div>Director de Obras Públicas</div><div>X.C.P.</div><div>Orfís</div></div>	

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090136	Periodo:	OCTUBRE
Descripción:	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y REHABILITACIÓN DE OBRA DE CANALIZACIÓN DEL ARROYO CHORREADO PARA SALVAGUARDAR EL COLECTOR SANITARIO MARGINAL, A		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	25/11/2024




Concepto de obra ejecutado:

Trazo y corte de material en Talud

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:


Jabin James Jiménez
Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra ARQ.

Profesión del Supervisor


c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orffis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090137	Período:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR ARBOLEDAS ENTRE CALLE TUXTEPEC Y FINAL DE LA CALLE DE LA COLONIA RAFAEL				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024

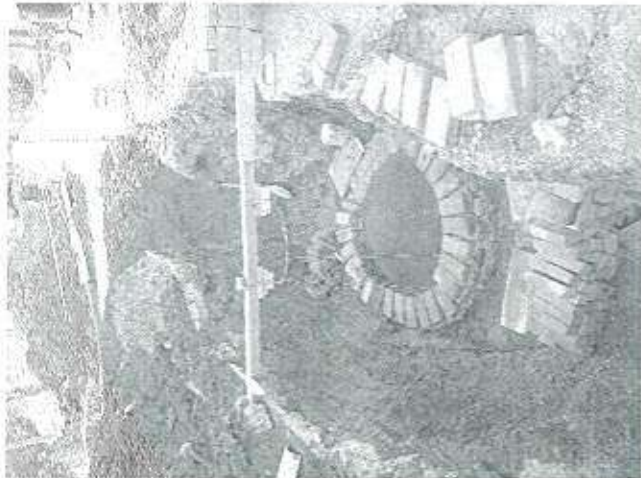

Concepto de obra ejecutado:

construcción de pozo sanitario

Concepto de obra ejecutado:

Registro sanitario

Observaciones:

Bianca Aurora Anelli Flores

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

C.C.P.

Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio: NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024309090138		Periodo: OCTUBRE	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HILANDERAS ENTRE CALLES CIRCUITO 1 Y ESTIBADORES, COL. MIGUEL ALEMÁN, EN		Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión: 22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

construcción de registro sanitario

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:


Oscar Jair Rojas Ortiz
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis




AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

TE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090140	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JAZMÍN ENTRE LA CALLE LUIS DORANTES Y CALLE ALFREDO SERRANO, COL. PORTÓN				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024

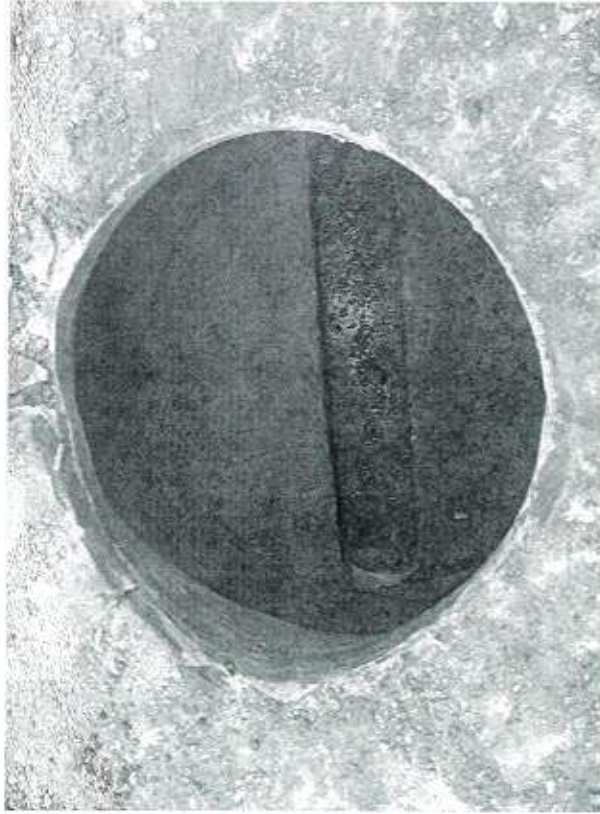

Concepto de obra ejecutado: Pozo sanitario

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:


Blanca Aurora Anel Flores
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión del Supervisor
c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309060141	Período:	OCTUBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS ANDES ENTRE CALLE LA CASTILLA Y AV. NIAGARA, EN ANDADOR UNO ENTRE CALLE LOS ANDES Y AV. MONTES		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	22/11/2024



Concepto de obra ejecutado:

excavación con equipo en material tipo c

Concepto de obra ejecutado:

Excavación con equipo en material C

Observaciones:

Carlos Gustavo Hernández Paredes

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

c.c.p. Contador Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRIQUÉZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024309090142	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación: INGRESOS PROPIOS	
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CIRCUITO JACARANDAS ENTRE CALLE DURAZNO Y FINAL DE LA CALLE, EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL EL		Fecha de revisión: 22/11/2024	



Concepto de obra ejecutado:

trabajos de trazo y corte con cortadora de disco

Concepto de obra ejecutado:

trazo y corte con cortadora de disco en calle circuito Jacarandas

Observaciones:



Carlos Gustavo Hernández Paredes
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión
C.C.P. Contador Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Ofis

TE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090143	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SILVESTRE REVUELTA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE JOSE ROLON DE LA COLONIA INDECO			Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	25/11/2024

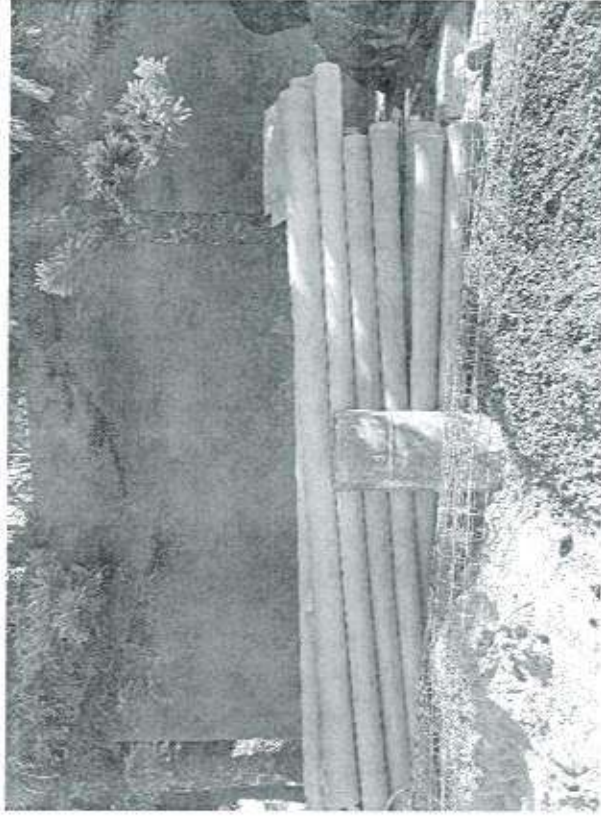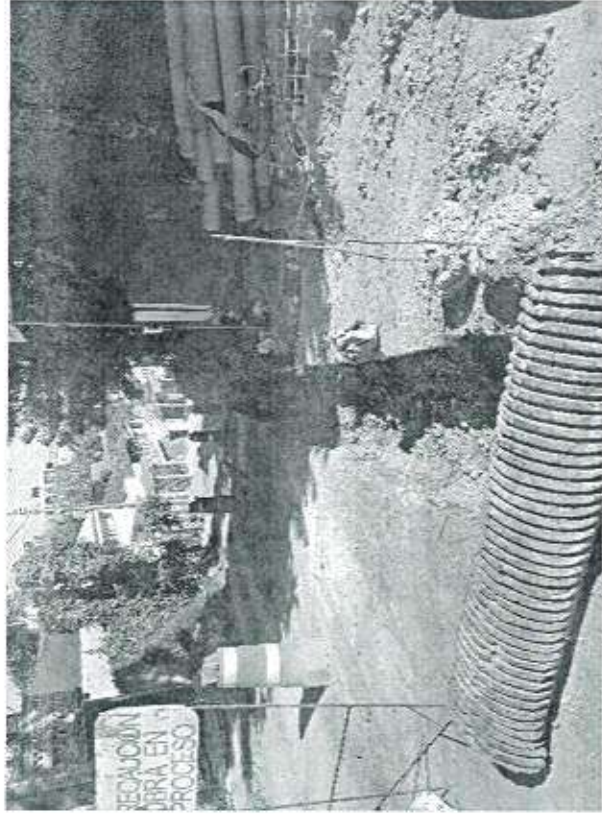

Concepto de obra ejecutado:

Corte y excavación para red de Drenaje Sanitario

Concepto de obra ejecutado:

Suministro de Tubería PVC Sanitario para rehabilitación de Red Sanitaria

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de

Obra
ARQ.

Profesión del Supervisor


- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfís

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	JUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090141	Período:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GONZALO VÁZQUEZ VELA ENTRE CALLE BOULEVARD DIAMANTE Y CALLE JORGE CERDAN Y				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	22/11/2024

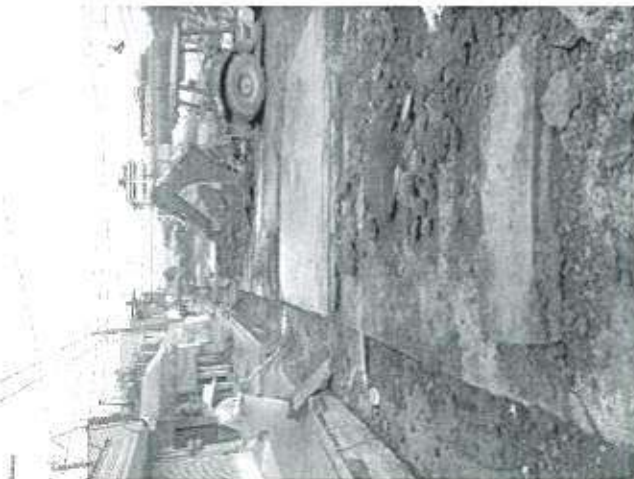

Concepto de obra ejecutado:

excavación para rehabilitación de agua potable

Concepto de obra ejecutado:

construcción de registro sanitario

Observaciones:

ING. ALI MOPTENHRA MEDEL
Supervisor de Obras

ING.

Profesión

- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfís
