

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	DESCRIPCION DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	
		XALAPA-ENRIQUEZ 2024309090001	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR III. MUNICIPIO DE XALAPA. VERACRUZ.

[illegible][illegible]

B) REPORTE		FECHAS
	EXISTE	
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$335,849.26	19/11/2024
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$658,134.33	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

OBSERVACIONES:	
----------------	--

* En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR III, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE DEL 99%	

MONTO AUTORIZADO:		\$2,000,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$2,000,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			X
DEPENDENCIA DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACILIDAD:			X
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA	
		EXISTE	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X
	licitación pública		

NO. DE CONTRATO:	CMAS-SR-003-2024	FECHA:	26/06/2024
CONTRATISTA:	F & C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV		
RFC:	F&C020430RX2		
MONTO CONTRATADO:	\$1,991,368.26	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	26/06/2024	26/06/2024
	TERMINO	22/12/2024	
	DÍAS	180	158
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:	\$0.00	PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:	0.00	

TIPO DE FINANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFANIZADO:	\$398.273.65	\$171.669.68	
AFANIZADORA:	INSTITUCION DE GARAT INSTITUTION DE GARAN		
No. DE FINANZA:	1423-03030-8	1423-03031-5	
FECHA:	27/06/2024	27/06/2024	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE IMPORTE/PERIODO	
	PLAZO	INICIAL FINAL	
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRA:		\$1,991,368.26	6/IVA

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Gilberto Montero Pérez
OTRO EN FUNCIONES DE SUPERVISOR
DE OBRA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
28/11/2024
MES QUE SE REPORTA
NOVIEMBRE

[illegible]

Ing. Adán Burgos Monfil

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	03/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ

FEUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

No. DE OBRA: 2024309090003

PLANEAACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

CLAVE: N/A

AGEB: SI NO X

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD -96.846645000

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE: N/A

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD -96.846645000

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

FACTURAS

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE	No.	MONTO	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
5N	\$676,064.53	SPEI	\$571,138.69	80795	\$676,064.53	\$102,011.77	\$2,914.07	\$0.00	\$571,138.69
4B	\$1,763,698.75	SPEI	\$1,226,986.97	CD416	\$1,763,698.75	\$529,109.63	\$7,602.15	\$0.00	\$1,226,986.97
4N	\$873,001.53	SPEI	\$607,338.13	A5000	\$873,001.53	\$261,900.46	\$3,762.94	\$0.00	\$607,338.13
2B	\$360,707.05	SPEI	\$250,940.16	23EAC	\$360,707.05	\$108,212.12	\$1,554.77	\$0.00	\$250,940.16
2N	\$207,869.01	SPEI	\$144,612.32	D2138	\$207,869.01	\$62,360.70	\$895.99	\$0.00	\$144,612.32
1A	\$160,558.74	SPEI	\$111,699.06	0E013	\$160,558.74	\$48,167.62	\$692.06	\$0.00	\$111,699.06
1N	\$266,873.79	SPEI	\$185,661.33	9163D	\$266,873.79	\$80,062.14	\$1,150.32	\$0.00	\$185,661.33
ANTICIPO	\$1,461,496.74	spei	\$1,461,496.74	2FE39	\$1,461,496.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,496.74
3N	\$898,907.66	SPEI	\$625,360.76	EFA3F	\$898,907.66	\$269,672.30	\$3,874.60	\$0.00	\$625,360.76
TOTALES	\$5,207,681.06		\$3,723,737.42		\$5,207,681.06	\$1,461,496.74	\$22,446.90	\$0.00	\$5,185,234.16

B) REPORTE

EXISTE

MONTO PAGADO EN EL MES:	FECHAS
\$571,138.69	29/11/2024
\$3,723,737.42	
\$0.00	

MONTO PAGADO ACUMULADO:

FINQUITO CON IVA:

ACTA ENTREGA RECEPCION:

OBSERVACIONES:

MONTO AUTORIZADO: \$5,356,000.00

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$5,356,000.00

VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA CMAS

FACTIBILIDAD: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA

LOS PERMISOS: EXISTE

TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA INVITACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA

NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-082-2024

FECHA: 25/06/2024

CONTRATISTA: MECANICA HIDRAULICA DE PRECISION DOS SA DE CV

RFC: MHP091014FC3

MONTO CONTRATADO: \$4,871,655.79

PROGRAMADA REAL

PERIODO DE EJECUCION: INICIO 25/06/2024

TERMINO 22/09/2024

DIAS 90

APLICA X NO APLICA

MONTO: \$1,461,496.73

PORCENTAJE: 30.00

FECHA DE PAGO: 08/07/2024

ANTICIPO:

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO

CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO: \$1,461,496.74

\$419,970.33

AFIANZADORA: URADORA ASERTA, S.A. QUADORA ASERTA, S.A. D

NO. DE FIANZA: 4426-07795-0

FECHA: 25/06/2024

EXISTE

IMPORTE PERIODO

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO PLAZO INICIAL FINAL

NO APLICA X

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$4,871,655.79

C/IVA

Ing. Adán Burgos Monfil

DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Juan Ortiz Lagunes

SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

1 de 1

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	19/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024-30900008
DESCRIPCION DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA ENTRE CALLES AVENIDA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, CALLE	

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA ENTRE CALLES AVENIDA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, CALLE DURAZNO Y CALLE MELÓN; CALLE DURAZNO, ENTRE CALLES HORTENCIA Y CAROLINO ANAYA, COL. AMPLIACIÓN VASCONCELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.	

DESCRIPCION DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 100%	

DESCRIPCION DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 100%	

DESCRIPCION DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 100%	

DESCRIPCION DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 100%	

DESCRIPCION DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 100%	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*	
FACTURAS	
No. EST.	No.
3A	000314E
3N	0313E
2N	000312E
ANTICIPO	50081
1N	D3319
FINIQUITO	325E

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*	
FACTURAS	
No. EST.	No.
3A	000314E
3N	0313E
2N	000312E
ANTICIPO	50081
1N	D3319
FINIQUITO	325E

B) REPORTE	
FECHAS	
Monto pagado en el mes:	\$0.00
Monto pagado acumulado:	\$1,503,996.96
Finiquito con IVA:	\$0.00
Acta entrega recepción:	

OBSERVACIONES:	

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	18/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE



A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	2024309090034
		DESCRIPCION DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE			

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:			
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VERACRUZ.			
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:			
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99.1%			

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:			
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VERACRUZ.			
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:			
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99.1%			

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:			
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VERACRUZ.			
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:			
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99.1%			

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:			
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VERACRUZ.			
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:			
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99.1%			

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:			
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VERACRUZ.			
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:			
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99.1%			

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:			
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VERACRUZ.			
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:			
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99.1%			

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:			
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HAYA, ENTRE CALLE HUIZACHAL Y CALLE TAJIN Y CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE HAYA, COLONIA LOS PRADOS, EN XALAPA, VERACRUZ.			
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:			
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99.1%			



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	18/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	2024309090037
		DESCRIPCION DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAMINO A AGUA SANTA, ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. LAZARO CÁRDENAS EN			

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:			
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAMINO A AGUA SANTA, ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA BADILLO, XALAPA, VERACRUZ.			

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:			
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 94%			

MONTO AUTORIZADO:			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:			
VALIDACION DEL PROYECTO:			
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:			
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
PERMISOS Y CONCESIONES:			
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			
TIPO DE LICITACION:			
ADJUDICACION DIRECTA			
LICITACION A MENOS 3 PERSONAS			
X			

NO. DE CONTRATO:			
CONTRATISTA:			
RFC:			
MONTO CONTRATADO:			
PERIODO DE EJECUCION:			
ANTICIPO:			
FECHA DE PAGO:			
FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:			
MONTO AFIANZADO:			
AFIANZADORA:			
No. DE FIANZA:			
FECHA:			
CONVENIO MODIFICATORIO:			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			
Ing. Adán Burgos Montfil			
DIRECTOR DE OBRAS			
Ing. Civil Rubén Omar Morales Bandala			
SUPERVISOR DE OBRAS			

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA *			
FACTURAS			
IMPORTE OBRA			
MONTO CON IVA			
ESTIMACION			
5 MILLAR			
CARGOS ADICIONALES			
IMPORTE NETO			
5			
5B			
4A			
3A			
2A			
3N			
ANTICIPO			
1N			
2N			
4N			
5N			

PÓLIZAS CHEQUE			
No. EST.			
MONTO CON IVA			
SPEI			
5			
5B			
4A			
3A			
2A			
3N			
ANTICIPO			
1N			
2N			
4N			
5N			

B) REPORTE			
EXISTE			
\$0.00			
\$2,224,455.15			
\$0.00			
FECHAS			
MAY			
JUN			
JUL			
AUG			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			

AVANCE FISICO REAL			
AVANCE			
PROGRAMADO			
REAL			
ACUMULADO			
ATRASSO (%)			

MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:
A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES		
XALAPA-ENRIQUEZ		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
20243090900038		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA Pío NAQUINCO, ENTRE CALLES RICARDO DE LA HERRERA Y CALLE...

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA:	CLAVE AGENB:	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	Y	NO
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			

COORDENADAS DE GEOREFERENCIA		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
1	2	3
4	5	6

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 99%

[illegible]

										TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE
										ADJUDICACIÓN DIRECTA	
										INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
										licitación pública	

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-029-2024		FECHA:		22/02/2024	
CONTRATISTA:		INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACION SA DE CV					
REF:		IIC060126GK8					
MONTO CONTRATADO:		\$1,386,900.35		C/IVA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL			
		INICIO		23/02/2024		23/02/2024	
		TÉRMINO		21/06/2024			
ANTICIPO:		DÍAS		120		252	
		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$415,931.41		PORCENTAJE: 29.99	
		FECHA DE PAGO:		01/03/2024			

B) REPORTE		AVANCE FÍSICO REAL											
EXISTE		FECHAS											
Monto pagado en el mes:		\$0.00											
Monto pagado acumulado:		\$289,063.93											
Finiquito con IVA:		\$0.00											
Acta entrega recepción:													
OBSERVACIONES:													

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
Monto Afianzado:	\$416,070.11	\$119,560.38		
Afianzadora:	SURA ASERTA, SA DEURADORA ASERTA, SA D			
No. de fianza:	4125-01196-5	4125-01197-0		
Fecha:	22/02/2024	22/02/2024		
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	INICIAL	FINAL	
		NO APLICA	X	
Monto total contratado (convenio + contrato) de obra:			\$1,386,900.35	C/IVA

Arq. Carlos Gustavo Hernández Paredes
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACIÓN:	18/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE



A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	2024309090044
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
		REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A COATEPEC ENTRE CALLE ENRIQUE RODRIGUEZ Y CALLE ESMERALDA Y RED DE AGUA	

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	19.508910000	LONGITUD	-96.926395100

GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
			MUY BAJO
			X
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA

No. EST.		CÓDIGO CONTRATO		No.	MONTO	No.	MONTOS CON IVA ESTIMACIÓN	MONTOS CON IVA CON IVA	5 MILLAR	ADICIONALES	NETO
ANTICIPO		1N		SPEI	\$1,050,981.52	B3680	\$1,050,981.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,981.52
				SPEI	\$366,460.30	TK224	\$526,758.30	\$158,027.49	\$2,270.51	\$0.00	\$366,460.30

B) REPORTE		AVANCE FISICO REAL											
EXISTE		FECHAS											
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00												
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$366,460.30												
FINQUITO CON IVA:	\$0.00												
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:													
OBSERVACIONES:													

TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS	
MONTO AFANIZADO:		\$1,050,981.52		\$302,006.00			
AFIANZADORA:		INSTITUCION DE GARAN		INSTITUCION DE GARAN			
No. DE FIANZA:		2894116		2894126			
FECHA:		28/02/2024		28/02/2024			
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE		IMPORTE/PERIODO		FECHA	
		MONTO					
		PLAZO		INICIAL		FINAL	
NO APLICA		X					
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$3,503,271.75				C/IVA	

OBSERVACIONES:													

Ingeniero: Adán Burgos Montañal	Arq. Carlos Gustavo Hernández Paredes
DIRECTOR DE OBRAS	SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACIÓN:	18/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	2024309090051
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS LASCURAIN, ENTRE PROLONGACIÓN LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS,			

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:			
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
ZONA:	AGEB:		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	NO	NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO	DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA								
LATITUD		19.516547900		LONGITUD		-96.931751300		
C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA *								
		POLIZAS CHEQUE		FACTURAS				
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:								
AVANCE FÍSICO DEL 99%								

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA *									
No. EST.	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS		5 MILLAR		CARGOS ADICIONALES		IMPORTE NETO
	No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA				
1N	SPEI	\$291,558.77	44280	\$419,093.16	\$125,727.95	\$1,806.44	\$0.00	\$291,558.77	C/IVA
ANTIPO	SPEI	\$568,338.97	42F00	\$568,338.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,338.97	C/IVA
1A	SPEI	\$8,374.18	DE547	\$8,374.18	\$2,512.25	\$36.10	\$0.00	\$5,825.83	NO APLICA
2N	SPEI	\$433,727.47	4CD27	\$433,727.47	\$130,118.24	\$1,869.51	\$0.00	\$301,739.72	NO APLICA
2A	SPEI	\$151,318.08	63005	\$151,318.08	\$45,395.42	\$652.23	\$0.00	\$105,270.43	CMAS
3N	SPEI	\$311,058.06	4EA64	\$311,058.06	\$93,317.42	\$1,340.77	\$0.00	\$216,399.87	NO APLICA
3A	SPEI	\$91,929.69	8389F	\$91,929.69	\$39,642.55	\$569.58	\$0.00	\$91,929.69	NO APLICA
LOS PERMISOS:									
H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.									
TIPO DE LICITACIÓN:									
ADJUDICACIÓN DIRECTA									
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS									
LICITACIÓN PÚBLICA									
EXISTE									
X									

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-050-2024	FECHA:	28/02/2024
CONTRATISTA:	MIGUEL TELLO SEGURA		
RFC:	TESM5305082E3		
MONTO CONTRATADO:	\$1,894,463.23	PROGRAMADA	REAL
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	29/02/2024	29/02/2024
	TÉRMINO	27/06/2024	
	DÍAS	120	246
ANTIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$568,338.96	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	13/03/2024	

TIPO DE FIANZA:	ANTIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$568,338.97	\$163,315.80	
AFIANZADORA:	INSTITUCION DE GARAN	INSTITUCION DE GARAN	
NO. DE FIANZA:	2893652	2893655	
FECHA:	28/02/2024	28/02/2024	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO	NO APLICA	
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,894,463.23		C/IVA

Ing. Adán Burgos Monfil		Residente de obra en funciones de	
DIRECTOR DE OBRAS		CI DE PUESTO DE OBRA	
		FORMATO 11	

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024



FECHA DE ELABORACION:	28/11/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024309090056
DESCRIPCION DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO A SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES AZUCENA Y SANTA TEODORA EN LA COLONIA SANTA ROSA, XALAPA, VERACRUZ.	

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO A SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES AZUCENA Y SANTA TEODORA EN LA COLONIA SANTA ROSA, XALAPA, VERACRUZ.	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DEL 99%	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DEL 99%	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DEL 99%	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DEL 99%	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DEL 99%	

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DEL 99%	



EJERCICIO 2024

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	
	XALAPA-ENRIQUÉZ	
	20243090900058	

[illegible][illegible]

NO. DE CONTRATO:		CMAS-SR-001-2024		FECHA:		12/03/2024	
CONTRATISTA:		GRUPO DESARROLLADOR DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS					
RFC:		GDI200421180					
Monto Contratado:		\$4,658,850.00		C/IVA			
		PROGRAMADA		REAL			
		INICIO		12/03/2024		12/03/2024	
		TÉRMINO		31/12/2024			
PERIODO DE EJECUCIÓN:		DÍAS		295		264	
		APLICA		X		NO APLICA	
ANTICIPO:		MONTO:		\$1,863,540.00		PORCENTAJE: 40.00	
		FECHA DE PAGO:		14/03/2024			

[illegible]

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	19/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE


MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIRCUITO LAS FLORES, DE CAMINO AL SUMIDERO A CAMINO AL SUMIDERO, COLONIA EL	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2024309090063		DESCRIPCION DE LA OBRA:			

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:				Antecedentes:		Descripción detallada del objeto (meta) de la obra:			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				SI	X	NO	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIRCUITO LAS FLORES, DE CAMINO AL SUMIDERO A CAMINO AL SUMIDERO, COLONIA EL TANQUE, XALAPA, VERACRUZ.		
TIPO DE ZONA:				CLAVE AGEB:			GRADO DE REZAGO SOCIAL:		
RURAL				N/A			MUY ALTO	ALTO	BAJO
URBANA									
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				SI		NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		
									MUY BAJO
							X		

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATTIUD	19.554085200
LONGITUD	-96.893537600

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
POLIZAS CHEQUE			FACTURAS						
No. EST.	MONTO CON IVA	No.	MONTO	SPEI	No.	A122	A122	A122	A122
3A	\$37,722.47		\$25,106.76						
2N	\$141,273.74		\$98,282.68						
1N	\$214,054.65		\$214,054.65						
ANTICIPO	\$216,842.70		\$216,842.70						
2A	\$138,877.30		\$96,615.50						
3N	\$138,536.16		\$96,378.17						
TOTALES	\$670,464.32		\$465,298.71						

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-072-2024		FECHA:		01/05/2024			
CONTRATISTA:		CONSORCIO CONSTRUCTOR CASTILLO & OLIVO, SA DE CV							
RFC:		CCC180509775							
MONTO CONTRATADO:				S722,809.02		C/IVA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL			
				INICIO		01/05/2024			
				TERMINO		29/07/2024			
		DÍAS		90		184			
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA			
		MONTO:		S216,842.70		PORCENTAJE:		29.99	
		FECHA DE PAGO:				09/05/2024			



EJERCICIO 2024

COMPTON MULTICORP. OF AGLA POSTAGE

[illegible]

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	19/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	REHABILITACION DE RED DE DE AGUA POTABLE EN CALLE MAGNOLIA, ENTRE CALLE CLAVES Y CALLE JUAN PABLO ALDASORO CON REHABILITACION DE RED DE DE AGUA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024309090064	DESCRIPCION DE LA OBRA:

ANTECEDENTES:		
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	N/A
ZONA: RURAL	URBANA	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD	19.570281600
LONGITUD	-96.897120200

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
FACTURAS					POLIZAS CHEQUE				
No. EST.	MONTO CON IVA	No.	MONTO	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA	AMORTIZADO CONTRA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO	
1N	\$267,658.11	A63	\$186,206.98	\$267,658.11	\$80,297.43	\$1,153.70	\$0.00	\$186,206.98	
ANTICIPO	\$161,147.20	60D28	\$161,147.20	\$161,147.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,147.20	
TOTALES									
	\$267,658.11		\$186,206.98	\$267,658.11	\$80,297.43	\$1,153.70	\$0.00	\$347,354.18	

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-059-2024	FECHA:	04/04/2024
CONTRATISTA:		SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA SA DE CV		
RFC:		SCC180425KH7		
MONTO CONTRATADO:		\$537,157.35	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCION:		INICIO 05/04/2024	PROGRAMADA REAL	
		TERMINO 19/05/2024	05/04/2024	
		DIAS 45	210	
ANTICIPO:		APLICA X	NO APLICA	
		MONTO: \$161,093.48	PORCENTAJE: 29.99	
		FECHA DE PAGO:	12/04/2024	

TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$161,147.20	\$46,306.67	
AFIANZADORA:		STITUCION DE GARANTIA INSTITUCION DE GARANTIA	295089	
FECHA:		04/04/2024	04/04/2024	
CONVENIO MODIFICATORIO:		MONTO EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
		PLAZO	INICIAL FINAL	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		NO APLICA	X	
		\$537,157.35		

OBSERVACIONES:		

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
19/12/2024
MES QUE SE REPORTA
NOVIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		
MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:
		XALAPA-ENRIQUEZ 2024309090066
		DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE ALcantarillado PLUVIAL EN LA CALLE HUAJE (ENTRE PRIV. LAS DALIAS Y SALVADOR ALLENDE)- SALVADOR ALLENDE (ENTRE NARANJOS Y HUAJE) DE LA		

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		SI	NO
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A
	URBANA		
GRADO DE REZAGO SOCIAL:		MUY ALTO	MUY BAJO
		ALTO	BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		SI	NO

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO		JX		X		COMPLEMENTARIA		RESTRINGIDA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LONGITUD		LATITUD		19-510841700		-96.869143300	
C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS							
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES: AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 96.04%									

[illegible]

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-062-2024		FECHA:		12/04/2024	
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VASQUEZ SA DE CV					
RFC:		CIV050309AK2					
Monto CONTRATADO:		\$3,080,653.86		C/IVA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL			
		INICIO		13/04/2024		13/04/2024	
		TÉRMINO		09/10/2024			
ANTICIPO:		DÍAS		180		202	
		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$924,196.15		PORCENTAJE: 30.00	
FECHA DE PAGO:		22/04/2024					

[illegible]

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	28/11/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS]

LOCALIDAD: [XALAPA-ENRIQUEZ]

No. DE OBRA: [2024309090069]

PLANEAACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

SI

X

NO

OBRA REALIZADAS CON FISM-DF:

CLAVE

N/A

TIPO DE ZONA:

RURAL

URBANA

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:

SI

NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO

SI

X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD

-96.862176700

LATITUD

19.512811700

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

X

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:

DIRECTA

X

COMPLEMENTARIA

RESTRINGIDA

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

FACTURAS

No. EST.

1N

MONTO CON IVA

\$383,510.00

No.

SPEI

MONTO

\$381,856.94

No.

D2757

IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN

\$383,510.00

AMORTIZADO CON IVA

\$0.00

CARGOS ADICIONALES

\$0.00

IMPORTE NETO

\$381,856.94

B) REPORTE

EXISTE

MONTO PAGADO EN EL MES:

\$381,856.94

MONTO PAGADO ACUMULADO:

\$381,856.94

FINQUITO CON IVA:

\$0.00

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:

FECHAS

20/11/2024

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE

PROGRAMADO

REAL

ACUMULADO

ATRASO (%)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OBSERVACIONES:

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LINO CHAVEZ ZAMUDIO, ENTRE CALLE LORENZO BARCELATA Y ELPIDIO XALLITIC, EN XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LINO CHAVEZ ZAMUDIO, ENTRE CALLE LORENZO BARCELATA Y ELPIDIO RAMIREZ, CON PREPARACION EN CALLE MARIA GREBER, DE LA COL.FRACCIONAMIENTO XALLITIC, EN XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE DE LA OBRA DEL 99%

MONTO AUTORIZADO:

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:

VALIDACIÓN DEL PROYECTO:

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:

PERMISOS Y CONCESIONES:

DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:

\$5,000,000.00

\$5,000,000.00

EXISTE

X

NO EXISTE

NO APLICA

EXISTE

X

NO EXISTE

NO APLICA

EXISTE

X

NO EXISTE

NO APLICA

DEPENDENCIA DE XALAPA

EXISTE

TIPO DE LICITACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS

LICITACIÓN PÚBLICA

X

NO. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

RFC:

MONTO CONTRATADO:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

ANTICIPO:

CMAS-OP-067-2024

MAQUINARIA Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION

MSI080710HA4

\$4,537,520.68

PROGRAMADA

INICIO

25/04/2024

TÉRMINO

20/12/2024

DÍAS

240

APLICA MONTO:

NO APLICA

FECHA DE PAGO:

\$0.00

PORCENTAJE:

0.00

FECHA:

24/04/2024

CMAS

REAL

220

X

TIPO DE FIANZA:

MONTO AFIANZADO:

AFIANZADORA:

No. DE FIANZA:

FECHA:

CONVENIO MODIFICATORIO:

ANTICIPO

CUMPLIMIENTO

INSTITUCION DE GARANTIA

2911826

24/04/2024

EXISTE

MONTO

PLAZO

NO APLICA

X

IMPORTE/PERIODO

FECHA

INICIAL

FINAL

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:

\$4,537,520.68

C/IVA

Ing. Adán Burgos-Monfil

DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Rubén Omar Morales Bandala

SUPERVISOR DE OBRAS

* En caso de requerir más filas en el anexo de estado financiero utilizar otra hoja

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RUBÍ (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE) DE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024309090070	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:						ANTECEDENTES:		
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:						SI	X	NO
TIPO DE ZONA:	RURAL							
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA							
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO								
						CLAVE AGE:	N/A	
						SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						GRADO DE REZAGO SOCIAL:		
						MUY ALTO	ALTO	BASTO
						MUY BASTO		
						TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		
						DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA
						RESTRINGIDA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA								
LATITUD	19.566000200					-96.945481600		
LONGITUD								

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	FACTURAS		
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
5A	\$283,512.25	SPEI	\$197,236.53	Z000729	\$283,512.25	\$85,053.68	\$1,222.04	\$0.00	\$197,236.53
5N	\$378,168.53	SPEI	\$263,087.93	Z000733	\$378,168.53	\$113,450.56	\$1,630.04	\$0.00	\$263,087.93
3A	\$106,294.25	SPEI	\$73,947.81	00716	\$106,294.25	\$31,888.28	\$458.16	\$0.00	\$73,947.81
3N	\$194,662.98	SPEI	\$135,425.03	00714	\$194,662.98	\$58,398.89	\$839.06	\$0.00	\$135,425.03
2A	\$255,208.91	SPEI	\$177,546.20	00698	\$255,208.91	\$76,562.67	\$1,100.04	\$0.00	\$177,546.20
2N	\$270,285.57	SPEI	\$188,034.88	00699	\$270,285.57	\$81,085.67	\$1,165.02	\$0.00	\$188,034.88
1N	\$840,744.45	SPEI	\$584,897.21	00692	\$840,744.45	\$252,223.34	\$3,623.90	\$0.00	\$584,897.21
ANTICIPO	\$1,242,211.24	SPEI	\$1,242,211.24	684	\$1,242,211.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,211.24
1A	\$91,324.19	SPEI	\$63,533.29	00691	\$91,324.19	\$27,397.26	\$933.64	\$0.00	\$63,533.29
4N	\$681,257.50	SPEI	\$473,943.80	00725	\$681,257.50	\$204,377.25	\$2,936.45	\$0.00	\$473,943.80
4B	\$140,230.23	SPEI	\$97,556.72	00726	\$140,230.23	\$42,069.07	\$604.44	\$0.00	\$97,556.72
TOTALES	\$3,241,688.86		\$2,255,209.40		\$3,241,688.86	\$972,506.67	\$13,972.79	\$0.00	\$3,497,420.64

B) REPORTE		AVANCE FÍSICO REAL													
	EXISTE	FECHAS													
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$460,324.46	12/11/2024	AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,255,209.40		PROGRAMADO REAL	0	0	0	0	1.15	2.68	11.98	10.17	12.05	22.41	0	0
FINAQUITO CON IVA:	\$0.00		ACUMULADO	0	0	0	0	15	15	12	4	24	10	9	0
ATRASOS (%)			ACUMULADO	0	0	0	0	15	30	42	46	70	80	90	99
ACTIVO ENTREGA DEFECTUOSA:			ATRASOS (%)	0	0	0	0	0	0	0	7.98	0	2.05	12.41	0

<p>OBSERVACIONES:</p>

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-060-2024	FECHA:	12/04/2024
CONTRATISTA:	GR INFRAESTRUCTURA CIVIL E INMOBILIARIA SA DE CV		
RFC:	GIC091120E52		
MONTO CONTRATADO:	\$4,140,704.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	13/04/2024	
	TÉRMINO	08/12/2024	
	DÍAS	240	
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$1,242,211.20	
	FECHA DE PAGO:	18/04/2024	
PORCENTAJE:		30.00	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$1,242,211.24	\$356,957.25	
AFIANZADORA:	INSTITUCION DE GARAN, INSTITUCION DE GARAN		
No. DE FIANZA:	2908780	2908790	
FECHA:	12/04/2024	12/04/2024	
	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO	MONTO	INICIAL	FINAL
MODIFICATORIO:	PLAZO		
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRA:	\$4,340,000.00		
	C/IVA		

Ing. Adán Burgos Aroff
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Jaber Javed Jirgenez
RESIDENTE DE OBRA EN FUNCIONES DE
SUPERVISOR DE OBRA
FORMATO 11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ROBLE ENTRE LAS CALLES OLMO Y CEDRO; EN LA CALLE CEDRO ENTRE LAS CALLES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024309090071	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	ANTECEDENTES:	
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
ZONA: RURAL	AGEB:	SI	NO	X	MUY ALTO	BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	NO	X	MUY ALTO	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO	DIRECTA	RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LONGITUD -96.881248800				
LATITUD 19.496417400						

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS		IMPORTE	
	MONTO CON IVA	No.	MONTO	APORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	NETO
5A	\$57,575.66	00724	\$40,054.79	\$17,272.70	\$248.17	\$40,054.79
5N	\$267,469.49	00723	\$186,075.75	\$80,240.85	\$1,152.89	\$186,075.75
4A	\$33,321.34	0719	\$23,181.31	\$9,996.40	\$143.63	\$23,181.31
4N	\$140,268.20	00718	\$97,583.14	\$42,080.46	\$604.60	\$97,583.14
2A	\$295,446.42	704	\$205,539.01	\$88,633.93	\$1,273.48	\$205,539.01
2N	\$207,441.45	00703	\$144,314.88	\$62,232.43	\$894.14	\$144,314.88
ANTICIPO	\$638,921.80	688	\$638,921.80	\$0.00	\$0.00	\$638,921.80
1N	\$678,904.26	00694	\$472,306.67	\$203,671.28	\$2,926.31	\$472,306.67
1B	\$203,953.44	00693	\$141,888.30	\$61,186.03	\$879.11	\$141,888.30
3N	\$154,712.81	00705	\$107,632.10	\$46,413.84	\$666.87	\$107,632.10
3A	\$55,140.82	00706	\$38,360.89	\$16,542.25	\$237.68	\$38,360.89
TOTALES	\$2,094,233.89		\$1,456,936.84	\$628,270.17	\$9,026.88	\$2,095,858.64

B) REPORTE		FECHAS	
MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE \$0.00		
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,456,936.84		
FINQUITO CON IVA:	\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:			

AVANCE FÍSICO REAL													
AVANCE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0.68	28.58	12.11	19.43	19.82	19.38	0	0
REAL	0	0	0	1	39	15	25	18	1	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	1	40	55	80	98	99	99	99	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.82	18.38	0	0	0

OBSERVACIONES:

Ing. Adán Burgos Montañi
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Gilberto Montero Pérez
OTRO EN FUNCIONES DE SUPERVISOR

DF 088A

FORMATO 11

* En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	28/11/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2024309090073	
DESCRIPCION DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL, REHABILITACION DE ALcantarillado SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL SUMIDERO ENTRE CALLES	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		Antecedentes:	
Tipo de Obras Realizadas con FISM-DF:	SI	X	NO
	CLAVE	N/A	
ZONA:	AGEB:	SI	NO
	SI	X	NO
SE encuentra en una ZAP:		TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	
SE encuentra en el Catálogo		COMPLEMENTARIA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LONGITUD	
19.552614800		-96.893816100	

LATITUD		DESCRIPCION DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	
19.552614800		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 87%	

Monto con IVA		Polizas Cheque	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	SPEI	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	SPEI	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	SPEI	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	SPEI	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	SPEI	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

Monto con IVA		Facturas	
No. Est.	Monto	No.	Monto
3A	\$665,747.08	A786	\$457,414.16
2N	\$5,540,818.76	A777	\$3,806,924.61
1N	\$3,458,580.48	A756	\$2,376,283.32
ANTICIPO	\$11,743,798.98	0A84C	\$11,743,798.98
3N	\$6,387,775.65	A783	\$4,388,842.40
TOTALES		\$11,029,464.49	

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
19/12/2024
MES QUE SE REPORTA
NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		LOCALIDAD: No. DE OBRA:	XALAPA-ENRIQUEZ 2074309090074	A) PLANEACION Y DATOS GENERALES DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS,
--	--	-----------------------------------	----------------------------------	--	--

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:				Antecedentes:			
				SI	X	NO	
Obras realizadas con FISM-DF:							
Tipo de Zona:				Grado de Rezagó Social:			
RURAL				MUY ALTO			
URBANA				MEDIO			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				MUY BAJO			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO				VERACRUZ			
				DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:			
				ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS, COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE XALAPA,			

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SÍ	NO	DIRECTA	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				COPENADEN DE COORDINACIÓN

COORDENADAS DE GEOREFERENCIA		LONGITUD		-96.885448300	
LATITUD		19.569828300			

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*					
No. ECT	MONTO CONTINUA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS	

[illegible]

NO. DE CONTRATO:		CMAS-SR-002-2024		FECHA:		01/06/2024	
CONTRATISTA:		GRUPO NOVAC MMIC SA DE CV					
RFC:		GNM141201116					
MONTO CONTRATADO:				\$1,994,786.44		C/IVA	
				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		01/06/2024		01/06/2024	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		TÉRMINO		27/11/2024			
		DÍAS		180		183	
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA	
		MONTO:		\$398,957.28		PORCENTAJE: 20.00	
		FECHA DE PAGO:		18/06/2024			

TOTALES		\$931,726.60	\$741,365.21	\$0.00	\$1,140,322.50
---------	--	--------------	--------------	--------	----------------

B) REPORTE		AVANCE FÍSICO REAL												
		EXISTE	FECHAS											
MONTO PAGADO EN EL MES:		\$0.00												
MONTO PAGADO ACUMULADO:		\$741,365.21												
FINQUITO CON IVA:		\$0.00												
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:														
OBSERVACIONES:														

TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO	CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$398,957.29	\$171,964.35		
AFIANZADORA:		INTERREY, ASEGURADOR INTERREY ASEGURADOR			
No. DE FIANZA:		2281146			
FECHA:		01/06/2024	2024		
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA
		MONTO			
		PLAZO	INICIAL	FINAL	
		NO APLICA		X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,994,786.44			C/IVA

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Adán Burgos Mon
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Gilberto Montero Pérez

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	28/11/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

No. DE OBRA: 2024309090075

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NABOR TEJEDA, (ENTRE LA CALLE PROL. ADOLFO RUIZ CORTINES Y LIQUIDAMBAR) Y REHABILITACION DE RED DE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NABOR TEJEDA, (ENTRE LA CALLE PROL. ADOLFO RUIZ CORTINES Y LIQUIDAMBAR) Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NABOR TEJEDA, (ENTRE LA CALLE PROL. ADOLFO RUIZ CORTINES Y CEDRO), EN LA COLONIA 21 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

FECHA DE ELABORACION:

28/11/2024

MES QUE SE REPORTA

NOVIEMBRE

MONTO AUTORIZADO:

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:

VALIDACION DEL PROYECTO:

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:

PERMISOS Y CONCESIONES:

DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:

MONTO AUTORIZADO:

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:

VALIDACION DEL PROYECTO:

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:

PERMISOS Y CONCESIONES:

DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:

TIPO DE LICITACION:

ADJUDICACION DIRECTA

INVITACION A MENOS 3 PERSONAS

licitacion publica

EXISTE

X

NO. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

REF:

MONTO CONTRATADO:

PERIODO DE EJECUCION:

ANTICIPO:

CMAS-OP-073-2024

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ESRO SA DE CV

ICE0001216EA

\$866,080.77

PROGRAMADA

REAL

08/05/2024

05/08/2024

12/08/2024

97

NO APLICA

X

\$0.00

PORCENTAJE:

0.00

TIPO DE FIANZA:

MONTO AFIANZADO:

AFIANZADORA:

NO. DE FIANZA:

FECHA:

CONVENIO

MODIFICATORIO:

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:

ANTICIPO

CUMPLIMIENTO

VICIOS OCULTOS

\$74,662.14

\$94,336.12

INSTITUCION DE GARANTIA INSTITUCION DE GAR

2915527

07/05/2024

13/08/2024

2971813

EXISTE

X

MONTO

PLAZO

NO APLICA

81849.82

INICIAL

FINAL

02/08/2024

12/08/2024

\$947,930.59

C/IVA

Ing. Adán Burgos Montfil

Ing. Heber Ali Montemirra Medel

DIRECTOR DE OBRAS

SUPERVISOR DE OBRAS

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

FACTURAS

IMPORTE OBRA

IMPORTE NETO

MONTO CON IVA

MONTO CON IVA

AMORTIZADO CON IVA

5 MILLAR

CARGOS ADICIONALES

FINIQUITO

1N

\$637,478.32

\$634,730.57

\$637,478.32

\$634,730.57

\$0.00

\$2,747.75

\$0.00

\$304,863.17

\$304,863.17

B) REPORTE

FECHAS

MONTO PAGADO EN EL MES:

MONTO PAGADO ACUMULADO:

FINIQUITO CON IVA:

ACTA ENTREGA RECEPCION:

EXISTE

\$0.00

\$304,863.17

\$634,730.57

22/11/2024

OBSERVACIONES:

AVANCE FISICO REAL

AVANCE

PROGRAMADO

REAL

ACUMULADO

ATRASO (%)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DIC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD

-96.931103200

FECHA DE ELABORACION:

28/11/2024

MES QUE SE REPORTA

NOVIEMBRE

Ing. Adán Burgos Montfil

Ing. Heber Ali Montemirra Medel

DIRECTOR DE OBRAS

SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



STOM MUNICIPAL DE AGUA DO

EJERCICIO 2024

FORMATO 11

OBSERVACIONES:

1 de 1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	19/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024309090079	DESCRIPCION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PABLO H MEDINA ENTRE CALLES LUIS DORANTES Y DURAZNO Y CALLE MELÓN ENTRE		

CIENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		ANTECEDENTES:	
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	SI	NO
ZONA:	URBANA	SI	NO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	AGEB:	SI	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	SI	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	
LATITUD	19.571875700	DIRECTA	RESTRINGIDA
LONGITUD	-96.901639600	X	
		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
		MUY ALTO	BAJO
		ALTO	MUY BAJO
		MEDIO	X

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%	

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PABLO H MEDINA ENTRE CALLES LUIS DORANTES Y DURAZNO Y CALLE MELÓN ENTRE CALLES DURAZNO Y CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO DE LA COLONIA AMPLIACION JOSE VASCONCELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.	
MONTO AUTORIZADO:	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	
VALIDACION DEL PROYECTO:	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA	
FACTIBILIDAD:	
PERMISOS Y CONCESIONES:	
DEPENDENCIA QUE OTORGA	
LOS PERMISOS:	
TIPO DE LICITACION:	
ADJUDICACION DIRECTA	
INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	
LICITACION PUBLICA	
EXISTE	
X	

NO. DE CONTRATO:	
CONTRATISTA:	
RFC:	
MONTO CONTRATADO:	
PERIODO DE EJECUCION:	
ANTICIPO:	
FECHA:	
C/MAS	
SAUL RODRIGUEZ HERNANDEZ	
ROHS860827RN8	
\$1,734,176.39	
PROGRAMADA	
REAL	
11/05/2024	
07/09/2024	
120	
X	
NO APLICA	
\$520,252.91	
PORCENTAJE:	
15/05/2024	

TIPO DE FIANZA:	
MONTO AFIANZADO:	
AFIANZADORA:	
FECHA:	
CONVENIO	
MODIFICATORIO:	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO +	
CONTRATO) DE OBRA:	
C/MAS	
ANTICIPO	
CUMPLIMIENTO	
VICIOS OCULTOS	
\$520,252.92	
\$149,497.97	
\$152,410.91	
SITUACION DE GARANTIA	
2916082	
2960441	
10/05/2024	
10/05/2024	
31/07/2024	
EXISTE	
IMPORTE/PERIODO	
FECHA	
MONTO	
PLAZO	
FINAL	
X	
NO APLICA	
\$1,734,176.39	
C/MAS	

Ing. Adán Burgos Montañ	
DIRECTOR DE OBRAS	
Ing. Heber Ali Montemira Medel	
SUPERVISOR DE OBRAS	
FORMATO 11	

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	17/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090080	
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE TAJIN ENTRE LAS CALLES PLAZA DE ARMAS Y HAYA; EN LA CALLE MAYA ENTRE LAS	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:	
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
ZONA: RURAL	MUY ALTO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	ALTO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	MEDIO
	BAJO
	MUY BAJO
	X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	
DIRECTA	COMPLEMENTARIA
X	RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD	LONGITUD
19.568035900	-96.905697700

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*	
FACTURAS	
No. EST.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION
ANTICIPO IN	\$1,783,338.17
	\$725,855.26

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	ANOTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO IN	\$1,783,338.17	SPEI	\$1,783,338.17	4EA79	\$1,788,338.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788,338.17
	\$725,855.26	SPEI	\$504,969.99	NTK752	\$725,855.26	\$217,756.58	\$3,128.69	\$0.00	\$504,969.99
TOTALES									
	\$725,855.26		\$504,969.99		\$725,855.26	\$217,756.58	\$3,128.69	\$0.00	\$2,293,308.16

B) REPORTE	
MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE \$0.00
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$504,969.99
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00
ACTA ENTREGA RECEPCION:	
OBSERVACIONES:	

AVANCE FISICO REAL											
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	
Ing. Adan Burgos Montañez	
DIRECTOR DE OBRAS	
Ing. Heber Alt Montemir Medel	
SUPERVISOR DE OBRAS	
FORMATO 11	

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



EJERCICIO 2024

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Heber Ali Montemira Medel
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 4

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
28/11/2024
MES QUE SE REPORTA
NOVIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES					
MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XALAPA-ENRIQUEZ	DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y REDES DE AGUJA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS LAS TORRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	2024309090082		

ANTECEDENTES:			
Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	NO
Obras realizadas con FISM-DF:			
Tipo de	Clave	Grado de Rezagó Social:	
Zona:	Ageb:	Muy Alto	Bajo
Se encuentra en una Zap:		SI	NO
Tipo de Contribución del Proyecto:			
Muy Bajo			

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		-96.887201700	
LATITUD	19.558475000	LONGITUD	
		DIRECTA	X
		COMPLEMENTARIA	
		RESTRINGIDA	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*	
POLIZAS CHEQUE	FACTURAS
<p>AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%</p> <p>DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:</p>	

[illegible]

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-078-2024		FECHA:		01/06/2024			
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA RUIZACERO DE XALAPA SA DE CV							
RFC:		CRX010307KA1							
MONTO CONTRATADO:		\$1,377,472.60		C/IVA					
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL					
		INICIO		01/06/2024					
		TERMINO		28/09/2024					
		DÍAS		120		120			
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA			
		MONTO:		\$413,241.78		PORCENTAJE:		29.99	
		FECHA DE PAGO:		11/06/2024					

B) REPORTE		AVANCE FISICO REAL											
EXISTE		FECHAS											
Monto pagado en el mes:		19/11/2024											
Monto pagado acumulado:													
Finiquito con IVA:													
Acta entrega recepción:													
Observaciones:													

TIPO DE FINANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$413,241.78	\$118,747.64	\$137,747.26
AFIANZADORA:	INSTITUCION DE GARAN INSTITUTION DE GARANA INSTITUTION DE GARANA		
No. DE FINANZA:	2428246	24A28248	24A66526
FECHA:	01/06/2024	01/06/2024	01/10/2024
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,377,472.60	C/IVA

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

B) REPORTE		AVANCE FÍSICO REAL												
	EXISTE	FECHAS												
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$822,701.40	19/11/2024												
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$822,701.40													
FINQUITO CON IVA:	\$0.00													
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:														

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	22.91	24.7	37.1	15.29	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	35	20	30	14	0	1	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	35	55	85	99	99	100	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	4.69	7.1	1.28	0	0

OBSERVACIONES:	
-----------------------	--

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
28/11/2024
MES QUE SE REPORTA
NOVIEMBRE

MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS]

LOCALIDAD:

No. DE OBRA:

XALAPA-ENRIQUEZ

2024309090083

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS ARBOLEADAS DEL

PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA:

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

SI

X

IND

CLAVE

N/A

SI

NO

X

SI

NO

NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD

-96.896985000

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

X

DIRECTA

X

COMPLEMENTARIA

RESTRINGIDA

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

FACTURAS

No. EST.

MONTO CON IVA

POLIZAS CHEQUE

No.

MONTO

No.

AMORTIZADO CON IVA

IMPORTE MONTO CON IVA ESTIMACION

CARGOS ADICIONALES

IMPORTE NETO

FINIQUITO

\$1,108,896.81

\$1,104,117.08

AFAD2759

\$1,108,896.81

\$0.00

\$4,779.73

\$0.00

\$1,104,117.08

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

MONTO PAGADO EN EL MES:

MONTO PAGADO ACUMULADO:

FINIQUITO CON IVA:

ACTA ENTREGA RECEPCION:

\$0.00

\$0.00

\$1,104,117.08

22/11/2024

AVANCE FISICO REAL

AVANCE

PROGRAMADO

REAL

ACUMULADO

ATRASO (%)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS ARBOLEADAS DEL TRONCONAL, EJIDO EL TRONCONAL (AMPLIACION LA HACIENDITA), CAROLINO ANAYA, AMPLIACION VICENTE GUERRERO, EL TRIUNFO, Y RAFAEL HERNANDEZ VILLALPANDO, EN XALAPA VER

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

NO. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

RFC:

MONTO CONTRATADO:

PERIODO DE EJECUCION:

ANTICIPO:

CMAAS-OP-079-2024

MAQUINARIA Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION

MSI080710HA4

\$1,281,329.19

PROGRAMADA

01/06/2024

28/09/2024

120

NO APLICA

\$0.00

0.00

FECHA:

01/06/2024

TIPO DE FIANZA:

MONTO AFIANZADO:

No. DE FIANZA:

FECHA:

CONVENIO MODIFICATORIO:

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:

ANTICIPO

\$110,459.41

2924753

01/06/2024

EXISTE

IMPORTE/PERIODO

FECHA

NO APLICA

\$1,281,329.19

VIOS OCULTOS

\$110,889.68

29/5/58

05/09/2024

INICIAL

FINAL

C/IVA

Ing. Adán Burgos Montiel

DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Luis Ángel Avelino Marín

SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	19/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

No. DE OBRA: 2024309090084

CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA: ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA MITIGACION POR INUNDACIONES EN ANDADOR PINOS, CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, INTERCONEXION SOBRE ANDADOR PINOS, CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS PLUVIALES EN ANDADOR PINOS, INTERCONEXION SOBRE CIRCUITO PRESIDENTES ENTRE POETA ANGEL NUÑEZ BELTRAN Y ANGEL CARVAJAL, Y EQUIPAMIENTO DE PREDIO, COL. EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ.

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

SI X NO

CLAVE

AGB: N/A

TIPO DE ZONA: RURAL

URBANA

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD -96.922533300

LATITUD 19.512675200

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$5,850,255.34	SPEI \$5,850,255.34	\$5,850,255.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850,255.34
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850,255.34

B) REPORTE

EXISTE	FECHAS
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	

MONTO PAGADO EN EL MES:

MONTO PAGADO ACUMULADO:

FINQUITO CON IVA:

ACTA ENTREGA RECEPCION:

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	2.6	0	65.59	1.81	5.15	84.21
REAL	0	0	0	0	0	0	2.6	0	45	7.4	15	1
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	2.6	2.6	47.6	55	70	71
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.59	0	0	83.21

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	2.6	0	65.59	1.81	5.15	84.21
REAL	0	0	0	0	0	0	2.6	0	45	7.4	15	1
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	2.6	2.6	47.6	55	70	71
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.59	0	0	83.21

FECHA DE ELABORACION:

19/12/2024

MES QUE SE REPORTA

NOVIEMBRE

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES EN ANDADOR PINOS, INTERCONEXION SOBRE CIRCUITO PRESIDENTES ENTRE POETA ANGEL NUÑEZ BELTRAN Y ANGEL CARVAJAL, Y EQUIPAMIENTO DE PREDIO, COL. EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE DEL 71 %

MONTO AUTORIZADO:

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:

VALIDACION DEL PROYECTO:

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:

PERMISOS Y CONCESIONES:

DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:

TIPO DE LICITACION:

MONTO AUTORIZADO:

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:

VALIDACION DEL PROYECTO:

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:

PERMISOS Y CONCESIONES:

DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:

TIPO DE LICITACION:

NO. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

RFC:

MONTO CONTRATADO:

PERIODO DE EJECUCION:

ANTICIPO:

NO. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

RFC:

MONTO CONTRATADO:

PERIODO DE EJECUCION:

ANTICIPO:

TIPO DE FIANZA:

MONTO AFANZADO:

AFANZADORA:

FECHA:

CONVENIO MODIFICATORIO:

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:

TIPO DE FIANZA:

MONTO AFANZADO:

AFANZADORA:

FECHA:

CONVENIO MODIFICATORIO:

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:

Ing. Adán Burgos Morfí

DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Víctor Hugo Hernández Pérez

SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XALAPA-ENRIQUEZ	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	2024309090088		JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE INFANTE Y CALLE

[illegible]

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD	19.565783600
LONGITUD	-96.947990300

ESTA OBRA CUENTA CON UN AVANCE DEL 85%

<p>ESTÁ OBRA CUENTA CON UN AVANCE DEL 85%</p>									
<p>MONTO AUTORIZADO:</p>				<p>\$4,150,000.00</p>		<p>C/IVA</p>			
<p>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</p>				<p>\$4,150,000.00</p>		<p>C/IVA</p>			
<p>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</p>		<p>EXISTE</p>		<p>X</p>		<p>NO EXISTE</p>		<p>NO APLICA</p>	
<p>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</p>		<p>CMAS</p>							
<p>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</p>		<p>EXISTE</p>		<p>X</p>		<p>NO EXISTE</p>		<p>NO APLICA</p>	
<p>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</p>				<p>CMAS</p>					
<p>PERMISOS Y CONCESIONES:</p>		<p>EXISTE</p>		<p>X</p>		<p>NO EXISTE</p>		<p>NO APLICA</p>	
<p>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</p>				<p>H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.</p>					
<p>TIPO DE LICITACION:</p>		<p>ADJUDICACIÓN DIRECTA</p>				<p>EXISTE</p>		<p>X</p>	
		<p>INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS</p>							
		<p>licitación pública</p>							

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-101-2024	FECHA:	19/07/2024
CONTRATISTA:	CINDY YAMILETH LOZANO RAFAEL		
RFC:	LORC970117NNW8		
MONTO CONTRATADO:	\$4,067,798.25	C/IVA	
	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	20/07/2024	20/07/2024
	TÉRMINO	16/12/2024	
	DÍAS	150	104
	APLICA	X	NO APLICA
ANTICIPO:	MONTO:	\$1,220,339.47	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	26/07/2024	

TIPO DE FIANZA:		ANTIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$1,220,339.48	\$350,672.26	
AFIANZADORA:		ADORA INSURGENTES,S.ADORA INSURGENTES, S.A		
No. DE FIANZA:		10020-01147-2	10020-01146-5	
FECHA:		19/07/2024	19/07/2024	
CONVENIO MODIFICATORIO:		MONTO	EXISTE	FECHA
		PLAZO	IMPORTE/PERIODO	
			INICIAL	FINAL
		NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			\$4,067,798.25	C/IVA

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

[illegible]

B) REPORTE		AVANCE FÍSICO REAL														
	EXISTE	FECHAS														
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00															
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$911,207.10															
FINQUITO CON IVA:	\$0.00															
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:																
			AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	3,47	17,65	17,33	30,04	5,71	0
			REAL	0	0	0	0	0	0	0	1	13	20	35	16	0
			ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	1	14	34	69	85	0
			ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	2,67	4,64	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	17/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ

No. DE OBRA: 2024309090089

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO CEIBA, (ENTRE ALAMO Y JOSE MARIA MORELOS) Y

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A

AGB: SI NO X

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD -96.947531500

ANTECEDENTES:

TIPO DE ZONA: RURAL URBANA

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO BAJO MEDIO MUY BAJO X

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA

RESTRINGIDA

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO CEIBA, (ENTRE ALAMO Y JOSE MARIA MORELOS) Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA CALLE PINOS (ENTRE JESUS CARRANZA Y JOSE MA. MORELOS) Y EN CIRCUITO CEIBA (ENTRE JOSE MA. MORELOS Y FINAL DEL CIRCUITO DE LA COLONIA LINEA DEL ENXALAPA VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: AVANCE FISICO DEL 99%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

FACTURAS

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA	AMORTIZADO CON IVA	CARGOS ADICIONALES	5 MILLAR	IMPORTE NETO
3N	\$775,655.53	SPEI	\$539,615.53	A1311	\$775,655.53	\$232,696.66	\$0.00	\$3,343.34	\$539,615.53
IN	\$340,443.37	SPEI	\$232,290.94	1284	\$340,443.37	\$102,133.01	\$4,551.99	\$1,467.43	\$232,290.94
ANTICIPO	\$723,250.15	SPEI	\$723,250.15	530A2	\$723,250.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,250.15
2N	\$455,672.10	SPEI	\$321,558.36	1299	\$455,672.10	\$136,701.63	-\$4,551.99	\$1,964.10	\$321,558.36
2A	\$71,378.67	SPEI	\$49,657.40	A1301	\$71,378.67	\$21,413.60	\$0.00	\$307.67	\$49,657.40
TOTALES	\$1,643,149.67		\$1,143,122.23		\$1,643,149.67	\$492,944.90	\$0.00	\$7,082.54	\$1,866,372.38

B) REPORTE

EXISTE

MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,143,122.23
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00
ACTA ENTREGA RECEPCION:	

OBSERVACIONES:

B) REPORTE

EXISTE

MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,143,122.23
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00
ACTA ENTREGA RECEPCION:	

OBSERVACIONES:

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1.06	22.99	8.54	33.23	34.2	0	0
REAL	0	0	0	0	0	1	12	19.5	36.5	29	1	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	1	13	32.5	69	98	99	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0.06	10.98	0	0	5.2	0	0

AVANCE FISICO REAL

NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-083-2024

CONTRATISTA: ARRENDADORA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES GARRID RFC: AEC1202103N7

MONTO CONTRATADO: \$2,410,833.82

PERIODO DE EJECUCION: INICIO 25/06/2024 TERMINO 22/10/2024

ANTICIPO: APLICA MONTO: \$723,250.14 PORCENTAJE: 30.00

FECHA DE PAGO: 28/06/2024

TIPO DE FIANZA: MONTO AFIANZADO: \$723,250.15

AFIANZADORA: INSTITUCION DE GARANTIA INSTITUCION DE GARANTIA

No. DE FIANZA: 24A33720

FECHA: 25/06/2024

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE PERIODO INICIAL FINAL

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO 4 CONTRATO) DE OBRA: \$2,410,833.82

C/IVA

Ing. Adán Burgos Mopili

Acq. Blanca Arreola Amell Flores

DIRECTOR DE OBRAS

SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

[illegible]

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	10/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

LOCALIDAD:

No. DE OBRA:

XALAPA-ENRIQUEZ

2024309090091

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (ENTRE ACUEDUCTO E HISTORIAS PREHISPANICAS), DE LA COLONIA

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

SI

X

NO

CLAVE

AGEB:

SI

X

NO

NO

X

NO

TIPO DE ZONA:

RURAL

URBANA

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO

ANTECEDENTES:

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

X

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:

DIRECTA

X

COMPLEMENTARIA

RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD

-96.940131400

LATITUD

19.558777700

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA *

FACTURAS

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE	No.	MONTO	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
2A	\$57,131.38	SPEI	\$39,745.71	B469	\$57,131.38	\$17,139.41	\$246.26	\$0.00	\$39,745.71
2N	\$297,907.65	SPEI	\$207,251.27	B468	\$297,907.65	\$89,372.30	\$1,284.08	\$0.00	\$207,251.27
ANTICIPO	\$336,780.29	SPEI	\$336,780.29	2BA40	\$336,780.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,780.29
1N	\$397,646.04	SPEI	\$276,638.24	B466	\$397,646.04	\$119,293.81	\$1,713.99	\$0.00	\$276,638.24
1A	\$66,313.36	SPEI	\$46,133.52	B467	\$66,313.36	\$19,894.01	\$285.83	\$0.00	\$46,133.52
3N	\$152,539.77	SPEI	\$106,120.34	B471	\$152,539.77	\$45,761.92	\$657.50	\$0.00	\$106,120.35
3A	\$51,893.71	SPEI	\$36,101.92	B470	\$51,893.71	\$15,568.11	\$223.68	\$0.00	\$36,101.92
2B	\$60,956.98	SPEI	\$30,943.51	B742	\$60,956.98	\$29,750.72	\$262.75	\$0.00	\$30,943.51
TOTALES	\$1,084,388.89		\$742,934.51		\$1,084,388.89	\$336,780.28	\$4,674.09	\$0.00	\$1,079,714.81

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$742,934.51
FINQUITO CON IVA:	\$0.00
ACTA ENTREGA RECEPCION:	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

Reporte

Estado Financiero de la Obra

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%

MONTO AUTORIZADO:

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:

\$1,361,000.00

C/IVA

VALIDACION DEL PROYECTO:

EXISTE

X

NO EXISTE

NO APLICA

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

CMAS

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:

EXISTE

X

NO EXISTE

NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA

CMAS

FACTIBILIDAD:

PERMISOS Y CONCESIONES:

EXISTE

X

NO EXISTE

NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA

H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA

LOS PERMISOS:

ADJUDICACION DIRECTA

EXISTE

X

INVITACION A MENOS 3 PERSONAS

LICITACION PUBLICA

NO. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

CMAS-OP-085-2024

LORENZO GONZALEZ SANCHEZ

RFC:

MONTO CONTRATADO:

PERIODO DE EJECUCION:

ANTICIPO:

CMAS-OP-085-2024

GOSL5708103WA

\$1,122,600.96

PROGRAMADA

REAL

27/06/2024

27/06/2024

04/10/2024

DIAS

100

157

APLICA

X

NO APLICA

MONTO:

\$336,780.28

PORCENTAJE:

30.00

FECHA DE PAGO:

04/07/2024

TIPO DE FIANZA:

MONTO AFIANZADO:

AFIANZADORA:

No. DE FIANZA:

FECHA:

ANTICIPO

ANTICIPO

\$336,780.29

\$96,775.95

INSTITUCION DE GARAN:

INSTITUCION DE GARAN

2934309

2934314

27/06/2024

27/06/2024

EXISTE

IMPORTE/PERIODO

228989.40

FECHA

22/10/2024

CONVENIO

MODIFICATORIO:

MONTO

PLAZO

05/10/2024

04/11/2024

NO APLICA

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:

\$1,251,590.36

C/IVA

Ing. Adán-Burgos-Monfil

Arq. Blanca-Arocha Anel Flores

DIRECTOR DE OBRAS

SUPERVISOR DE OBRAS

* En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
17/12/2024
MES QUE SE REPORTA
NOVIEMBRE

MUNICIPIO: [MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [INGRESOS PROPIOS]

LOCALIDAD:

No. DE OBRA:

XALAPA-ENRIQUEZ

2024309090092

PLANEAACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA:

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO

SI

X

NO

CLAVE

AGEB:

SI

NO

SI

X

NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD

-96.905235100

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

DIRECTA

X

COMPLEMENTARIA

RESTRINGIDA

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

FACTURAS

No. EST.

MONTO CON IVA

PÓLIZAS CHEQUE

MONTO CON IVA

AMORTIZADO CON IVA

5 MILLAR

CARGOS ADICIONALES

IMPORTE NETO

ANTICIPO 1N

\$434,148.23

\$773,302.41

\$434,148.23

\$0.00

\$3,333.20

\$0.00

\$434,148.23

\$531,312.09

TOTALES

\$773,302.41

\$531,312.09

\$773,302.41

\$231,990.72

\$3,333.20

\$6,666.40

\$965,460.32

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

MONTO PAGADO EN EL MES:

MONTO PAGADO ACUMULADO:

FINIQUITO CON IVA:

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:

\$0.00

\$531,312.09

\$0.00

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RÍO SECO, (ENTRE RÍO JORDÁN Y CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO); Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO SECO, (ENTRE RÍO CONSOLAPA Y CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO), DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

ESTA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%

MONTO AUTORIZADO:

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:

VALIDACION DEL PROYECTO:

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:

PERMISOS Y CONCESIONES:

DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:

TIPO DE LICITACIÓN:

\$1,813,000.00

\$1,813,000.00

EXISTE

X

NO EXISTE

CMAS

EXISTE

X

NO EXISTE

CMAS

EXISTE

X

NO EXISTE

NO APLICA

H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.

ADJUDICACIÓN DIRECTA

INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS

LICITACIÓN PÚBLICA

EXISTE

X

NO. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

RFC:

MONTO CONTRATADO:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

ANTICIPO:

CMAS-OP-089-2024

CONSTRUCTORA CARIFE SA DE CV

CCA190206NR1

\$1,447,160.76

PROGRAMADA

INICIO

TÉRMINO

DÍAS

APLICA

MONTO:

FECHA DE PAGO:

01/07/2024

01/07/2024

26/10/2024

100

X

\$434,148.22

19/07/2024

TIPO DE VÍCIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO:

AFIANZADORA:

No. DE FIANZA:

FECHA:

CONVENIO MODIFICATORIO:

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:

ANTICIPO

\$434,148.23

ERREY, ASEGURADORA DTERREY, ASEGURADORA DMONTERREY, ASEGURADORA D

2287873

01/07/2024

EXISTE

MONTO

PLAZO

NO APLICA

\$1,447,160.76

CMAS-OP-089-2024

CONSTRUCTORA CARIFE SA DE CV

CCA190206NR1

\$1,447,160.76

PROGRAMADA

INICIO

TÉRMINO

DÍAS

APLICA

MONTO:

FECHA DE PAGO:

01/07/2024

01/07/2024

26/10/2024

100

X

\$434,148.22

19/07/2024

TIPO DE VÍCIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO:

AFIANZADORA:

No. DE FIANZA:

FECHA:

CONVENIO MODIFICATORIO:

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:

ANTICIPO

\$434,148.23

ERREY, ASEGURADORA DTERREY, ASEGURADORA DMONTERREY, ASEGURADORA D

2287873

01/07/2024

EXISTE

MONTO

PLAZO

NO APLICA

\$1,447,160.76

OBSERVACIONES:

Ing. Heber Ali Montemira Medel

Ing. Adán Burgos Montañil

SUPERVISOR DE OBRAS

DIRECTOR DE OBRAS

• En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	28/11/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090093	
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LINDEROS, ENTRE CALLES (13 DE SEPTIEMBRE Y CEIBA) Y REHABILITACION DE RED DE	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo: SI X NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A	
ZONA: URBANA AGE: N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD -96.884686700	
LATITUD 19.553400000	

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LINDEROS, ENTRE CALLES (13 DE SEPTIEMBRE Y CEIBA) Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LINDEROS, ENTRE CALLES (PRIMAVERA Y CEIBA), DE LA COLONIA HIGUERAS, EN XALAPA, VERACRUZ.	
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: ESTA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%	

Monto Autorizado: \$1,550,000.00 C/IVA	
Monto del Presupuesto Base: \$1,550,000.00 C/IVA	
Validación del Proyecto: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
Dependencia que Valida: CMAS	
Factibilidad del Proyecto: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
Dependencia que Otorga la Factibilidad: CMAS	
Permisos y Concesiones: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
Dependencia que Otorga los Permisos: H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.	
Tipo de Licitación: ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE	
Licitación Pública: INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X	

No. de Contrato: CMAS-OP-090-2024	
Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR QUALITY SA DE CV	
RFC: GCQ030131BVO	
Monto Contratado: \$1,529,996.87 C/IVA	
Periodo de Ejecución: INICIO 01/07/2024 REAL 01/07/2024	
Término 08/10/2024 08/10/2024	
Días 100 100	
Aplica X NO APLICA	
Monto: \$458,999.06 Porcentaje: 29.99	
Fecha de Pago: 10/07/2024	

Tipo de Fianza: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS	
Monto Afianzado: \$458,999.06 \$131,896.28 \$152,999.69	
Afianzadora: INSTITUCION DE GARAN, INSTITUCION DE GARANTIA	
No. de Fianza: 2936337 2936340 2974294	
Fecha: 01/07/2024 01/07/2024 11/10/2024	
Convenio Modificatorio: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO	
Plazo INICIAL FINAL	
Monto Total Contratado (Convenio + Contrato) de Obra: NO APLICA \$1,529,996.87 C/IVA	

Ing. Adán Burgos Montiel
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Luis Ángel Avelino Márin
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	19/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

No. DE OBRA: 2024309090096

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

SI X NO

CLAVE

SI X NO

AGEB:

SI X NO

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:

SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LONGITUD -96.893175000

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PAGANINI, (ENTRE AV. PASEO DE LAS ARAUCARIAS Y BEEHOVEN), DE LA COLONIA INDECO ANIMAS Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ DE ARRILAGA, (ENTRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRIMavera), DE LA COLONIA ALVARO OBREGON, EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTOS CON IVA		POLIZAS CHEQUE		FACTURAS		IMPORTE NETO
	No.	MONTO	No.	MONTO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
IN	SPEI	\$305,591.23	SPEI	\$305,591.23	\$1,893.38	\$0.00	\$305,591.23
ANTICIPO	SPEI	\$511,443.32	SPEI	\$511,443.32	\$0.00	\$0.00	\$511,443.32
TOTALES		\$439,263.73		\$439,263.73	\$1,893.38	\$0.00	\$817,034.55

B) REPORTE

MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS	
		EXISTE	FECHAS
\$0.00			
\$305,591.23			
\$0.00			

FECHAS

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PAGANINI, (ENTRE AV. PASEO DE LAS ARAUCARIAS Y BEEHOVEN), DE LA COLONIA INDECO ANIMAS Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ DE ARRILAGA, (ENTRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRIMavera), DE LA COLONIA ALVARO OBREGON, EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

NO. DE CONTRATO:

CMAS-OP-091-2024

FECHA:

01/07/2024

CONTRATISTA:

GRUPO CONSTRUCTOR BADEZ SA DE CV

RFC:

GCB130716P54

MONTO CONTRATADO:

\$1,704,811.08

PROGRAMADA

REAL

PERIODO DE EJECUCION:

INICIO

01/07/2024

TERMINO

28/10/2024

DIAS

120

ANTICIPO:

APLICA

X

NO APLICA

MONTO:

\$511,272.84

PORCENTAJE:

29.99

FECHA DE PAGO:

12/07/2024

TIPO DE LICITACION:

ADJUDICACION DIRECTA

INVITACION A MENOS 3 PERSONAS

EXISTE

X

MONTO AUTORIZADO:

\$2,143,000.00

C/IVA

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:

\$2,143,000.00

C/IVA

VALIDACION DEL PROYECTO:

EXISTE

X

NO EXISTE

NO APLICA

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

CMAS

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:

EXISTE

X

NO EXISTE

NO APLICA

FACTIBILIDAD:

CMAS

PERMISOS Y CONCESIONES:

EXISTE

X

NO EXISTE

NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:

H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA

TIPO DE LICITACION:

ADJUDICACION DIRECTA

INVITACION A MENOS 3 PERSONAS

EXISTE

X

MONTO AFIANZADO:

\$511,443.32

CUMPLIMIENTO

VICIOS OCULTOS

AFIANZADORA:

URADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA SA D

No. DE FIANZA:

3596-04244-9

3596-04245-2

3596-04380-6

FECHA:

01/07/2024

01/07/2024

22/10/2024

CONVENIO

MONTO

X

437794.05

FECHA

22/10/2024

MODIFICATORIO:

PLAZO

19/12/2024

19/12/2024

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO CONTRATO) DE OBRA:

\$2,142,665.43

C/IVA

Ing. Adán Burgos Montañi

DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Rubén Omar Morales Bandala

SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

1 de 1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	28/11/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

No. DE OBRA: 2024309090097

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

ZONA: RURAL

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 19.560851700

LONGITUD -96.901611700

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y VICENTE GUERRERO, COL. NACIONAL, VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y VICENTE GUERRERO, COL. NACIONAL EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y VICENTE GUERRERO, COL. NACIONAL; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y VICENTE GUERRERO, COL. NACIONAL EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	POLIZAS CHEQUE		MONTO CON IVA		IMPORTE OBRA		AMORTIZADO CON IVA		FACTURAS		IMPORTE NETO
	No.	SPEI	No.	SPEI	CON IVA	ESTIMADA	CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES		
IN											
ANTICIPO											
TOTALES											

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

07/11/2024

MONTO PAGADO EN EL MES:

\$458,504.53

MONTO PAGADO ACUMULADO:

\$458,504.53

FINQUITO CON IVA:

\$0.00

ACTA ENTREGA RECEPCION:

OBSERVACIONES:

NO. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

REF:

MONTO CONTRATADO:

PERIODO DE EJECUCION:

ANTICIPO:

NO. DE FIANZA:

MONTO AFIANZADO:

AFIANZADORA:

NO. DE FIANZA:

FECHA:

CONVENIO MODIFICATORIO:

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:

CMAS-OP-100-2024

INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACION SA DE CV

IIC060126GK8

\$1,916,294.06

PROGRAMADA

REAL

16/07/2024

12/11/2024

12/11/2024

120

NO APLICA

\$574,888.21

30.00

25/07/2024

\$574,888.22

\$165,197.46

\$154,526.35

URADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA, S.A. D

4125-01250-0

4125-1251-1

4125-01301-1

15/07/2024

15/08/2024

15/11/2024

EXISTE

IMPORTE/PERIODO

FECHA

INICIAL

FINAL

NO APLICA

\$1,916,294.06

C/IVA

Ing. Adán Burgos Montiel

DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Luis Angel Avelino Martin

SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

1 de 1

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACIÓN:
19/12/2024
MES QUE SE REPORTA
NOVIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		NOVIEMBRE
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	
	XALAPA-ENRIQUEZ	
	2024309090099	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALBERTO URENA, ENTRE CALLES IMACADAMIA Y PRIVADA ARQUILA DE LA COLONIA URENA		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		Antecedentes:	
SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA:			
<div> <div>RURAL</div> <div>URBANA</div> </div>			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			
CLAVE AGEB:		N/A	
SI	NO	X	
SI	NO		
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
<div> <div>MUY ALTO</div> <div>ALTO</div> <div>MEDIO</div> <div>BAJO</div> <div>MUY BAJO</div> </div>			
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:			
<div> <div>DIRECTA</div> <div>X</div> <div>COMPLEMENTARIA</div> <div>RESTRINGIDA</div> </div>			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD		LONGITUD	
19.537896700		-96.8995160000	

[illegible]

B) REPORTE		EXISTE	FECHAS
MONTON PAGO EN EL MES:		\$0.00	
MONTON PAGO ACUMULADO:		\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:		\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:			

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	2.73	38.65	2.32	32.5	5.81	0
REAL	0	0	0	0	0	0	10	30	22	33	4	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	10	40	62	95	99	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	8.64	0	0	1.8	0

OBSERVACIONES:

MONTO AUTORIZADO:		\$2,370,000.00		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$2,370,000.00		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE		NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				X
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	X		

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-093-2024	FECHA:	10/07/2024
CONTRATISTA:	VILLAS VERANDA RESIDENCIAL SA DE CV		
RFC:	VVR140805QX5		
Monto Contratado:	\$2,268,921.05	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	11/07/2024	11/07/2024
	TÉRMINO	07/11/2024	
	DÍAS	120	113
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$680,676.31	PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:	17/07/2024	29.99

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$680,676.31	\$195,596.64	
AFIANZADORA:	URADORA ASERTA, S.A. DURADORA ASERTA, S.A. D		
No. DE FIANZA:	3616-26771-7	3616-26772-0	
FECHA:	10/07/2024	10/07/2024	
	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO	MONTO		
MODIFICATORIO:	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO +			
CONTRATO DE OBRA:		\$2,268,921.05	C/IVA

Ing. Adán Burgos Monfil
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Luis Ángel Avelino Marín
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
19/12/2024
MES QUE SE REPORTA
NOVIEMBRE

MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XALAPA-ENRIQUEZ	A) PLANEACION Y DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	2024309090100	DESCRIPCION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CALLE PROLONGACION JAMAICA Y AV. MONTE EVEREST, COL				

ANTECEDENTES:				
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE	CLAVE	SI	X	NO
ZONA:	URBANA	SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	NO	X	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	19.547685000	LONGITUD	-96.889288300	

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:				
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CALLE PROLONGACION JAMAICA Y AV. MONTE EVEREST, COL HIGUERAS; REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE CARPATOS, ENTRE CALLES APENINOS Y ANDES, COL. LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ				
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:				
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 99%				

MONTO AUTORIZADO:				
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:				
VALIDACION DEL PROYECTO:				
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:				
FACTIBILIDAD QUE OTORGA LA				
FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:				
DEPENDENCIA QUE OTORGA				
LOS PERMISOS:				
TIPO DE LICITACION:				
ADJUDICACION DIRECTA				
LICITACION A MENOS 3 PERSONAS				
LICITACION PUBLICA				
EXISTE				
X				

NO. DE CONTRATO:				
CONTRATISTA:				
RFC:				
MONTO CONTRATADO:				
PERIODO DE EJECUCION:				
ANTICIPO:				
MONTO:				
FECHA DE PAGO:				
PORCENTAJE:				
29.99				

TIPO DE FIANZA:				
MONTO AFIANZADO:				
AFIANZADORA:				
FECHA:				
CONVENIO MODIFICATORIO:				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:				
C/IVA				

OBSERVACIONES:				
Ing. Adán Burgos-Monfil				
DIRECTOR DE OBRAS				
Arq. Luis Angel Avelino Martin				
SUPERVISOR DE OBRAS				
FORMATO 11				

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	19/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

No. DE OBRA: 2024309090102

PLANEAACION Y DATOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE PRIV. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, ENTRE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y FINAL DE LA CALLE, DE LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN XALAPA, VERACRUZ.

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:

SI X NO

OBRA REALIZADAS CON FISM-DF:

SI X NO

TIPO DE ZONA: RURAL

SI X NO

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:

SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO

SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

19.553228300

LATITUD

-96.904326700

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTANCIADA

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

FACTURAS

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE	No.	MOMTO	IMPORTE NETO	IMPORTE MONTO CON IVA	IMPORTE MONTO CON IVA RESTANCIADA	IMPORTE MONTO CON IVA	CARGOS ACCIONALES	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$286,770.87	\$PEI	\$286,770.87	01A4C	\$286,770.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,770.87
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,770.87

B) REPORTE

EXISTE

FECHAS

MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00
FINQUITO CON IVA:	\$0.00
ACTA ENTREGA RECEPCION:	

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE PRIV. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, ENTRE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y FINAL DE LA CALLE, DE LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

MONTO AUTORIZADO:

\$1,050,000.00

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:

\$1,050,000.00

VALIDACION DEL PROYECTO:

EXISTE X NO EXISTE

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

CMAS

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:

EXISTE X NO EXISTE

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA:

CMAS

FACTIBILIDAD:

EXISTE X NO EXISTE

PERMISOS Y CONCESIONES:

EXISTE X NO EXISTE

DEPENDENCIA QUE OTORGA:

H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA

LOS PERMISOS:

EXISTE X

TIPO DE LICITACION:

ADJUDICACION DIRECTA

INVITACION A MENOS 3 PERSONAS

LICITACION PUBLICA

NO. DE CONTRATO:

CMAS-09-088-2024

FECHA:

27/06/2024

CONTRATISTA:

ISIDRO BOLDAN HERNANDEZ

RFC:

ROI811120H11

MONTO CONTRATADO:

\$955,736.25

PROGRAMADA

REAL

PERIODO DE EJECUCION:

27/06/2024

INICIO

27/06/2024

TERMINO

04/10/2024

DIAS

100

APLICA

X NO APLICA

MONTO:

\$286,720.87

PORCENTAJE:

29.99

FECHA DE PAGO:

11/07/2024

TIPO DE FIANZA:

ANTICIPO

CUMPLIMIENTO

VICIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO:

\$286,720.87

AFIANZADORA:

INSTITUCION DE GARAN INSTITUCION DE GARAN INSTITUCION DE GARAN

NO. DE FIANZA:

2935563

FECHA:

27/06/2024

IMPORTE/PERIODO

FECHA

CONVENIO MODIFICATORIO:

MONTO

PLAZO

INICIAL

FINAL

NO APLICA

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:

\$955,736.25

C/IVA

Ing. Adán Burgos Montaño

DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Luis Angel Arvelino Martín

SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir más flujos en el apartado de estado financiero utilizar el formato 11.

1 de 1

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FECHA DE ELABORACION:
19/12/2024
MES QUE SE REPORTA
NOVIEMBRE

EJERCICIO 2024

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024300900103 DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MOA ENTRE LAS CALLES FLAMINGOS Y FINAL DE CALLE MOA EN LA COLONIA

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: SI X NO
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGE: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.504091300 LONGITUD 96.884055000

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

ANTECEDENTES:
GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MOA ENTRE LAS CALLES FLAMINGOS Y FINAL DE CALLE MOA EN LA COLONIA ZIPOR EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

MONTO AUTORIZADO:	\$1,165,000.00	C/IVA	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$820,000.00	C/IVA	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS	NO APLICA	NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS	NO APLICA	NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA	EXISTE	X
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE	X
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS		
	licitacion publica		

TOTALES		\$745,072.83	\$515,471.88	\$745,072.83	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88	\$515,471.88</
---------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$307,441.32	\$233,056.65	\$115,103.18
AFIANZADORA:	ADORA INSURGENTES, S.A. DE CV	ADORA INSURGENTES, S.A. DE CV	ADORA INSURGENTES, S.A. DE CV
No. DE FIANZA:	1254-09013-0	1254-09013-5	1254-09066-9
FECHA:	22/07/2024	22/07/2024	29/10/2024
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO X	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO INICIAL FINAL		
	20/12/2024 20/12/2024		20/12/2024
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	NO APLICA		C/IVA

Ing. Adán Burgos Morán DIRECTOR DE OBRAS
Ing. Oscar Jaramilla Ortiz SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANFAMENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUET	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024/3/09/001024	GAVILANES, IGNACIO ZARAGOZA, ZORIVAR DE IGNACIO ZARAGOZA, CALLES SIN

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		CLAVE	N/A
TIPO DE	RURAL	AGEB:	
ZONA:	URBANA		
¿SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X
GRADO DE REZAGO SOCIAL:		ALTO	MUY ALTO
		BAJO	MUY BAJO
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: <small>RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGÜDA POTABLE EN LAS CALLES DE GAVILANES, IGNACIO ZARAGOZA, 2DA. PRIV. DE IGNACIO ZARAGOZA, CALLES SIN NOMBRE 1 Y 2, PROL. IGNACIO ZARAGOZA Ó MIGÜEL ÁNGEL YUNES, FIDEL HERRERA BELTRAN, CALLE TREINTA Y CALLE CEDRO. (ENTRE CALLES GAVILANES Y 22 DE FEBRERO) Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE FIDEL</small>			

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		DIRECCIÓN		X		COMPLEMENTARIA		RESTRINGIDA	
LATITUD	19.574121600	LONGITUD	-96.932213200						
C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA *									
POLIZAS CHEQUE		FACTURAS							

[illegible]

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-104-2024	FECHA:	26/07/2024	
CONTRATISTA:	LINO HERNANDEZ GARCIA			
RFC:	HEG1940123150			
MONTO CONTRATADO:	\$1,927,294.23	PROGRAMADA	REAL	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	26/07/2024	26/07/2024	
	TERMINO	22/11/2024	22/11/2024	
	DÍAS	120	120	
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA	
	MONTO:	\$578,188.76	PORCENTAJE:	30.00
	FECHA DE PAGO:			13/08/2024

B) REPORTE		AVANCE FISICO REAL											
EXISTE		FECHAS											
MONTO PAGADO EN EL MES:		07/11/2024											
\$406,438.04													
MONTO PAGADO ACUMULADO:													
\$406,438.04													
FINIQUITO CON IVA:		50.00											
ACTA ENTREGA RECEPCION:													
OBSERVACIONES:													

TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		5578,188.27	\$166,146.05	\$192,523.72
AFIANZADORA:		NACIONAL FIANZAS MULTINACIONAL FIANZAS MULTINACIONAL ASERTIA SA DE CV		
No. DE FIANZA:		BKE-0235-0213228	BKY-0235-0213231	3763-02066-6
FECHA:		26/07/2024	26/07/2024	22/11/2024
CONVENIO		EXISTE		IMPORTE/PERIODO
MODIFICATORIO:		MONTO		INICIAL
		PLAZO		FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		NO APLICA		\$1,927,366.23
				C/IVA

Arq. Jaber Janyed Jiménez
RESIDENTE DE OBRA EN FUNCIONES DE
SUPERVISOR DE OBRA
FORMATO 11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS, ENTRE CALLE DURAZNOS Y AV. TRELLO, COLONIA LOS PRADOS Y
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024305090105	

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	N/A		
ZONA:	URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X	
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	X	NO	

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 19.557415000 LONGITUD -96.908343300

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CUM IVA	POLIZAS CHEQUE			FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE CUM IVA MONTO CON IVA EXTRACTOS	ABORTIZADO CUM IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES		
FINQUITO	\$329,280.76	SPEI	\$225,872.69	A-523	\$329,280.76	\$95,150.13	\$1,419.31	\$2,838.63	\$225,872.69	
ANILCIPU	\$366,560.19	SPEI	\$366,560.19	36676	\$366,560.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,560.19	
IN	\$453,154.60	SPEI	\$318,219.15	518	\$453,154.60	\$138,046.38	\$1,996.36	\$3,992.71	\$318,219.15	
2N	\$428,212.27	SPEI	\$294,211.36	A-522	\$428,212.27	\$128,463.68	\$1,845.74	\$3,691.49	\$294,211.36	
									</	

B) REPORTE

MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$612,430.51	07/11/2024
FINQUITO CON IVA:	\$225,872.69	
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

OBSERVACIONES:

AVANCE	ENR	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENR	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA DE ELABORACION:
28/11/2024
MES QUE SE REPORTA
NOVIEMBRE

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS, ENTRE CALLE DURAZNOS Y AV. TRELLO, COLONIA LOS PRADOS Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO COLORADO, ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y RIO CHACHALACAS, COLONIA CAROLINO AMAYA, EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

MONTO AUTORIZADO:	\$1,450,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,450,000.00	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS	NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS	NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA	NO APLICA
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitacion publica	

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-085-2024	FECHA:	10/07/2024
CONTRATISTA:	EUSEBIO FLORES HERNANDEZ		
RFC:	FOHF541216EUS		
MONTO CONTRATADO:	\$1,221,867.30		
PERIODO DE EJECUCION:	PROGRAMADA		
	INICIO	11/07/2024	REAL
	TERMINO	18/10/2024	11/07/2024
	DIAS	100	18/10/2024
	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$366,560.19	100
	FECHA DE PAGO:	15/07/2024	30.00

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$366,560.19	\$105,333.39	\$122,064.76
AFIANZADOR:	INSTITUCION DE CREDITO	INSTITUCION DE CREDITO DE CREDITO	
NO. DE FIANZA:	2938/16	2938/17	2938/18
FECHA:	10/07/2024	10/07/2024	22/10/2024
CONVENIO	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
MODIFICATORIO:	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,221,867.30		C/IVA

Ing. Adán Burgos Morsfil
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Luis Angel Moreno Martin
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024



FECHA DE ELABORACIÓN:	03/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUETZ	A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 202430090106	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO	NO
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	AGEB:	N/A	
ZONA:	RURAL	URBANA		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X	
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	X	NO	

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	LONGITUD	-96.889273300
LATITUD	19.586486700	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*	
FACTURAS	

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE	No.	MONTO	IMPORTE GASA	MONTO CON IVA	IMPORTE GASA	IMPORTE NETO	5 MILLAR	CARGOS	IMPORTE NETO
3N	\$382,761.02	\$266,282.88	900A4C	\$382,761.02	\$114,828.31	\$1649.83	\$206,282.88	\$206,282.88	\$1,649.83	\$0.00	\$206,282.88
3N	\$448,098.70	\$311,737.63	EE138	\$448,098.70	\$134,429.61	\$1,931.46	\$311,737.63	\$311,737.63	\$1,931.46	\$0.00	\$311,737.63
ANTICIPO	\$396,070.83	\$396,070.83	7E379	\$396,070.83	\$0.00	\$0.00	\$396,070.83	\$396,070.83	\$0.00	\$0.00	\$396,070.83
2N	\$343,564.25	\$239,014.09	6C694	\$343,564.25	\$103,069.28	\$1,480.88	\$239,014.09	\$239,014.09	\$1,480.88	\$0.00	\$239,014.09
TOTALES	\$1,174,473.97	\$817,034.60		\$1,174,473.97	\$352,327.20	\$5,062.17	\$0.00	\$1,213,105.43			

B) REPORTE	
MONTOS PAGADOS EN EL MES:	
MONTOS PAGADOS ACUMULADOS:	
FINQUITO CON IVA:	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	

OBSERVACIONES:	
MONTOS PAGADOS EN EL MES:	
MONTOS PAGADOS ACUMULADOS:	
FINQUITO CON IVA:	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	

*En caso de requerir más folios en el estado financiero utilizar otra hoja.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
FRAMBOYANES ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CHOFERES, COL. ARBOLEDAS DEL TRONCAL Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SANITARIO EN LA CALLE ARRAYANES ENTRE CALLE MACADAMIA Y CALLE LAGUNILLA, COL. ARBOLEDAS DEL TRONCAL EN XALAPA, VERACRUZ	

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	
---	--

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 100%

MONTOS AUTORIZADOS:	
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	
DEPENDENCIA QUE OTORGA:	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA:	
FACTIBILIDAD:	
PERMISOS Y CONCESIONES:	
DEPENDENCIA QUE OTORGA:	
LOS PERMISOS:	
TIPO DE LICITACIÓN:	

NO. DE CONTRATO:	
CONTRATISTA:	
RFC:	
MONTOS CONTRATADOS:	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	
ANTICIPO:	

TIPO DE FIANZA:	
MONTOS AFIANZADOS:	
AFIANZADOR:	
No. DE FIANZA:	
FECHA:	
CONVENIO MODIFICATORIO:	
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO):	
CONTRATO DE OBRA:	

Ing. Adán Burgos Morán	
DIRECTOR DE OBRAS	
Arq. Luis Ángel Avila	
SUPERVISOR DE OBRAS	

FORMATO 11

CMAS

FECHA DE ELABORACION:	19/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

En caso de recibir más tiles en el acapilado de estado financiero utilizar este ítem.

[illegible]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA, ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 2024309090110 DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DOROTEO ARANGO ENTRE LA AVENIDA ANTONIO CHEDRAU I CARAM Y LA CALLE

FECHA DE ELABORACION: 19/12/2024
MES QUE SE REPORTA: NOVIEMBRE

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DOROTEO ARANGO ENTRE LA AVENIDA ANTONIO CHEDRAU I CARAM Y LA CALLE FEDERALISMO Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA 1 (ENTRE LA CALLE DOROTEO ARANGO Y FINAL DE LA PRIVADA 1) Y EN LA PRIVADA 2 (ENTRE LA CALLE DOROTEO ARANGO Y FINAL DE LA PRIVADA 2) EN LA COLONIA

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

MONTO AUTORIZADO:		MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,281,000.00	C/IVA	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS	NO EXISTE	NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS	NO EXISTE	NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA	NO EXISTE	NO APLICA
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	TIPO DE LICITACION:	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	EXISTE	X
			LICITACION PUBLICA		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$352,295.63	\$101,234.38	\$128,050.10
AFIANZADORA:	ASULO COMPANIA AHUMLCO COMPANIA AHUMLCO COMPANIA AHUMLCO		
FECHA:	09/17/2024	09/17/2024	10/31/2024
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	X	106,182.25
	PLAZO	X	19/12/2024
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,280,301.01		C/IVA

Ing. Adán Burgos Montiel
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Rubén Benítez Morales Bandala
SUPERVISOR DE OBRAS

[illegible]

^aEn caso de requerir más días en el apartado de estado financiero utilizar otros horizontes.

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		
MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS	Nº. DE OBRA:
		XALAPA-ENRIQUEZ 7074303090012
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALIF. CIUDAD DE LAS FLORES ENTRE CALLES VERACRUZ Y DIODORO BATAJIA EN LA COLONIA RUBEN PABELLO ACOSTA EN		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CIUDAD DE LAS FLORES ENTRE CALLES VERACRUZ Y DIODORO BATALLA EN LA COLONIA RUBÉN PABELLO ACOSTA, EN XALAPA, VERACRUZ.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 100%

MONTO AUTORIZADO:		\$700,000.00		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE:		\$700,000.00		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE		NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				X
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.			
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE
		INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X
		LICITACIÓN PÚBLICA		

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-109-2024	FECHA:	08/08/2024
CONTRATISTA:	CONSTRUIBLES MAXIMAR SA DE CV		
RFC:	CMA140518M40		
MONTO CONTRATADO:	\$561,770.60	REAL	
	PROGRAMA		
	INICIO	08/08/2024	08/08/2024
	TERMINO	06/10/2024	06/10/2024
	DÍAS	60	60
	APLICA	X	NO APLICA
ANTECIPO:	MONTO:	\$168,531.18	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	23/08/2024	

TIPO DE FINANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$168,531.18	\$48,428.50	\$56,177.06
AFIANZADORA:	RRIACCIONAL FINANZAS MEXICANAS RRIACCIONAL FINANZAS MEXICANAS		
No. DE FINANZA:	BKY-0889-0215261	BKY-0889-0215259	BKY 0889-0231780
FECHA:	08/08/2024	08/08/2024	08/10/2024
CONVENIO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MODIFICATORIO:	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$561,770.60	CLAVE

Ing. Adán Burgos Morán
DIRECTOR DE OBRAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACIÓN:
26/11/2024
MES QUE SE REPORTA
NOVIEMBRE



MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA, ENRIQUEZ		A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2024309090113		DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LAS PARCELAS Y CALLE 22 DE FEBRERO, DE LA COLONIA	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A					
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA					
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO					
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD -96.904498300					
LATITUD 19.569433300					
C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*					
No. EST.		POLIZAS CHEQUE		FACTURAS	
No.		MONTO		5 MILLAR	
FINQUITO		\$180,038.73		\$180,038.73	
2A		\$115,149.50		\$115,149.50	
2B		\$44,828.20		\$44,828.20	
2C		\$15,977.14		\$15,977.14	
2D		\$198,418.79		\$198,418.79	
2E		\$285,211.65		\$285,211.65	
2F		\$279,860.99		\$279,860.99	
2G		\$353,533.43		\$353,533.43	
2H		\$245,949.55		\$245,949.55	
2I		\$106,060.03		\$106,060.03	
2J		\$1,523.85		\$1,523.85	
2K		\$0.00		\$0.00	
2L		\$0.00		\$0.00	
2M		\$0.00		\$0.00	
2N		\$0.00		\$0.00	
2O		\$0.00		\$0.00	
2P		\$0.00		\$0.00	
2Q		\$0.00		\$0.00	
2R		\$0.00		\$0.00	
2S		\$0.00		\$0.00	
2T		\$0.00		\$0.00	
2U		\$0.00		\$0.00	
2V		\$0.00		\$0.00	
2W		\$0.00		\$0.00	
2X		\$0.00		\$0.00	
2Y		\$0.00		\$0.00	
2Z		\$0.00		\$0.00	
2AA		\$0.00		\$0.00	
2AB		\$0.00		\$0.00	
2AC		\$0.00		\$0.00	
2AD		\$0.00		\$0.00	
2AE		\$0.00		\$0.00	
2AF		\$0.00		\$0.00	
2AG		\$0.00		\$0.00	
2AH		\$0.00		\$0.00	
2AI		\$0.00		\$0.00	
2AJ		\$0.00		\$0.00	
2AK		\$0.00		\$0.00	
2AL		\$0.00		\$0.00	
2AM		\$0.00		\$0.00	
2AN		\$0.00		\$0.00	
2AO		\$0.00		\$0.00	
2AP		\$0.00		\$0.00	
2AQ		\$0.00		\$0.00	
2AR		\$0.00		\$0.00	
2AS		\$0.00		\$0.00	
2AT		\$0.00		\$0.00	
2AU		\$0.00		\$0.00	
2AV		\$0.00		\$0.00	
2AW		\$0.00		\$0.00	
2AX		\$0.00		\$0.00	
2AY		\$0.00		\$0.00	
2AZ		\$0.00		\$0.00	
2BA		\$0.00		\$0.00	
2BB		\$0.00		\$0.00	
2BC		\$0.00		\$0.00	
2BD		\$0.00		\$0.00	
2BE		\$0.00		\$0.00	
2BF		\$0.00		\$0.00	
2BG		\$0.00		\$0.00	
2BH		\$0.00		\$0.00	
2BI		\$0.00		\$0.00	
2BJ		\$0.00		\$0.00	
2BK		\$0.00		\$0.00	
2BL		\$0.00		\$0.00	
2BM		\$0.00		\$0.00	
2BN		\$0.00		\$0.00	
2BO		\$0.00		\$0.00	
2BP		\$0.00		\$0.00	
2BQ		\$0.00		\$0.00	
2BR		\$0.00		\$0.00	
2BS		\$0.00		\$0.00	
2BT		\$0.00		\$0.00	
2BU		\$0.00		\$0.00	
2BV		\$0.00		\$0.00	
2BW		\$0.00		\$0.00	
2BX		\$0.00		\$0.00	
2BY		\$0.00		\$0.00	
2BZ		\$0.00		\$0.00	
2CA		\$0.00		\$0.00	
2CB		\$0.00		\$0.00	
2CC		\$0.00		\$0.00	
2CD		\$0.00		\$0.00	
2CE		\$0.00		\$0.00	
2CF		\$0.00		\$0.00	
2CG		\$0.00		\$0.00	
2CH		\$0.00		\$0.00	
2CI		\$0.00		\$0.00	
2CJ		\$0.00		\$0.00	
2CK		\$0.00		\$0.00	
2CL		\$0.00		\$0.00	
2CM		\$0.00		\$0.00	
2CN		\$0.00		\$0.00	
2CO		\$0.00		\$0.00	
2CP		\$0.00		\$0.00	
2CQ		\$0.00		\$0.00	
2CR		\$0.00		\$0.00	
2CS		\$0.00		\$0.00	
2CT		\$0.00		\$0.00	
2CU		\$0.00		\$0.00	
2CV		\$0.00		\$0.00	
2CW		\$0.00		\$0.00	
2CX		\$0.00		\$0.00	
2CY		\$0.00		\$0.00	
2CZ		\$0.00		\$0.00	
2DA		\$0.00		\$0.00	
2DB		\$0.00		\$0.00	
2DC		\$0.00		\$0.00	
2DD		\$0.00		\$0.00	
2DE		\$0.00		\$0.00	
2DF		\$0.00		\$0.00	
2DG		\$0.00		\$0.00	
2DH		\$0.00		\$0.00	
2DI		\$0.00		\$0.00	
2DJ		\$0.00		\$0.00	
2DK		\$0.00		\$0.00	
2DL		\$0.00		\$0.00	
2DM		\$0.00		\$0.00	
2DN		\$0.00		\$0.00	
2DO		\$0.00		\$0.00	
2DP		\$0.00		\$0.00	
2DQ		\$0.00		\$0.00	
2DR		\$0.00		\$0.00	
2DS		\$0.00		\$0.00	
2DT		\$0.00		\$0.00	
2DU		\$0.00		\$0.00	
2DV		\$0.00		\$0.00	
2DW		\$0.00		\$0.00	
2DX		\$0.00		\$0.00	
2DY		\$0.00		\$0.00	
2DZ		\$0.00		\$0.00	
2EA		\$0.00		\$0.00	
2EB		\$0.00		\$0.00	
2EC		\$0.00		\$0.00	
2ED		\$0.00		\$0.00	
2EE		\$0.00		\$0.00	
2EF		\$0.00		\$0.00	
2EG		\$0.00		\$0.00	
2EH		\$0.00		\$0.00	
2EI		\$0.00		\$0.00	
2EJ		\$0.00		\$0.00	
2EK		\$0.00		\$0.00	
2EL		\$0.00		\$0.00	
2EM		\$0.00		\$0.00	
2EN		\$0.00		\$0.00	
2EO		\$0.00		\$0.00	
2EP		\$0.00		\$0.00	
2EQ		\$0.00		\$0.00	
2ER		\$0.00		\$0.00	
2ES		\$0.00		\$0.00	
2ET		\$0.00		\$0.00	
2EU		\$0.00		\$0.00	
2EV		\$0.00		\$0.00	
2EW		\$0.00		\$0.00	
2EX		\$0.00		\$0.00	
2EY		\$0.00		\$0.00	
2EZ		\$0.00		\$0.00	
2FA		\$0.00		\$0.00	
2FB		\$0.00		\$0.00	
2FC		\$0.00		\$0.00	
2FD		\$0.00		\$0.00	
2FE		\$0.00		\$0.00	
2FF		\$0.00		\$0.00	
2FG		\$0.00		\$0.00	
2FH		\$0.00		\$0.00	
2FI		\$0.00		\$0.00	
2FJ		\$0.00		\$0.00	
2FK		\$0.00		\$0.00	
2FL		\$0.00		\$0.00	
2FM		\$0.00		\$0.00	
2FN		\$0.00		\$0.00	
2FO		\$0.00		\$0.00	
2FP		\$0.00		\$0.00	
2FQ		\$0.00		\$0.00	
2FR		\$0.00		\$0.00	
2FS		\$0.00		\$0.00	
2FT		\$0.00		\$0.00	
2FU		\$0.00		\$0.00	
2FV		\$0.00		\$0.00	
2FW		\$0.00		\$0.00	
2FX		\$0.00		\$0.00	
2FY		\$0.00		\$0.00	
2FZ		\$0.00		\$0.00	
2GA		\$0.00		\$0.00	
2GB		\$0.00		\$0.00	
2GC		\$0.00		\$0.00	
2GD		\$0.00		\$0.00	
2GE		\$0.00		\$0.00	
2GF		\$0.00		\$0.00	
2GG		\$0.00		\$0.00	
2GH		\$0.00		\$0.00	
2GI		\$0.00		\$0.00	
2GJ		\$0.00		\$0.00	
2GK		\$0.00		\$0.00	
2GL		\$0.00		\$0.00	
2GM		\$0.00		\$0.00	
2GN		\$0.00		\$0.00	
2GO		\$0.00		\$0.00	
2GP		\$0.00		\$0.00	
2GQ		\$0.00		\$0.00	
2GR		\$0.00		\$0.00	
2GS		\$0.00		\$0.00	
2GT		\$0.00		\$0.00	
2GU		\$0.00		\$0.00	
2GV		\$0.00		\$0.00	
2GW		\$0.00		\$0.00	
2GX		\$0.00		\$0.00	
2GY		\$0.00		\$0.00	
2GZ		\$0.00		\$0.00	
2HA		\$0.00		\$0.00	
2HB		\$0.00		\$0.00	
2HC		\$0.00		\$0.00	
2HD		\$0.00		\$0.00	
2HE		\$0.00		\$0.00	
2HF		\$0.00		\$0.00	
2HG		\$0.00		\$0.00	
2HH		\$0.00		\$0.00	
2HI		\$0.00		\$0.00	
2HJ		\$0.00		\$0.00	
2HK		\$0.00		\$0.00	
2HL		\$0.00		\$0.00	
2HM		\$0.00		\$0.00	
2HN		\$0.00		\$0.00	
2HO		\$0.00		\$0.00	
2HP		\$0.00		\$0.00	
2HQ		\$0.00		\$0.00	
2HR		\$0.00		\$0.00	
2HS		\$0.00		\$0.00	
2HT		\$0.00		\$0.00	
2HU		\$0.00		\$0.00	
2HV		\$0.00		\$0.00	
2HW		\$0.00		\$0.00	
2HX		\$0.00		\$0.00	
2HY		\$0.00		\$0.00	
2HZ		\$0.00		\$0.00	
2IA		\$0.00		\$0.00	
2IB		\$0.00		\$0.00	
2IC		\$0.00		\$0.00	
2ID		\$0.00		\$0.00	
2IE		\$0.00		\$0.00	
2IF		\$0.00		\$0.00	
2IG		\$0.00		\$0.00	
2IH		\$0.00		\$0.00	
2IJ		\$0.00		\$0.00	
2IK		\$0.00		\$0.00	
2IL		\$0.00		\$0.00	
2IM		\$0.00		\$0.00	
2IN		\$0.00		\$0.00	
2IO		\$0.00		\$0.00	
2IP		\$0.00		\$0.00	
2IQ		\$0.00		\$0.00	
2IR		\$0.00		\$0.00	
2IS		\$0.00		\$0.00	
2IT		\$0.00		\$0.00	
2IU		\$0.00		\$0.00	
2IV		\$0.00		\$0.00	
2IW		\$0.00		\$0.00	
2IX		\$0.00		\$0.00	
2IY		\$0.00		\$0.00	
2IZ		\$0.00		\$0.00	
2JA		\$0.00		\$0.00	
2JB		\$0.00		\$0.00	
2JC		\$0.00		\$0.00	
2JD		\$0.00		\$0.00	
2JE		\$0.00		\$0.00	
2JF		\$0.00		\$0.00	
2JG		\$0.00		\$0.00	
2JH		\$0.00		\$0.00	
2JI		\$0.00		\$0.00	
2JJ		\$0.00		\$0.00	
2JK		\$0.00		\$0.00	
2JL		\$0.00		\$0.00	
2JM		\$0.00		\$0.00	
2JN		\$0.00		\$0.00	
2JO		\$0.00		\$0.00	
2JP		\$0.00		\$0.00	
2JQ		\$0.00		\$0.00	
2JR		\$0.00		\$0.00	
2JS		\$0.00		\$0.00	
2JT		\$0.00		\$0.00	
2JU		\$0.00		\$0.00	
2JV		\$0.00		\$0.00	
2JW		\$0.00		\$0.00	
2JX		\$0.00		\$0.00	
2JY		\$0.00		\$0.00	
2JZ		\$0.00		\$0.00	
2KA		\$0.00		\$0.00	
2KB		\$0.00		\$0.00	
2KC		\$0.00		\$0.00	
2KD		\$0.00		\$0.00	
2KE		\$0.00		\$0.00	
2KF		\$0.00		\$0.00	
2KG		\$0.00		\$0.00	
2KH		\$0.00		\$0.00	
2KI		\$0.00		\$0.00	
2KJ		\$0.00		\$0.00	
2KL		\$0.00		\$0.00	
2KM		\$0.00		\$0.00	
2KN		\$0.00		\$0.00	
2KO		\$0.00		\$0.00	
2KP		\$0.00		\$0.00	
2KQ		\$0.00		\$0.	



EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	19/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

[illegible]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024



MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRAS: 2024309090116

DESCRIPCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA VICENTE GUERRERO, CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, 23 DE MARZO,

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRA REALIZADA CON FISM-DF: CLAVE AGE: N/A

TIPO DE ZONA: RURAL URBANA

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD -96.896751300

LATITUD 19.564113500

ANTECEDENTES:

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS		CARGOS ACCIONALES		IMPORTE		C/IWA
	No.	MONTO	No.	ANULADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ACCIONALES	NETO	NETO	
2N	SPEI	\$589,141.00	NTK763	\$589,141.00	\$176,742.30	\$0.00	\$409,859.30	\$409,859.30	C/IWA
3A	SPEI	\$46,879.85	NTK757	\$46,879.85	\$202.07	\$0.00	\$32,613.82	\$32,613.82	C/IWA
ANTICIPO	SPEI	\$1,225,476.91	B4053	\$1,225,476.91	\$0.00	\$0.00	\$1,225,476.91	\$1,225,476.91	NO APLICA
1N	SPEI	\$592,355.18	NTK760	\$592,355.18	\$177,706.55	\$0.00	\$412,095.37	\$412,095.37	NO APLICA
2A	SPEI	\$42,024.36	NTK762	\$42,024.36	\$17,607.31	\$0.00	\$29,235.91	\$29,235.91	NO APLICA
TOTALES		\$1,270,400.39		\$1,270,400.39	\$381,120.12	\$0.00	\$7,109,281.31	\$7,109,281.31	

B) REPORTE

EXISTE: \$439,095.21

FECHAS: 27/11/2024

MONTO PAGADO EN EL MES: \$883,804.40

MONTO PAGADO ACUMULADO: \$0.00

FINQUITO CON IVA: \$0.00

ACTA ENTREGA RECEPCION:

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

Ing. Adán Burgos Mendiola DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Juan Ortiz Lagunes SUPERVISOR DE OBRAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/11/2024

MES QUE SE REPORTA: NOVIEMBRE



A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

[illegible]

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*				
No. ENT	MONTO COMUNA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS

[illegible]

B) REPORTE		EXISTE		FECHAS	
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00				
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00				
FINQUITO CON IVA:	\$0.00				
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:					

OBSERVACIONES:

* En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LAUREL, ENTRE CALLES HUIZACHAL Y ENCINOS, COLONIA HIGUERAS Y REHABILITACIÓN

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE PUZOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EXISTENTES EN CALLE LAUREL, ENTRE CALLES HUIZACHAL Y PINOS, COLONIA HIGUERAS Y REHABILITACIÓN DE RETO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 2DA DE SUCUBERT ENTRE CALLE RAVEL Y AREA VERDE DE FRACCIONAMIENTO INDECO ANIMAS, COL INDECOANIMAS CALABARRA VERACRUZ

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 99%

MONTO AUTORIZADO:				C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,250,000.00		C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA		CMAS			
FACTIBILIDAD:					
PERMISOS Y CONCESIONES:		EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA		H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA			
LOS PERMISOS:					
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	
		INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
		LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-110/2024	FECHA:	08/08/2024
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS FRISA SA DE CV		
RFC:	IF R200425D13		
MONTO CONTRATADO:	\$1,206,508.00	C/IVA	
	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	08/08/2024	08/08/2024
PERIODO DE EJECUCIÓN:	TERMINO	05/11/2024	
	DÍAS	90	85
	APLICA	NO APLICA	X
ANTICIPO:	MONTÓ:	\$0.00	PORCENTAJE: 0.00
	FECHA DE PAGÓ:		

TIPO DE FINANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFANZADO:	\$361,952.40	\$104,009.31	
AFANZADORA:	STICULACION DE GARANTIA INSTITUTION DE SOBAN		
NO. DE FINANZA:	2953477	7953479	
FECHA:	08/08/2024	08/08/2024	FECHA
CONVENIO	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
MODIFICATORIO:	PLAZO	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRAS:	NO APLICA	X	
		\$1,205,508.00	C/IVA

Ing. Adán Puigues Morfín
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Oscar del Real Ortiz
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUETZ	DESCRIPCION DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024305090123	

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE	N/A		
TIPO DE ZONA:	URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	X	NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	LONGITUD	-96.911250000		
LATITUD		19.555075000		

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS		IMPORTE NETO
		No.	MONTO	APORTADO CON IVA	CARGOS ADICIONALES	
ANTICIPO	\$1,202,148.84	SP01	\$1,202,148.84	\$0.00	\$0.00	\$1,202,148.84
TOTALES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,202,148.84

B) REPORTE

MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

Ing. Adán Burgos Muriel	DIRECTOR DE OBRAS
Arq. Luis Angel Avelino Wazh	SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de require may files en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja

FECHA DE ELABORACION:	19/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN VARIAS CALLES (FRESNO, EUCAUPTO, ENCINOS, HAYAS Y NISPEROS), Y REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRESNO, EUCAUPTO Y HAYAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL INTERCEANICO Y CALLE NISPEROS, DE LA COL. UNION FERROCARRILERA, EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN VARIAS CALLES (FRESNO, EUCAUPTO, ENCINOS, HAYAS Y NISPEROS), Y REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRESNO, EUCAUPTO Y HAYAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL INTERCEANICO Y CALLE NISPEROS, DE LA COL. UNION FERROCARRILERA, EN XALAPA, VERACRUZ

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE FISICO DEL 99%

MONTO AUTORIZADO:	\$4,100,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$4,100,000.00	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS	NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA	CMAS	NO APLICA
FACTIBILIDAD:	EXISTE	X
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.	NO APLICA
LOS PERMISOS:	EXISTE	X
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICTACION PUBLICA	X

NO. DE CONTRATO:	CMAS-09-111-2024	FECHA:	16/08/2024
CONTRATISTA:	BLOCSA SA DE CV		
RF:	EIO003331NHA		
MONTO CONTRATADO:	\$4,007,162.80	PROGRAMADA	REAL
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO 17/08/2024	TERMINO 17/08/2024	
	DIAS 100		76
ANTICIPO:	APLICA X	NO APLICA	
	MONTO: \$1,202,148.83	PORCENTAJE:	30.00
	FECHA DE PAGO:	27/08/2024	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$1,202,148.84	\$345,415.07	
AFIANZADOR:	SURADORA ASERTA, SA DE CV	4290-00269-0	
No. DE FIANZA:	4290-00269-0	16/08/2024	
FECHA:	16/08/2024	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO	INICIAL FINAL	
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$4,007,162.80		C/IVA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



EJERCICIO 2024

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA ENRIQUEZ		A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2024305290124		DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUEZ Z. MERCADO, ENTRE CALLES AVENIDA FERROCARRIL INTEROCEANICO Y AVENIDA ENCANTO Y PRIVADA	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		Antecedentes:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		Grado de Rezago Social:	
Tipo de Zona: RURAL		Muy Alto	
Zona: URBANA		Alto	
Se encuentra en una Zap:		Medio	
Se encuentra en el Catálogo		Bajo	
Clave AGEB: SI		Muy Bajo	
SI		X	
NO			
Tipo de Contribución del Proyecto:		Muy Bajo	
Directa		X	
Complementaria			
Restringida			

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
Longitud	-96.907555000
Latitud	19.566286700

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	Monto con IVA	Polizas Cheque		Facturas		Cargos Adicionales		Importe Neto	
		No.	Monto	No.	Importe con IVA	No.	Monto	No.	Monto
ANTICIPO	\$356,750.16	SPEI	\$356,750.16	E7441	\$356,750.16		\$0.00		\$356,750.16
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$356,750.16

B) REPORTE		FECHAS	
Monto pagado en el mes:		EXISTE	
\$0.00			
Monto pagado acumulado:			
\$0.00			
Finiquito con IVA:			
\$0.00			
Acta entrega recepción:			
OBSERVACIONES:			

Monto total contratado (convenio + contrato) de obra:		Monto total contratado (convenio + contrato) de obra:	
\$1,189,167.20		\$1,189,167.20	
Ing. Adán Burgos Morán		Ing. Oscar de la Cruz Ortiz	
DIRECTOR DE OBRAS		SUPERVISOR DE OBRAS	
		FORMATO 11	

*En caso de requerir más ítem en el apartado de estado financiero utilizar otro ítem.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BOUTEVAR ADOLFO RUIZ CORTINES, ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y PROLONGACION VILLA HERMOSA, EN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA: 2024308040175	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI		NO		X	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		CLAVE		N/A			
TIPO DE ZONA:		RURAL		URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO		X	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI		NO		X	

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LONGITUD		0.000000000	
LATITUD		0.000000000		0.000000000	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS		5 MILLAR		CANTOS ADICIONALES		IMPORTE NETO
	No.	MONTO	No.	MONTO	AVANCE CON IVA	MONTO	AVANCE	MONTO	
ANTICIPO	SP01	\$520,324.25	E4058	\$520,324.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,324.25
TOTALES		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,324.25

B) REPORTE		FECHAS	
EXISTE			
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00		
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00		
FINQUITO CON IVA:	\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCION:			

AVANCE FISICO REAL											
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	

FECHA DE ELABORACION:	17/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BOUTEVAR ADOLFO RUIZ CORTINES, ENIRE AVENIDA ACUEDUCTO Y PROLONGACION VILLA HERMOSA, EN LAS COLONIAS RAFAEL MURILLO VIDAL Y UNIDAD MAGISTERIAL EN XALAPA, VER.

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100%

MONTO AUTORIZADO:	\$1,800,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,800,000.00	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS	NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA:	CMAS	NO APLICA
FACTIBILIDAD:	EXISTE	X
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA	NO APLICA
LOS PERMISOS:	EXISTE	X
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitacion publica	

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-112-2024	FECHA:	16/08/2024
CONTRATISTA:	PEMARTE SA DE CV		
RFC:	PEM91010703A		
MONTO CONTRATADO:	\$1,734,414.17	PROGRAMADA	REAL
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO	17/08/2024	17/08/2024
	TERMINO	20/11/2024	24/11/2024
	DIAS	96	100
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$520,150.80	PORCENTAJE: 29.99
	FECHA DE PAGO:	27/08/2024	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULOS
MONTO AFIANZADO:	\$520,324.25	\$166,146.05	\$16,295.41
AFIANZADORA:	INSTITUCION DE GARANTIA	INSTITUCION DE GARANTIA	INSTITUCION DE GARANTIA
NO. DE FIANZA:	2951668	29516670	2984153
FECHA:	16/08/2024	16/08/2024	21/10/2024
CONVENIO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MODIFICATORIO:	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO	NO APLICA	X
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,734,414.17	C/IVA

Ing. Adam Burgos-Monfil	RESIDENTE DE OBRA EN FUNCIONES DE SUPERVISOR DE OBRA
Arq. Jabor Jarambá Jimenez	FORMATO 11

*En caso de requerir mas folios en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

A) PARTICIPACION Y DATOS GENERALES		DESCRIPCION DE LA OBRA:
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XALAPA-ENRIQUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:	2024300900127

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI		X		NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:							
TIPO DE ZONA:		RURAL		URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO		X	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI		X		NO	
CLAVE AGEB:		N/A					
MUY ALTO		ALTO		MEDIO		BAJO	
MUY ALTO		ALTO		MEDIO		BAJO	
DIRECTA		X		COMPLEMENTARIA			
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:		X		COMPLEMENTARIA		RESTRINGIDA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LATITUD		19.566173600		LONGITUD	
				-96.880186100			

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
PÓLIZAS CHEQUE			FACTURAS						
Nº. EST.	MONTO CON IVA	Nº.	MONTO	Nº.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	IMPORTE CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
LA	\$216,316.72	SPEI	\$148,624.50	AAA627	\$216,316.72	\$64,895.02	\$932.40	\$1,864.80	\$148,624.50
IN	\$1,157,675.49	SPEI	\$795,402.90	AAA626	\$1,157,675.49	\$347,302.65	\$4,589.98	\$9,979.96	\$795,402.90
ANTICIPO	\$775,595.31	SPEI	\$775,595.31	8D26C	\$775,595.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,595.31
TOTALES	\$1,373,992.21		\$944,037.40		\$1,373,992.21	\$412,197.67	\$5,922.38	\$11,844.76	\$1,719,622.71

B) REPORTE		EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:		\$944,027.40	15/11/2024
MONTO PAGADO ACUMULADO:		\$944,027.40	
FINIQUITO CON IVA:		\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:			

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	45	37	61	33
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	45	82	143	176
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	91	59	100	0

OBSERVACIONES:

<p>DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN PASEO POR EL CALLE VICENTE DOMÍNGUEZ, CALLE HIGUERAS, PRIVADA HIGUERAS, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA HIGUERAS, ANADADOR HIGUERAS, CALLE FRANCISCO VILLA, PRIVADA FRANCISCO VILLA, PROLONGACIÓN NACIMIENTO, CALLE FRANCISCO I. MADERO, PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, CALLE ANADADOR GARDENIAS, ANADADOR INDEPENDENCIA, ANADADOR</p>	<p>AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 100%</p>
<p>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:</p>	

MONTO AUTORIZADO:		\$2,850,000.00	CIVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$2,850,000.00	CIVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CNA5		NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE		NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA		EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-119-2024	FECHA:	18/09/2024
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES B & M SA DE CV		
RFC:	CB8,060823K37		
MONTO CONTRATADO:	\$2,585,317.71	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	18/09/2024	18/09/2024
	TERMINO	06/12/2024	31/11/2024
	DÍAS	80	65
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:	\$0.00	PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		0.00

TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$ 775,595.31	\$ 722,872.22	\$ 244,094.68
AFIANZADORA:		AL COMPAÑIA DE GARANTIA COMPANIA DE GARANTIA TOTAL FINANZAS ME		
NO. DE FIANZA:		BKY-0235-0270957	BKY-0235-0220968	BKY-0235-02300077
FECHA:		18/09/2024	18/09/2024	22/11/2024
		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO		MONTO	INICIAL	FINAL
MODIFICATORIO:		PLAZO		
		NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			\$ 2,585,317.71	C/IVA

Ing. Adán Burgos Madrid
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Juan Ortiz Lagunes
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:
03/12/2024
MES QUE SE REPORTA
NOVIEMBRE

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	XALAPA-ENRIQUEZ 2024/209090128	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, ENTRE LAS CALLES...

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:				ANTECEDENTES:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				SI	NO
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE:			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	AGEB:			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO					

	COORDENADAS DE GEOREFERENCIA	
X	LINEAL	COMPLETAMENTE RESTRINGIDA
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:		

AVANCE DEL 99%

MONTO AUTORIZADO:		\$850,000.00		CIVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$850,000.00		CIVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA	CMAS			
FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA	II. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.			
LOS PERMISOS:				
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE
		INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X
		LICITACIÓN PÚBLICA		

NO. DE CONTRATO:	CMAS-UP-121-2024	FECHA:	01/10/2024
CONTRATISTA:	ARQUITECTURA E INGENIERIA GONIVA SA DE CV		
RFC:	A0210006SD1		
MONTO CONTRATADO:	\$809,155.36	RE-AL	C/IVA
	PROGRAMADA	01/10/2024	01/10/2024
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO	25/11/2024	
	TERMINO		
	DIAS	60	61
	APLICA	X	NO APLICA
ANTICIPO:	MONTO:	\$247,746.61	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$242,746.61	\$69,754.77	
AFIANZADORA:	BERITY FIANZAS, SA DE CV	BERITY FIANZAS, SA DE CV	
No. DE FIANZA:	254-3577-00000	254-3578-00000	
FECHA:	01/10/2024	01/11/2024	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	FECHA
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$809,155.36		
	C/IVA		

Ing. Adán Bustos Morán
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Oscar Aguilar Ortiz
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
	SI	X	NQ	ANTECEDENTES:	
TIPO DE ZONA:					
RURAL					
URBANA					
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO					
CLAVE AGE:					
N/A					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO					
ALTO					
MEDIO					
Bajo					
MUY BAJO					
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:					
DIRECTA					
X					
COMPLEMENTARIA					
RESTRINGIDA					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD					
LONGITUD					
19.568463300					
-96.906901700					

[illegible]

	B) REPORTE	EXISTE	FECIUS
MONTOPAGADO EN EL MES:	\$0.00		
MONTOPAGADO ACUMULADO:	\$0.00		
PINTQUITO CON IVA:	\$0.00		
ACTA ENTREGARECEPCION:			

OBSERVACIONES:

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024



MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUETZ	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2024309050129	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA 3A PRIV. DE UNO SERRANO ENTRE UNO SERRANO Y FINAL DE LA PRIVADA Y AND. SIN ENTRE			

Cuenta con Proyecto Ejecutivo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Antecedentes: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Obras Realizadas con FISM-DF: CLAVE RURAL N/A		Grado de Rezago Social: MUY ALTO	
ZONA: URBANA		MUY ALTO	
AGEB: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		MAY BAJO	
SE Encuentra en una Zap: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		MUY BAJO	
SE Encuentra en el Catálogo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		MUY BAJO	

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LONGITUD	-96.930857000
LATITUD	19.577101500

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS		5 MILLAR		CARGOS ADICIONALES		IMPORTE NETO
	No.	MONTO	No.	MONTO	No.	MONTO	No.	MONTO	
ANTICIPO IN	SPEI	\$287,571.56	F485C	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$287,571.56
	SPEI	\$152,207.10	1171	\$65,635.78		\$943.04		\$0.00	\$152,207.10
TOTALES		\$218,785.92		\$152,207.10		\$943.04		\$0.00	\$419,778.66

B) REPORTE											
EXISTE						FECHAS					
MONTO PAGADO EN EL MES:						NOV					
						OCT					
MONTO PAGADO ACUMULADO:						SEP					
						AGO					
FINIQUITO CON IVA:						JUL					
						JUN					
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:						MAY					
						ABR					
						MAR					
						FEB					
						ENE					
						AVANCE					
						PROGRAMADO					
						REAL					
						ACUMULADO					
						ATRASO (%)					

OBSERVACIONES:	
MONTO PAGADO EN EL MES: \$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO: \$152,207.10	
FINIQUITO CON IVA: \$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	
TOTALES	
TOTALES	

TOTALES	
TOTALES	

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/12/2024	
MES QUE SE REPORTA: NOVIEMBRE	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA 3A PRIV. DE UNO SERRANO ENTRE UNO SERRANO Y FINAL DE LA PRIVADA Y AND. SIN ENTRE	
3A PRIV. DE UNO SERRANO Y FINAL DEL ANDADOR; Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN SERVIDUMBRE DE PASO ENTRE AND. 5A PRIV. DE UNO SERRANO, DE LA COLONIA AMBULACIÓN 21 DE MARZO EN	
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL 99.30%	

MONTO AUTORIZADO: \$1,150,000.00	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,150,000.00	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE	
DEPENDENCIA QUE VALIDA: CMAS	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA: CMAS	
FACTIBILIDAD: EXISTE X NO EXISTE	
PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE	
DEPENDENCIA QUE OTORGA: H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA	
LOS PERMISOS: EXISTE X	
TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA	
LICITACIÓN: INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	
LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO: CMAS-OP-114-2024	
FECHA: 10/09/2024	
CONTRATISTA: ECOMA SA DE CV	
RFC: ECOMA0808094	
MONTO CONTRATADO: \$958,571.88	
PROGRAMADA: REAL	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 11/09/2024	
TERMINO 29/11/2024	
DÍAS 51	
APLICA: NO APLICA	
MONTO: \$0.00	
PORCENTAJE: 0.00	
FECHA DE PAGO:	

TIPO DE FIANZA: ANTIPO	
MONTO FIANZADO: \$287,571.56	
FIANZADORA: INSTITUCIÓN DE GARANTÍA INSTITUCIÓN DE GARANTÍA	
No. DE FIANZA: 2955823	
FECHA: 10/09/2024	
EXISTE: IMPORTE/PERIODO	
CONVENIO: MONTO	
MODIFICATORIO: PLAZO	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO): NO APLICA X	
CONTRATO DE OBRA: \$958,571.88	
C/IVA	
Ine. Adán Burgos Montero	
DIRECTOR DE OBRAS	
RESIDENTE DE OBRA EN FUNCIONES DE SUPERVISOR DE OBRA	
FORMATO 11	



MUNICIPIO:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:	XALAPA-ENRIQUÉZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	INGRESOS PROPIOS		
No. DE OBRA:	202430909031		
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CARLOS R. SMITH, CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PRIMAVERA Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CARLOS R. SMITH, CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PRIMAVERA Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMAVERA, ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y ANDADOR VERANO, EN CALLE VERANO, ENTRE CALLES CEIBA Y PRIMAVERA Y ANDADOR VERANO, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y ELMAL DE ANDADOR.			
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 90%			
MONTOS AUTORIZADOS:		C/MVA	
MONTOS PRESUPUESTO BASE:		C/MVA	
VALIDACION DEL PROYECTO:		NO EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		CMAS	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE NO EXISTE NO APLICA X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
PERMISOS Y CONCESSIONES:		EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		II. AYUNTAMIENTO DE XALAPA	
TIPO DE LICITACION:		ADJUDICACION DIRECTA EXISTE X INVITACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA	
No. DE CONTRATO:		CMAS-OP-116-2024 FECHA: 10/09/2024	
CONTRATISTA:		A&A CONSTRUCTORA DEL GOLFO SA DE CV	
RFC:		ACG1402101SO	
Monto CONTRATADO:		\$1,098,332.57 C/MVA	
Periodo de Ejecucion:		INICIO 12/09/2024 REAL 11/09/2024 TERMINO 29/11/2024 Dias 80	
Anticipo:		Monto: \$0.00 NO APLICA X Fecha de pago: 0.00	
Tipo de fianza:		Anticipo Cumplimiento Vicios Ocultos	
Monto Afianzado:		\$329,499.77 \$94,683.81	
Afianzadora:		A INSTITUCION DE GARAN INSTITUCION DE GARAN	
No. de Fianza:		24450272 24450283	
Fecha:		10/09/2024 10/09/2024	
Convenio Modificatorio:		Monto Existe Importe/Periodo Fecha Plazo Inicial Final	
Monto Total Contratado (Convenio + Contrato) de Obra:		NO APLICA X \$1,098,332.57 C/MVA	
Ing. Adán Barrios Montiel DIRECTOR DE OBRAS			
Aco. Blanca Marcela Arredondo SUPERVISOR DE OBRAS			

ANTECEDENTES:									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:									
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
TIPO DE CLAVE									
ZONA: N/A									
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X									
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO									
COORDENADAS DE GEOREFERENCIA									
LATITUD LONGITUD -96.947951900									

ESTADO FINANCIERO DE OBRA *									
FACTURAS									
No. EST.	Monto con IVA	Pólizas Cheque	No.	Monto	Ingresos Obra	Monto con IVA	Avanzado con IVA	Cargos Adicionales	Importe Neto
IN	\$500,715.93	SPEI	410	\$348,342.89	\$500,715.93	\$150,214.78	\$0.00	\$0.00	\$348,342.89
Anticipo	\$329,499.77	SPEI	6C42D	\$329,499.77	\$329,499.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,499.77
TOTALES	\$500,715.93			\$348,342.89	\$500,715.93	\$150,214.78	\$0.00	\$0.00	\$677,842.66

B) REPORTE									
FECHAS									
Monto pagado en el mes:									
Existente \$348,342.89 28/11/2024									
Monto pagado acumulado:									
Finiquito con IVA: \$348,342.89									
Acta entrega recepción: \$0.00									
OBSERVACIONES:									

AVANCE FISICO REAL									
PROGRAMADO									
REAL									
ACUMULADO									
ATRASSO (%)									
DIE NOV OCT SEP AGO JUL JUN MAY ABR MAR FEB									
DIE NOV OCT SEP AGO JUL JUN MAY ABR MAR FEB									

En caso de requerir más folios en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA ENRIQUEZ		A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 2024309090132		DESCRIPCION DE LA OBRA:	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI		X		NO			
Obras realizadas con FISM-DF:		CLAVE		N/A		N/A			
ZONA:		URBANA		RURAL		MUY ALTO			
SE encuentra en una ZAP:		SI		NO		X			
SE encuentra en el Catálogo		SI		X		NO			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LONGITUD		-96.908043000		LATITUD		19.562520000	

ANTECEDENTES:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:		MUY ALTO		ALTO		MEDIO		BAJO		MUY BAJO		X	
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:		DIRECTA		X		COMPLEMENTARIA		N/A		N/A		N/A		N/A	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*											
No. EST.	Monto con IVA	POLIZAS CHEQUE		No.	Monto	No.	Monto	No.	Monto	No.	Monto
		No.	Monto								
ANTICIPO	\$227,125.81	5PEI	\$227,125.81	36875	\$0.00	\$227,125.81	\$0.00	5 MILLAR	\$0.00	CHARGES ADICIONALES	\$0.00
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00

B) REPORTE											
Monto pagado en el mes:	Monto pagado acumulado:	Finiquito con IVA:	Acta entrega recepción:	Existente	FECHAS						
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								

AVANCE FISICO REAL											
Avance	Programado	Real	Acumulado	Atraso (%)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL

OBSERVACIONES:		Ing. Heber Ali Montemira Medel	
		SUPERVISOR DE OBRAS	
		Ing. Adán B. López Montiel	
		DIRECTOR DE OBRAS	

FECHA DE ELABORACION:	17/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO AMARILLO, ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE RIO VERDE, DE LA COL. CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.	
DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
AVANCE FISICO DEL 97.60%	

Monto autorizado:	\$950,000.00	C/IVA	C/IVA
Monto del presupuesto base:	\$950,000.00	C/IVA	C/IVA
Validación del proyecto:	EXISTE	X	NO EXISTE
Dependencia que otorga:	CMAS	X	NO EXISTE
Dependencia que otorga la factibilidad:	CMAS	X	NO EXISTE
Factibilidad:	CMAS	X	NO EXISTE
Permisos y concesiones:	EXISTE	X	NO EXISTE
Dependencia que otorga los permisos:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA	X	NO EXISTE
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	NO EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	EXISTE	NO EXISTE
	LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE	NO EXISTE

No. de contrato:	CMAS-OP-117-2024	Fecha:	10/09/2024
Contratista:	CONSTRUCTORA GALMON SA DE CV		
RFC:	CGA100722HRI		
Monto contratado:	\$757,086.04	Programada	REL
		11/09/2024	11/09/2024
Periodo de ejecución:	INICIO	29/11/2024	51
	TERMINO	80	51
	DIAS	NO APLICA	X
Anticipo:	MONTO:	\$0.00	Porcentaje: 0.00
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
Monto afianzado:	\$227,125.81	\$65,766.04	
Afianzadora:	K. INSTITUCION DE GARAN INSTITUCION DE GARAN		
No. de fianza:	2957716	2957722	
Fecha:	10/09/2024	10/09/2024	
Convenio	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA </td
Modificatorio:	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA	X	
Monto total contratado (convenio + contrato) de obra:	\$757,086.04		

FORMATO 11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024



MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS No. DE OBRA: 202409090133	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4, ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y ANDADOR D. DE LA COLONIA PREDIO	

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:			
SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA:	CLAVE:	AGEB:	
URBANA	N/A		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	NO	

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LONGITUD	-96.907135000
LATITUD	19.551858000

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*				
FACTURAS				
No. EST.	MONTO CON IVA	MONTO	No.	IMPORTE NETO
ANTICIPO	\$549,314.90	\$549,314.90	00048	\$549,314.90

MONTO AUTORIZADO:	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,000,000.00
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CMAS
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE X NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	HL AYUNTAMIENTO DE XALAPA
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS
	LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO:	
CONTRATISTA:	H M PAVIMENTACIONES SA DE CV
REC:	CMAS-OP-120-2024
MONTO CONTRATADO:	\$1,831,049.66
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO 18/09/2024
	TERMINO 06/12/2024
	DÍAS 80
ANTICIPO:	APLICA X NO APLICA
	MONTO: \$0.00
	FECHA DE PAGO:
	FECHA: 18/09/2024

TIPO DE FIANZA:	
MONTO FIANZADO:	\$549,314.90
FIANZADORA:	AL COMPANIA DE GARANTIA COMPANIA DE GARAN
FECHA:	18/09/2024
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO EXISTE
	PLAZO FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,831,049.66

OBSERVACIONES:	
Ing. Civil Juan Ortiz Aguirre	
SUPERVISOR DE OBRAS	
Ing. Adán Burgos Montiel	
DIRECTOR DE OBRAS	
FORMATO 31	

*En caso de requerir más días en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	NO	X		
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:						
Tipo de Zona:	Clave	N/A				
RURAL	AGEB:	SI	NO	X		
URBANA		SI	X	NO		
¿SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:						
¿SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO						
Grado de Rezago Social:		MUY ALTO	ALTO	Bajo	MUY BAO	X
Tipo de Contribución del Proyecto:		DIRECCLA		X	COMPLEMENTARIA	RUS INICIADA
Coordenadas de Georreferencia		-96.895897100				
Latitud	Longitud	19.573669500				

[illegible][illegible]

Observaciones:

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	03/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		LOCALIDAD: XALAPA-ENRIQUEZ		A) PLANEACION Y DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 7024309090137		DESCRIPCION DE LA OBRA:	
				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR ARBOLEDAZ ENTRE CALLE TUXTEPEC Y FINAL DE LA CALLE DE LA COLONIA	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		ANTECEDENTES:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		SI	NO
TIPO DE	CLAVE		
ZONA:	AGEB:		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LONGITUD		LATITUD	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	Monto con IVA	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS		CARGOS ADICIONALES		Importe Neto	C/IVA
		No.	Monto	No.	Monto	5 MILLAR	Monto		
ANTICIPO	\$368,745.88	SI/PI	\$368,745.88	CE6A18	\$368,745.88	\$0.00	\$0.00	\$368,745.88	C/IVA

Monto con IVA		Monto con IVA		Monto con IVA		Monto con IVA		Monto con IVA	

B) REPORTE		FECHAS	
EXISTE			
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00		
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00		
FINQUITO CON IVA:	\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:			
OBSERVACIONES:			

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	51
ACUMULADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	90
ATRASSO (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPIO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$368,745.88	\$105,961.46	
AFIANZADORA:	BNAOCIONAL FINANZAS MERCANTIL FINANCIOS WEX		
No. DE FIANZA:	BKY-0235-0229937	BKY-0235-0229942	
FECHA:	01/10/2024	01/10/2024	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	X	\$10132.87
	PLAZO	INICIAL	FINAL
		02/10/2024	04/12/2024
NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,530,285.84	
		C/IVA	

OBSERVACIONES:		FECHAS	
Monto pagado en el mes:	EXISTE		
		Monto pagado acumulado:	
		Finiquito con IVA:	
		Acta entrega recepción:	

Ing. Adán Burgos Montiel

DIRECTOR DE OBRAS

Andrés Blázquez Arce-Hernández

SUPERVISOR DE OBRAS

FORMA 1011

Monto pagado en el mes:		FECHAS		
Monto pagado acumulado:	EXISTE			
Finiquito con IVA:				
Acta entrega recepción:				

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	LOCALIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS	No. DE OBRA:
XALAPA ENRIQUEZ	2024300900138
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIA ANDRAE ENTRE CALLES ANDRÉS BARRERA Y CALLE 13	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:				ANTECEDENTES:						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
TIPO DE ZONA:	CLAVE:	SI	X	NO	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
URBANA	URBANA	SI								
ENCUENTRA EN UNA ZONA:	AGEB:	SI								
DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:										
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HUANDERAS ENTRE CALLES CIRCUITO 1 Y ESTIADOROS, COL. MIGUEL ALEMÁN, EN XALAPA, VERACRUZ.										

_____	DIRECCIÓN	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
ACREDITACIÓN DE COORDINACIÓN				
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:				

AVANCE FÍSICO DEL 99%

MONTRO AUTORIZADO:		C/IVA	
MONTRO DEL PRESUPUESTO BASE:		C/IVA	
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CMAS		NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA	CMAS		NO APLICA
FACTIBILIDAD:			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA			NO APLICA
LOS PERMISOS:			H. AYOJAMIENTO DE XALAPA, VER.

TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE
ADJUDICACIÓN DIRECTA	X
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	
licitación pública	

NO. DE CONTRATO:	CMAS-OP-123-2024	FECHA:	01/10/2024
CONTRATISTA:	COMPANIA SERRANA DE CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA		
RFC:	SCM0904031U0		
MONTO CONTRATADO:	\$781,888.72	C/IVA	
	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/10/2024	01/10/2024
	TERMINO	29/11/2024	
	DIAS	60	61
	APLICA	X	NO APLICA
ANTICIPO:	MONTO:	\$234,566.62	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FLANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFANZADO:	\$234,566.62	\$67,404.20	
AFANZADORA:	MEXICO COMPANIA ARIA MEXICO COMPANIA ARIA		
No. DE FLANZA:	101303-00000	101307-00000	
FECHA:	01/10/2024	01/10/2024	
CONVENIO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO	INICIAL FINAL	
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO CONVENIO + CONTRATO DE OBRA:	\$781,888.77		C/VA

Ing. Adán Vargas Montiel
DIRECTOR DE OBRAS

FORMAT 11

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS						
	MONTTO CON IVA	No.	MONTTO	No.	IMPORTE CERRA MONTTO CON IVA ESTIMATIVO	ACREDITADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
IN ANTICIPO	\$451,746.19	SPEI	\$314,275.15	405	\$451,746.19	\$135,523.86	\$1,947.18	\$0.00	\$314,275.15
	\$234,566.62	SPEI	\$234,566.62	F299261	\$234,566.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,566.62
TOTALES	\$451,746.19		\$314,275.15		\$451,746.19	\$135,523.86	\$1,947.18	\$0.00	\$314,275.15

BIREPORTE		FECHAS	
EXISTE			
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$314,275.15	29/11/2024	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$314,275.15		
QUINQUITO CON IVA:	\$0.00		
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:			

OBSERVACIONES:



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACION:	03/12/2024
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

MUNICIPIO: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD: XALAPA, ENRIQUEZ		A) PLANEACION Y DATOS GENERALES		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JAZMIN ENTRE LA CALLE LUIS DORANTES Y CALLE ALFREDO SERRANO, COL. PORTON	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		No. DE OBRA: 20243090140		DESCRIPCION DE LA OBRA:	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		ANTECEDENTES:		DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		SI	NO	X	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JAZMIN ENTRE LA CALLE LUIS DORANTES Y CALLE ALFREDO SERRANO, COL. PORTON
TIPO DE ZONA:	CLAVE AGE:		N/A		COLORADO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES RUBI, ENTRE CALLES ANDADOR CORAL Y OLA, 1° DE MAYO, ENTRE CALLES RUBI Y SANTA CECILIA, PRIVADA 5 DEL LEBERON, ENTRE CALLES SANTA CECILIA Y FINAL DE GRANADA DE 5 DE FEBRERO Y
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X		
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI	NO	X		
		GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
		MUY ALTO	MEDIO	BAJO	
					MUY BAJO
		TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:			

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LONGITUD		DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	
0.00000000		0.00000000		AVANCE FISICO DE LA OBRA DE 88.50%	

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTOS CON IVA	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS		IMPORTE		C/IVA	
		No.	MONTOS	No.	MONTOS	5 MILLAR	CARRISG ADICIONALES	VALIDACION DEL PROYECTO:	NO EXISTE
ANTICIPO	\$283,341.68	SPEI	\$283,341.68	6084979	\$283,341.68	\$0.00	\$0.00	EXISTE	X
								CMAS	NO APLICA
								FACTIBILIDAD QUE OTORGA LA	X
								FACTIBILIDAD:	CMAS
								PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE
								DEPENDENCIA QUE OTORGA	X
								LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.
								TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA
									EXISTE
									X

NO. DE CONTRATO:		CMAS-OP-124-2024		FECHA:		01/10/2024	
CONTRATISTA:		INDUSTRIAS FRIVA SA DE CV					
RFC:		IFR200525013					
MONTOS CONTRATADOS:		\$944,472.26		PROGRAMADA		REAL	
		01/10/2024		01/10/2024		01/10/2024	
PERIODO DE EJECUCION:		INICIO		TERMINO			
		01/10/2024		06/11/2024			
		DIAS		35		61	
		APLICA		NO APLICA		X	
ANTICIPO:		MONTOS:		\$0.00		PORCENTAJE:	
				FECHA DE PAGO:		0.00	

TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO		CUMPLIMIENTO		VIGOS OCULTOS	
MONTOS AFIANZADOS:		\$283,341.68		\$81,470.02			
AFIANZADOR:		INSTITUCION DE GARANTIA INSTITUCION DE GARANTIA					
No. DE FIANZA:		2989048		2989048			
FECHA:		01/10/2024		01/10/2024			
CONVENIO		EXISTE		IMPORTE/PERIODO		FECHA	
MODIFICATORIO:		MONTOS		INICIAL		FINAL	
		PLAZO		NO APLICA		X	
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:				\$944,472.26		C/IVA	

OBSERVACIONES:		Ing. Adán Burgos Mancilla		Arq. Biadecia Anelli Flores		SUPERVISOR DE OBRAS	
		DIRECTOR DE OBRAS					
						FORMATO 11	

* En caso de requerir mas filas en el estado de estado financiero utilizar otra hoja.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2024


FECHA DE ELABORACION:
03/12/2024
MES QUE SE REPORTA
NOVIEMBRE

[illegible]

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090003	Período:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.	Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión:	17/12/2024

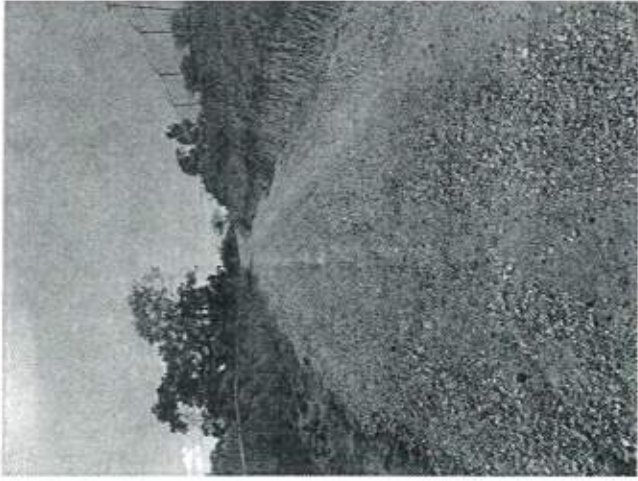



Concepto de obra ejecutado:	Estado actual de revestimiento con material de base tipo calizo	Concepto de obra ejecutado:	Estado actual de revestimiento con material de base tipo calizo
-----------------------------	---	-----------------------------	---

Observaciones:

Juan Ortiz Aguirre	Supervisor de Obras
ING. CIVIL	Profesión
C.C.P. Contralor Interno	
C.C.P. Tesorero Municipal	
C.C.P. Director de Obras Públicas	
C.C.P. Otros	

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



Municipio:		LOCALIDAD:		Ejercicio fiscal:	
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		XALAPA-ENRIQUEZ		EJERCICIO 2024	
No. de obra:		Periodo:		Número de estimación:	
2024300090008		NOVIEMBRE		INGRESOS PROPIOS	
Descripción:		Fecha de revisión:			
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA ENTRE CALLES AVENIDA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, CALLE DURAZNO		23/12/2024			

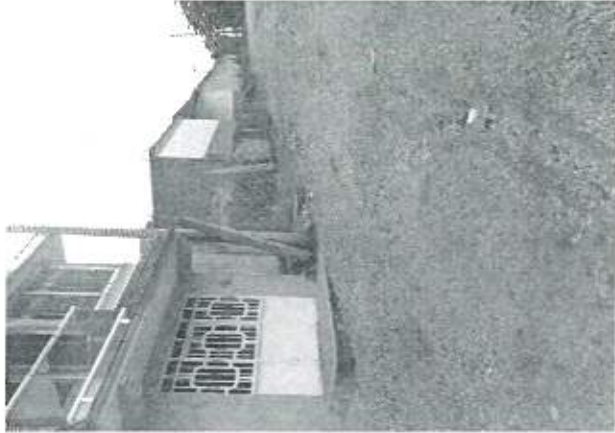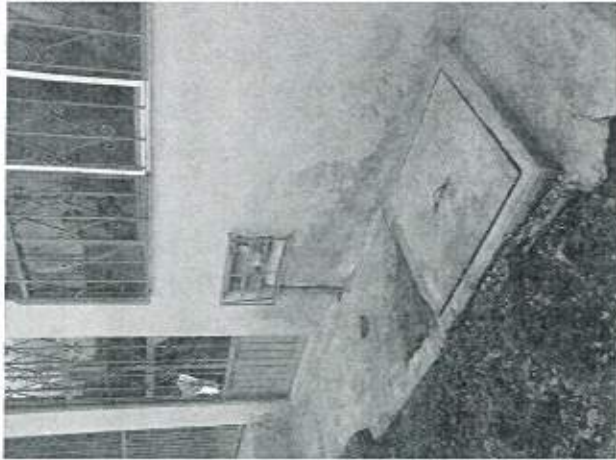

Concepto de obra ejecutado:	Concepto de obra ejecutado:	Concepto de obra ejecutado:
Rehabilitación de toma domiciliar y construcción de registro de albañal	tendido de base tipo caliza	
Observaciones:		
<div><div>Victor Hugo Hernández Pérez</div><div>Supervisor de Obras</div><div>ING. CIVIL</div><div>Profesión</div><div>Contralor Interno</div><div>Tesorero Municipal</div><div>Director de Obras Públicas</div><div>Ortis</div></div>		

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	20243009900009	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NISPEROS, ENTRE CALLE MIRADOR, ORQUIDEAS Y CALLE PORVENIR, COL. CERRO		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

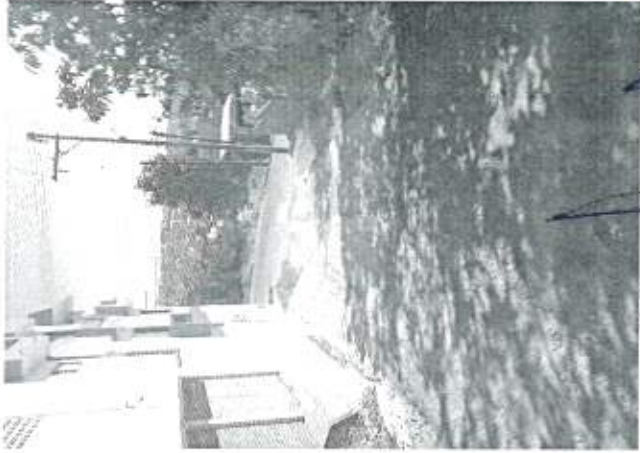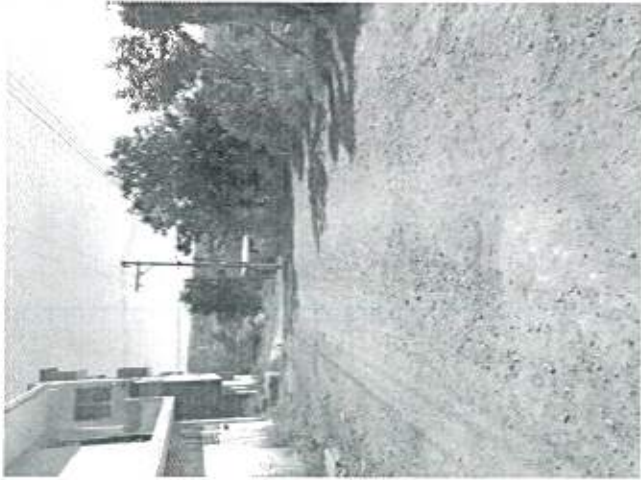

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de la obra

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Estado actual de la obra

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra

ARQ.

Profesión

Contralor Interno

Tesorero Municipal

Director de Obras Públicas


Orfis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


DATOS GENERALES

Municipio: INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024309090011 Periodo: NOVIEMBRE Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES HERREROS Y PINTORES (ENTRE AGUAS DE XALAPA Y LOS PINOS), Y Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
Fecha de revisión: 17/12/2024

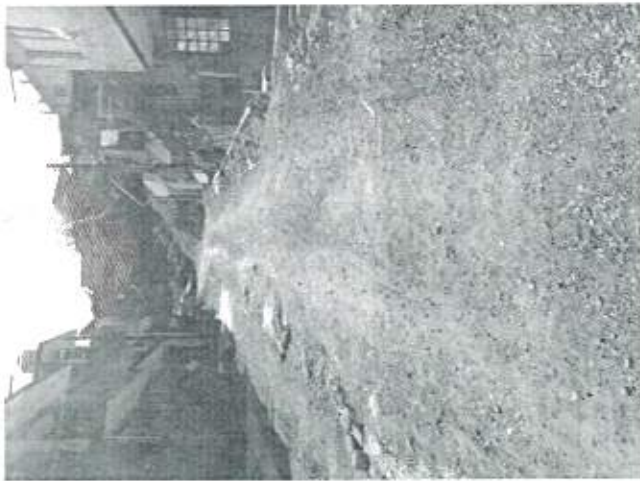

Estado actual de la obra

Concepto de obra ejecutado:

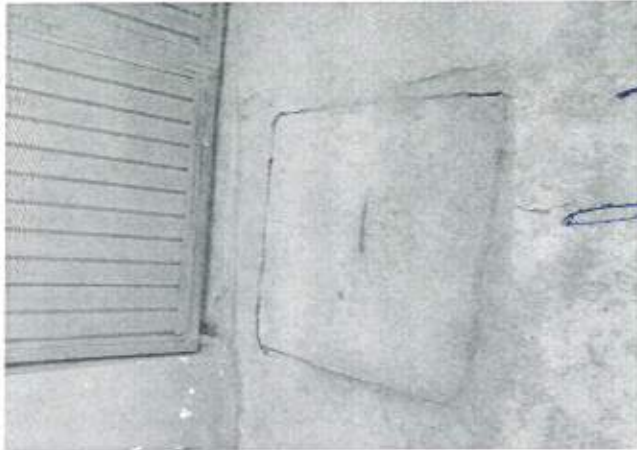

Registro sanitario

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de

Obra

ARQ.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno



C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	UNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090017	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JORGE L. CASTILLO ENTRE FINAL DE LA CALLE Y PROLONGACIÓN BOLIVIA, PRIVADA		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

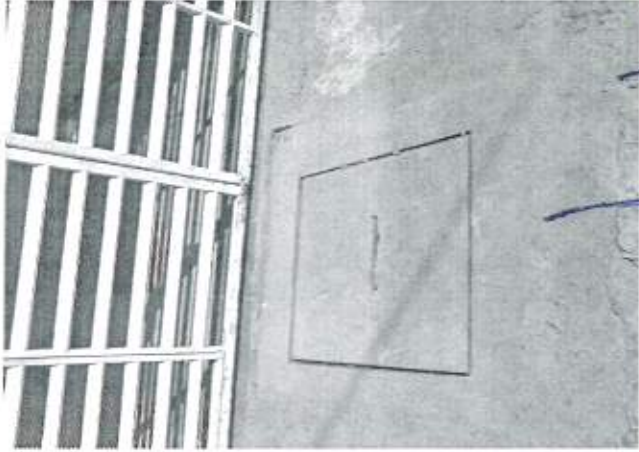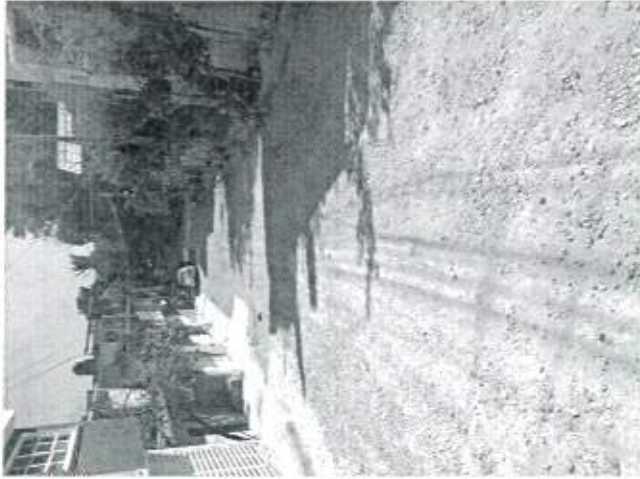

Concepto de obra ejecutado:

Tendido de piedra caliza

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Registro sanitario

Javier Jaimez Jiménez

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra


ARQ.

Profesión

- C.c.p. Contralor Interno
- C.c.p. Tesorero Municipal
- C.c.p. Director de Obras Públicas
- C.c.p. Orfís

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ
No. de obra:	2024309090019	Período:	NOVIEMBRE
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE (IRA, ETAPA) EN LA CALLE CAMINO REAL (ENTRE FINAL DE LA CALLE CAMINO REAL Y CALZADA LUZ DEL		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

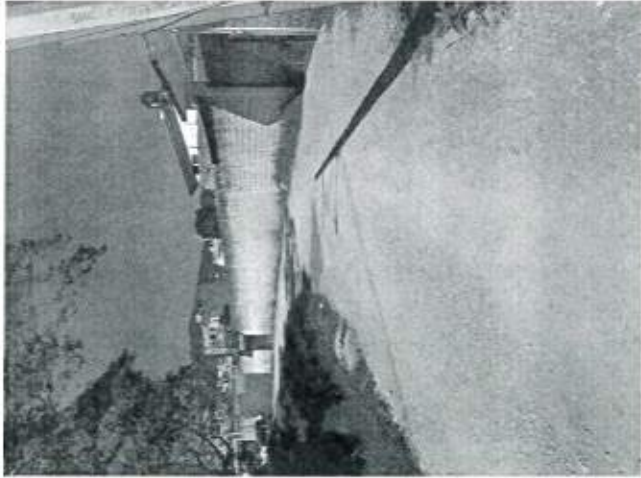

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de la obra

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Estado actual de la obra

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra

ARQ.

Profesión

C.c.p. Contralor Interno



C.c.p. Tesorero Municipal

C.c.p. Director de Obras Públicas

C.c.p. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2024309090020	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA SATURNO ENTRE AVENIDA VIA LACTEA Y CALLE ANTARES, COLONIA ARROYO		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

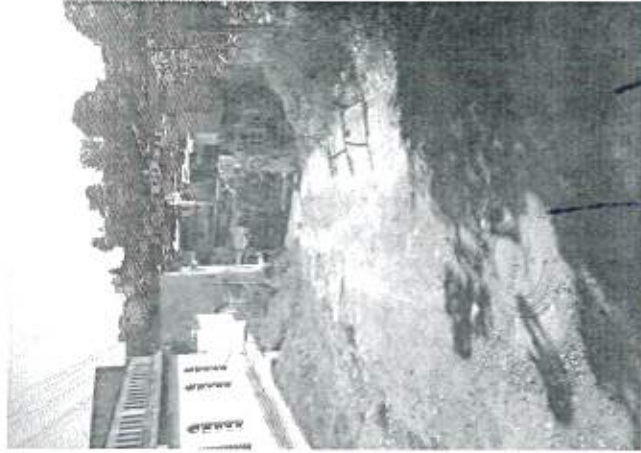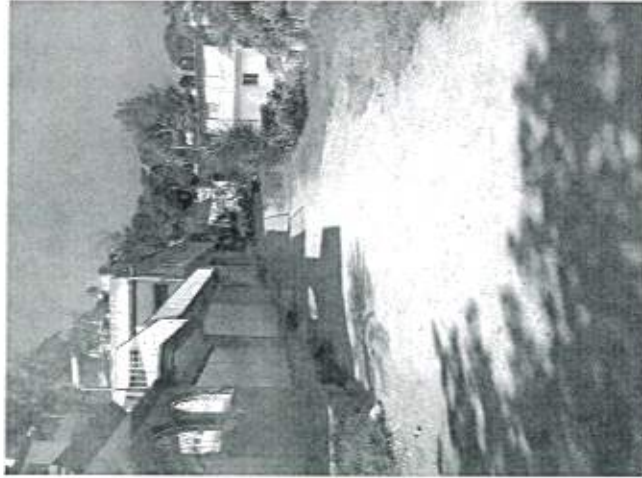

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de la obra

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de la obra

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra

ARQ.

Profesión

Contralor Interno

Tesorero Municipal

Director de Obras Públicas

Ortis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2024309050022	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA PRIMAVERA, ENTRE		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:

tendido de piedra caliza

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

registro sanitario
Rafael James Jiménez

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra

ARQ.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:

INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Localidad:

XALAPA-ENRIQUEZ

Ejercicio fiscal:

EJERCICIO 2024

No. de obra:

2024309090024

Periodo:

NOVIEMBRE

Número de estimación:

Descripción:


REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINOS ENTRE CALLES (PRINCIPAL Y COFRE DE PEROTE) Y EN CALLE

Fuente de financiamiento:

INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión:

17/12/2024

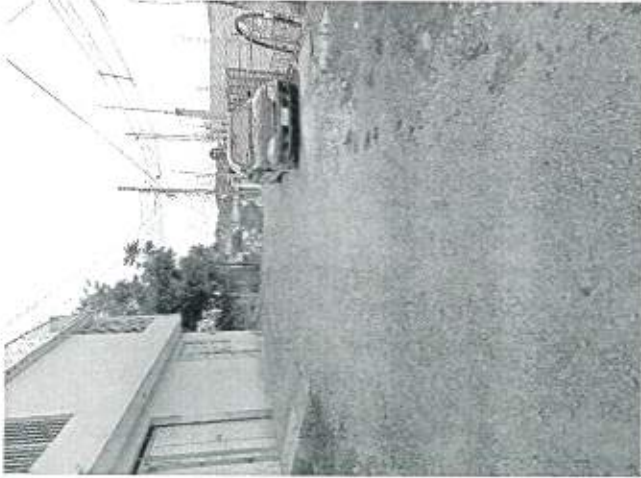

Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material calizo

Concepto de obra ejecutado:

construcción de registro albañal

Observaciones:

Carlos Gustavo Hernández Paredes

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

DATOS GENERALES



Observaciones:

C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JINICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 202430900035

Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE OYAMEL, ENTRE CALLES (FRESNOS Y PANAMÁ), EN CALLE ÉBANO, ENTRE CALLES

Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ


Período: NOVIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación:

Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 17/12/2024

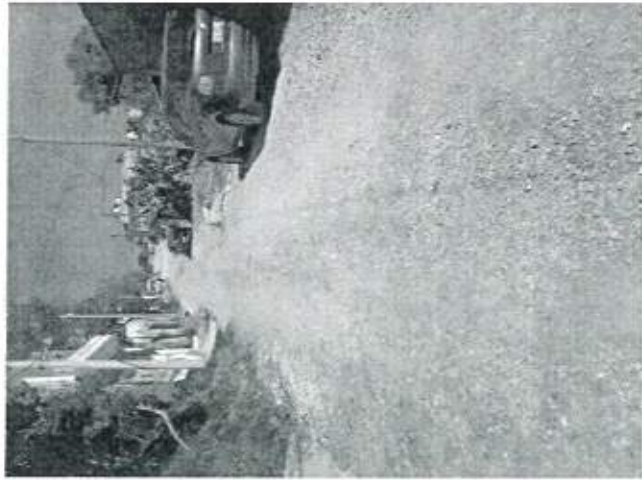

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de la obra

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Estado actual de la obra

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra

ARQ.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2024309090037	Período:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAMINO A AGUA SANTA, ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. LÁZARO CÁRDENAS EN		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:

Reposición de concreto

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Ruben Omar Morales Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

C.c.p. Contralor Interno

C.c.p. Tesorero Municipal



C.c.p. Director de Obras Publicas

C.c.p. Orfís

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090038	Período:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RÍO NAOLINCO, ENTRE CALLE RÍO SOTO DE LA MARINA Y RÍO COLOMBIA; CALLE	Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión:	17/12/2024

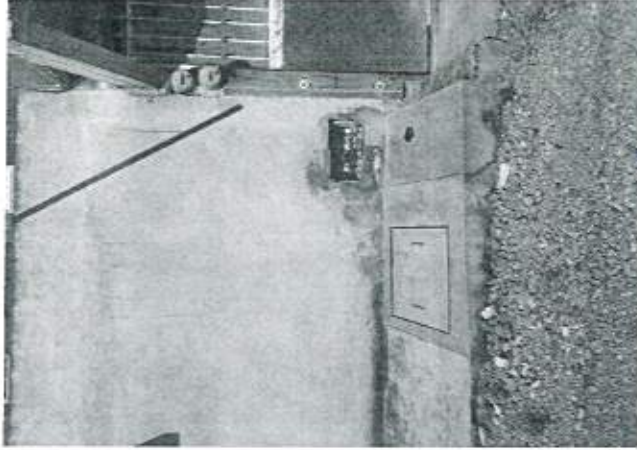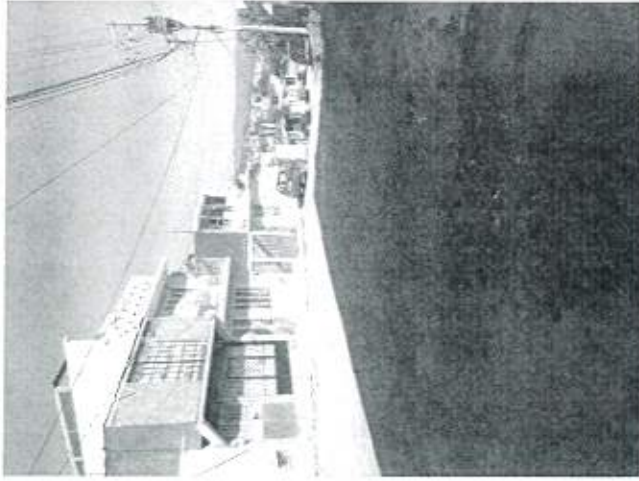

Concepto de obra ejecutado:	Revestimiento con material calizo en calle privada río Naolingo	Concepto de obra ejecutado:	Construcción de registro albañal y rehabilitación de toma domiciliaria en calle privada Río Naolingo
Observaciones:		Supervisor de Obras	Carlos Gustavo Hernández Paredes
		ARQ.	Profesión
		c.c.p.	Contralor Interno
		c.c.p.	Tesorero Municipal
		c.c.p.	Director de Obras Públicas
		c.c.p.	Orfís

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	20243090900039	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE AL CANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTES PINO, ENTRE AV. IZALCO Y AV. LAGO IGUAZU, EN CALLE LAGO ONTARIO.		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material calizo

Concepto de obra ejecutado:


rehabilitación de toma domiciliaria

Observaciones:

Supervisor de Obras
Carlos Gustavo Hernández Parodes
ARQ.
Profesión
Contralor Interno
Tesorero Municipal
Director de Obras Públicas
Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090043	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALcantarillado sanitario y red de agua potable en calle andador xalapa (entre Luis donaldo colosio y circuito)		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

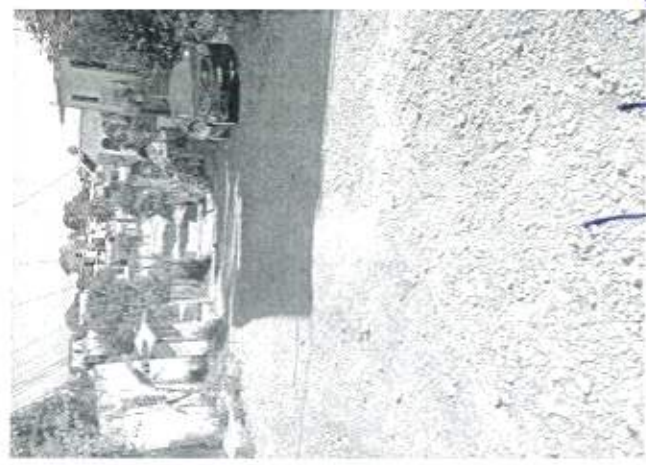

Concepto de obra ejecutado: Registro sanitario

Concepto de obra ejecutado: tendido de piedra caliza

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra

ARQ.

Profesión

☐ c.c.p. Contralor Interno


☐ c.c.p. Tesorero Municipal

☐ c.c.p. Director de Obras Publicas

☐ c.c.p. Ofis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090044	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A COATEPEC ENTRE CALLE ENRIQUE RODRIGUEZ Y CALLE ESMERALDA Y RED DE AGUA		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

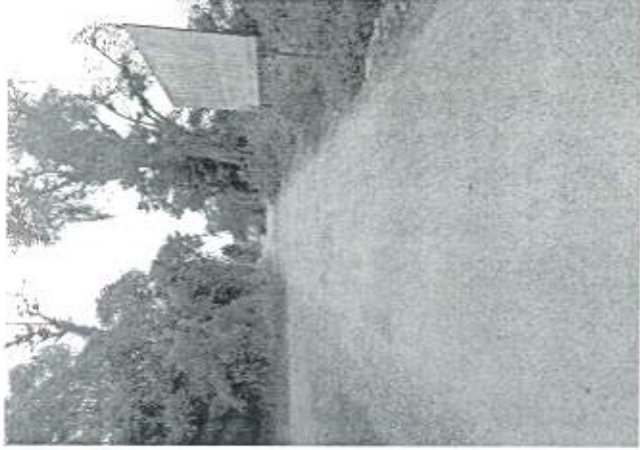

Concepto de obra ejecutado:

construcción de registro albañal

Concepto de obra ejecutado:


Revestimiento con material calizo

Observaciones:

Supervisor de Obras	
Carlos Gustavo Hernández Paredes	ARQ.
Profesión	
C.C.P. Contralor Interno	
C.C.P. Tesorero Municipal	
C.C.P. Director de Obras Publicas	
C.C.P. Orfis	

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


DATOS GENERALES			
Municipio:	JMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2024309090046	Período:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE		Número de estimación:
	LUIS FERNANDO ENTRE LAS CALLES PRIMAVERA Y FINAL DE LA CALLE LUIS FERNANDO DEL		Fuente de financiamiento:
			INGRESOS PROPIOS
			Fecha de revisión:
			17/12/2024

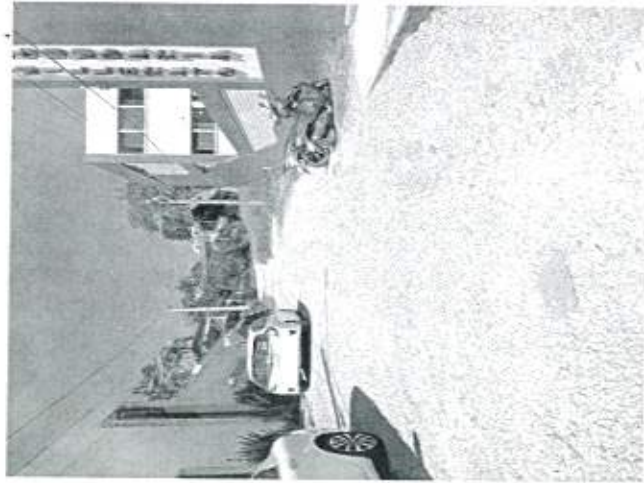

Concepto de obra ejecutado:

Tendido de piedra caliza

Concepto de obra ejecutado:

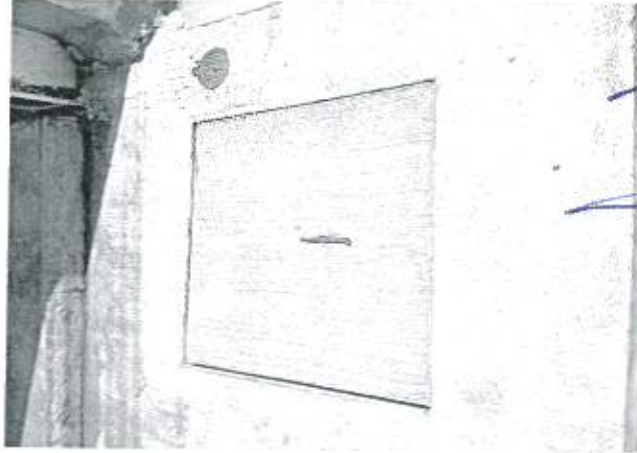

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra
ARQ.
Profesión
C.C.P. Contralor Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Ofis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ
No. de obra:	2024309090051	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS LASCURAIN, ENTRE PROLONGACIÓN LAS HAYAS Y RAYMUNDO SALAS,		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:

Tendido de piedra caliza

Concepto de obra ejecutado:


Tendido de piedra caliza

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de obra	
ARQ.	
Profesión	
C.C.P. Contralor Interno	
C.C.P. Tesorero Municipal	
C.C.P. Director de Obras Públicas	
C.C.P. Otros	

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	JMPCIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024-309050054	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENTRE VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA INSURGENTES Y		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

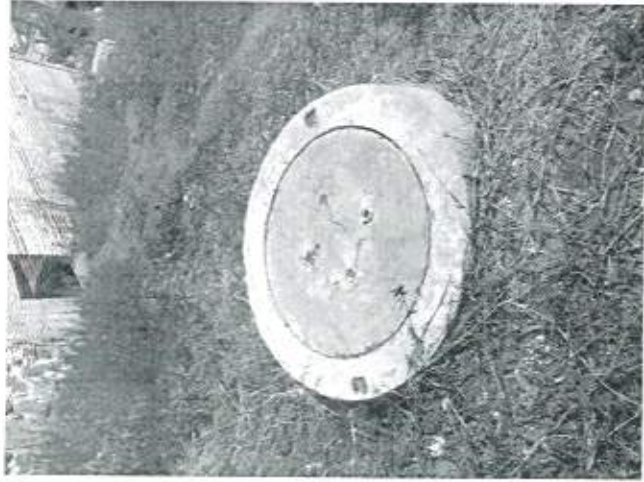

Concepto de obra ejecutado:

pozo de visita

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Estado actual de la obra

[Handwritten signature]

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra

ARQ.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal



C.C.P. Director de Obras Publicas

C.C.P. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	JMICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024-309090056	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO A SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES AZUCENA Y SANTA TEODORA EN LA			Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	17/12/2024

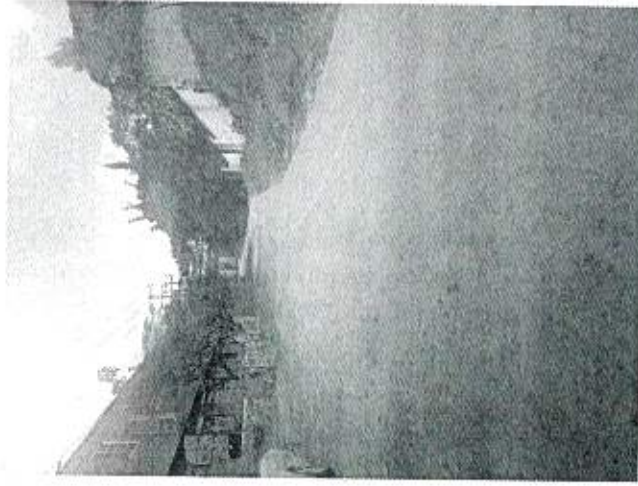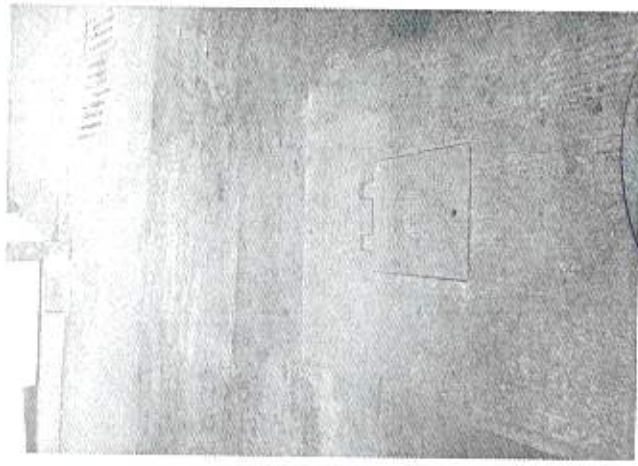	
Concepto de obra ejecutado: limpieza general de obra en calle santa rosa	Concepto de obra ejecutado: registro para movimientos de válvulas de 6 pulgadas en santa rosa
Observaciones:	<div><div>Víctor Hugo Hernández Pérez</div><div>Supervisor de Obras</div></div> <div>ING. CIVIL</div> <div>Profesión</div> <div>C.C.P. Contralor Interno</div> <div>C.C.P. Tesorero Municipal</div> <div>C.C.P. Director de Obras Públicas</div> <div>C.C.P. Orfis</div>

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090061	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Fuente de estimación: EJERCICIO 2024		
	MIGUEL BARRAGÁN, ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. LUIS DONALDO COLOSTIO, DE Ingresos propios: 17/12/2024		



Concepto de obra ejecutado:

pozo de visita en calle Miguel Barragán

Concepto de obra ejecutado:

toma domiciliaria en calle Miguel Barragán

Observaciones:

Víctor Hugo Hernández Pérez

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

C.c.p. Contralor Interno

C.c.p. Tesorero Municipal

C.c.p. Director de Obras Públicas

C.c.p. Orlis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ
No. de obra:	202430900062	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE 3, CON PREPARACIONES DE RED		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:	pozo de visita en calle rio lerma esquina rio sordo	Concepto de obra ejecutado:	visla general de registro albañil y tendido de caliza
-----------------------------	---	-----------------------------	---

Observaciones:	
----------------	--

C.C.P.	Contralor Interno
C.C.P.	Tesorero Municipal
C.C.P.	Director de Obras Públicas
C.C.P.	Orfis

Supervisor de Obras	ING. CIVIL
Víctor Hugo Hernández Pérez	Profesión

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	AYUNTAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090063	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE		
	CIRCUITO LAS FLORES, DE CAMINO AL SUMIDERO A CAMINO AL SUMIDERO, COLONIA EL		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:


construcción de caja de operación de valvulas

Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de toma domiciliaria

Observaciones:

Supervisor de Obras	
Carlos Gustavo Hernández Paredes	
ARQ.	Profesión
C.C.P.	Contralor Interno
C.C.P.	Tesorero Municipal
C.C.P.	Director de Obras Publicas
C.C.P.	Ofis



E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ		Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024/09/00064		Periodo: NOVIEMBRE		Número de estimación:	
Descripción: REHABILITACION DE RED DE DE AGUA POTABLE EN CALLE MAGNOLIA, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE JUAN PABLO ALDASORO CON REHABILITACION DE RED DE DE AGUA		Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS		Fecha de revisión: 17/12/2024	





Concepto de obra ejecutado:	tendido de base a base de caliza en magnolia	Concepto de obra ejecutado:	tomas domiciliaria en calle magnolia
Observaciones:		Supervisor de Obras	Víctor Hugo Hernández Pérez
		ING. CIVIL	Profesión
		C.C.P. Contralor Interno	
		C.C.P. Tesorero Municipal	
		C.C.P. Director de Obras Públicas	
		C.C.P. Orfís	



E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	INICIPIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090066	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE HUAJE (ENTRE PRIV. LAS DALIAS Y SALVADOR ALLENDE) (ENTRE NARANJOS Y HUAJE) DE LA				
	Fuente de financiamiento:				INGRESOS PROPIOS
	Fecha de revisión:				17/12/2024

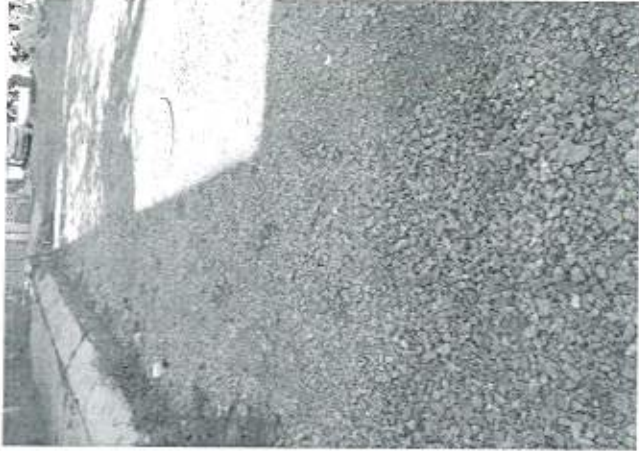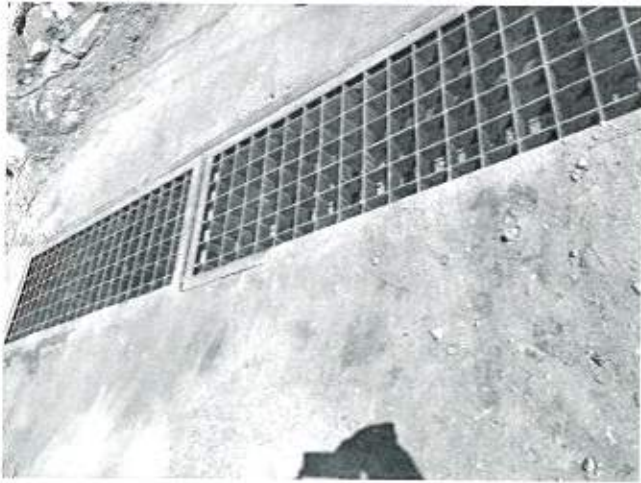

Concepto de obra ejecutado:

construcción de tragatormentais

Concepto de obra ejecutado:

colocación de material calizo

Observaciones:

Ruben Omar Morales Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

X.-C.P.

Contralor Interno

X.-C.P.

Tesoro Municipal

X.-C.P.

Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNIPICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024-309090068

Descripción: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE LACANDÓN, ENTRE CALLE CHEDRAUI CARAN Y CALLE KILIMANJARO, COLONIA HIGUERAS.

Localidad: XALAPA-ENRIQUÉZ


Periodo: NOVIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación:

Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 17/12/2024

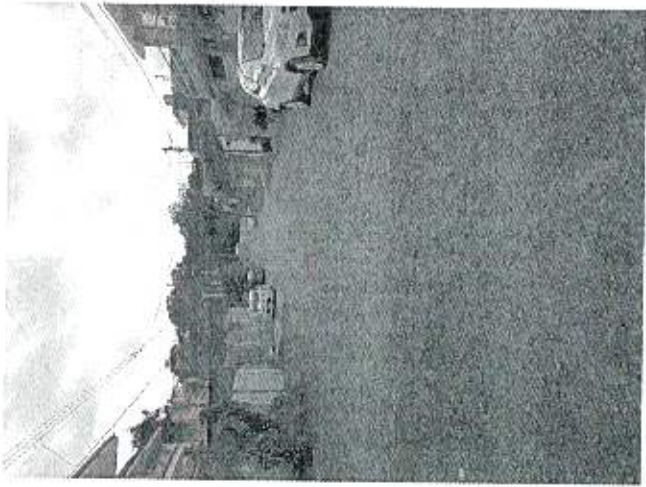

Concepto de obra ejecutado: Revestimiento con material calizo

Concepto de obra ejecutado: suministro e instalación de brocal de polietileno

Observaciones:

Supervisor de Obras

Carlos Gustavo Hernández Paredes

ARQ.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024


No. de obra: 2024-309090069

Periodo: NOVIEMBRE

Número de estimación: INGRESOS PROPIOS

Descripción: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LINO CHAVEZ ZAMUDIO, ENTRE CALLE LORENZO BARCELATA Y ELPIDIO

Fecha de revisión: 17/12/2024

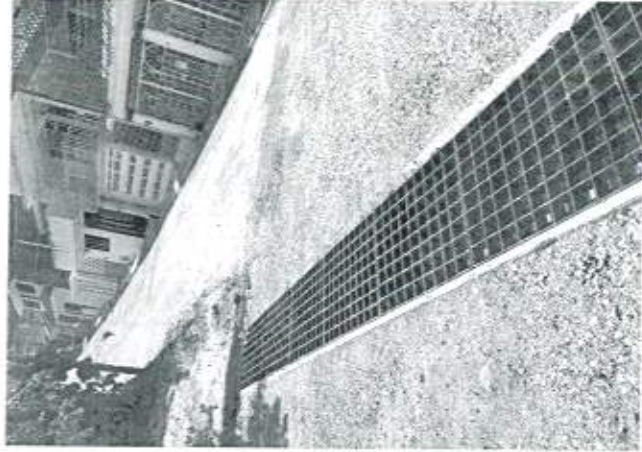

Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:

caja de válvulas y colocación de material calizo

construcción de traductormentas

Observaciones:

Supervisor de Obras

Ruben Omar Morales Bandala

ING. CIVIL

Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal


c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090070	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RUBÍ (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE INGRESOS PROPIOS				
				Fecha de revisión:	17/12/2024

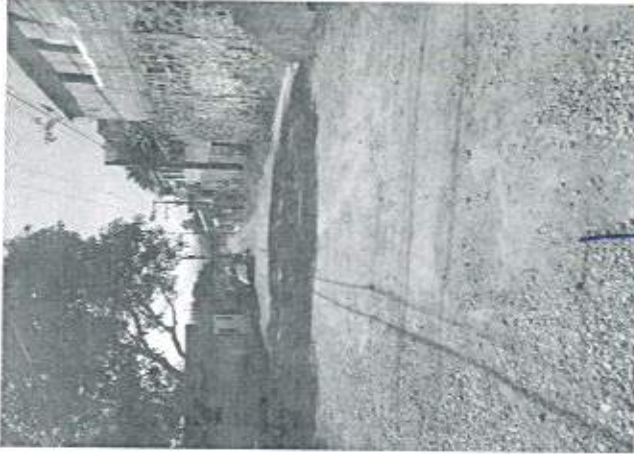

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de la obra

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Estado actual de la obra

Jahir Jaramol Jiménez

Residente de Obra en funciones de Supervisor de

Obra

ARQ.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309090071

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ROBLE ENTRE LAS CALLES OLMO Y CEDRO, EN LA CALLE CEDRO ENTRE LAS

Localidad: XALAPA-ENRIQUÉZ


Periodo: NOVIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación:

Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 17/12/2024

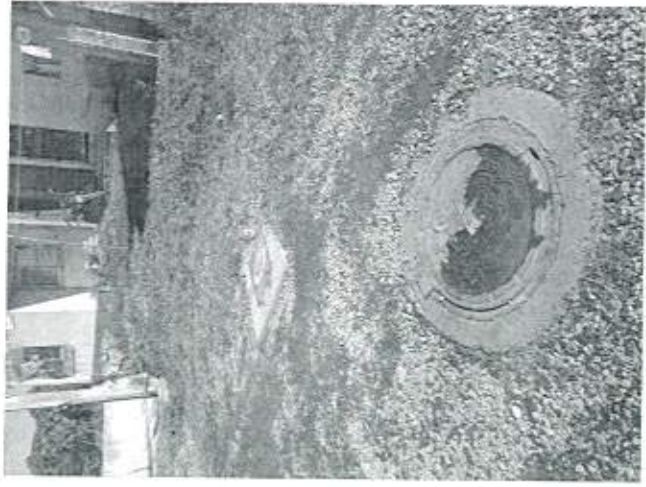

Concepto de obra ejecutado: registro de válvula de agua potable y pozo de visita sanitario

Concepto de obra ejecutado: tendido de base de caliza

Observaciones:

Otro en funciones de Supervisor de Obra

ING. CIVIL

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas


C.C.P. Orfis

Gilberto Montero Pérez

DATOS GENERALES

A black and white photograph showing a close-up of a rough, textured wall. A small, square, recessed opening is visible in the center-left. To the left of this opening, a portion of a building is visible, featuring a balcony with a railing and a satellite dish mounted on the wall. The image is oriented horizontally on the page.


E.C.P.
 E.C.P. Contralor Interno
 E.C.P. Tesorero Municipal
 E.C.P. Director de Obras P.
 E.C.P. Ofis




E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JINICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024305190073 Período: NOVIEMBRE Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL SUMIDERO ENTRE CALLES Fecha de revisión: 17/12/2024

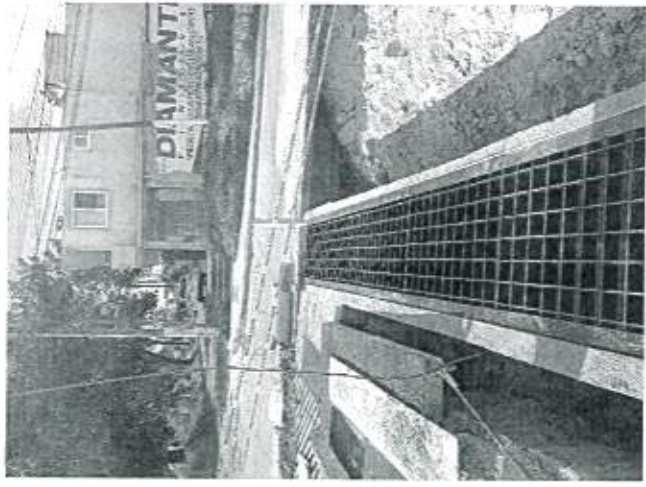

Concepto de obra ejecutado: construcción de traza tormentas

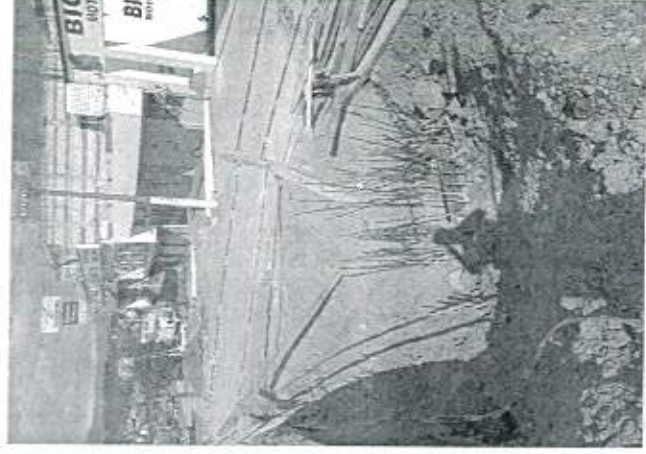


Concepto de obra ejecutado: rellenos con material de banco

Observaciones:

Supervisor de Obras
Carlos Gustavo Hernández Paredes
ARQ.
Profesión
C.C.P. Contralor Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090075	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NABOR TEJEDA, (ENTRE LA CALLE PROL. ADOLFO RUIZ CORTINES Y LIQUIDAMBAR) Y REHABILITACIÓN DE RED DE		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

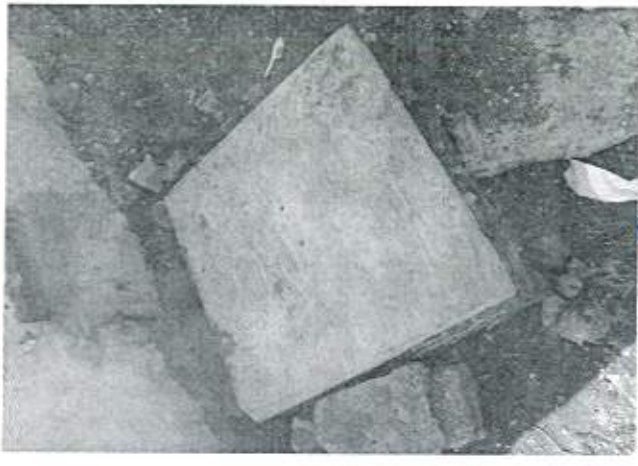


Concepto de obra ejecutado:	Estado actual de la caliza	Concepto de obra ejecutado:	Estado actual de registro sanitario
Observaciones:			
		Supervisor de Obras	
		ING.	
		Profesión	
		C.C.P. Contralor Interno	
		C.C.P. Tesorero Municipal	
		C.C.P. Director de Obras Publicas	
		C.C.P. Ofis	

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024309090077 Periodo: NOVIEMBRE Número de estimación: INGRESOS PROPIOS
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (CIRCUITO QUETZALCÓATL) ENTRE LAS CALLES TEMASCALTEPEC Y Fecha de revisión: 17/12/2024

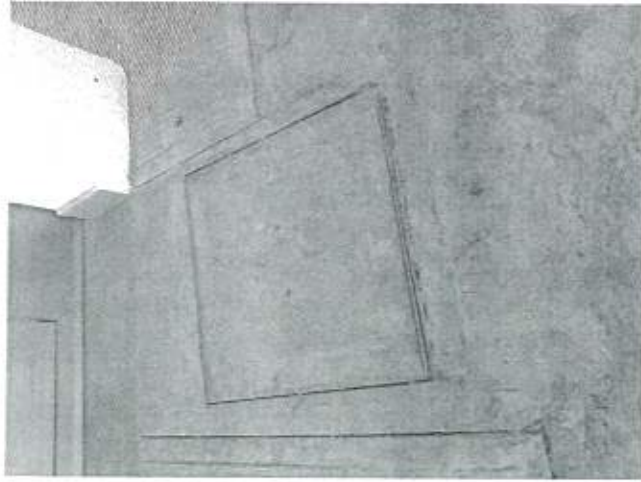

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de registro sanitario

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de toma domiciliar

Observaciones:

Heber Al Montemayor Nieves

Supervisor de Obras

ING.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfis

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: INIPIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309090078

Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ

Período: NOVIEMBRE


Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LA CALLE LAS PALMAS E INGENIO LA GLORIA, COL. NACIONAL Y

Número de estimación: INGRESOS PROPIOS

Fuente de financiamiento: 17/12/2024

Fecha de revisión:

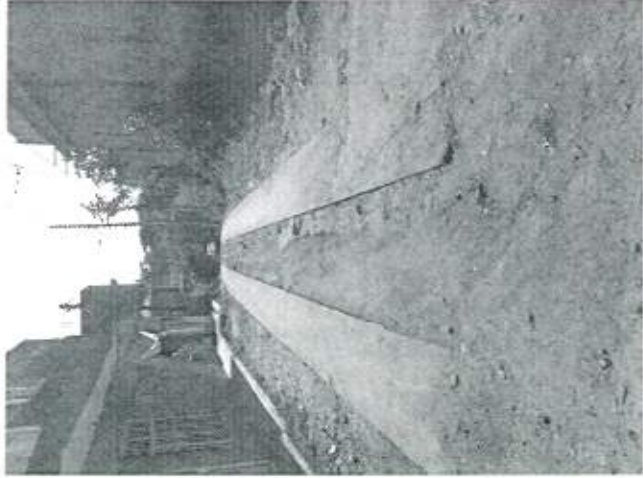

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de reposición de rampa

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de toma domiciliaria

Observaciones:

Supervisor de Obras

ING.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno


C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090080	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE TAJÍN ENTRE LAS CALLES PLAZA DE ARMAS Y HAYA; EN LA CALLE MAYA ENTRE LAS		
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	

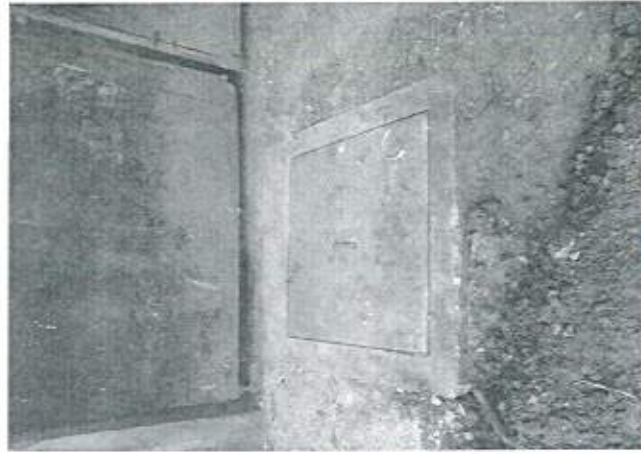

Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de registro sanitario

Observaciones:

Heber Ali Montemira Medel
Supervisor de Obras

ING.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Ofis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090081	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL MIRADOR, ENTRE CALLES AV. PRINCIPAL Y FINAL DE PRIVADA EL MIRADOR, DE LA COLONIA EL MORAL, REHABILITACIÓN		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de la caliza

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de registro sanitario

Observaciones:

Supervisor de Obras

ING.
Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orlis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090082	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y				
	REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS LAS TORRES,				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material calizo



Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de toma domiciliaria

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Marín

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno


C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas


C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	JNIPICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUIZ
No. de obra:	2024309090083	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS ARBOLEADAS DEL		
Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024		
Número de estimación:			
Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS		
Fecha de revisión:	17/12/2024		


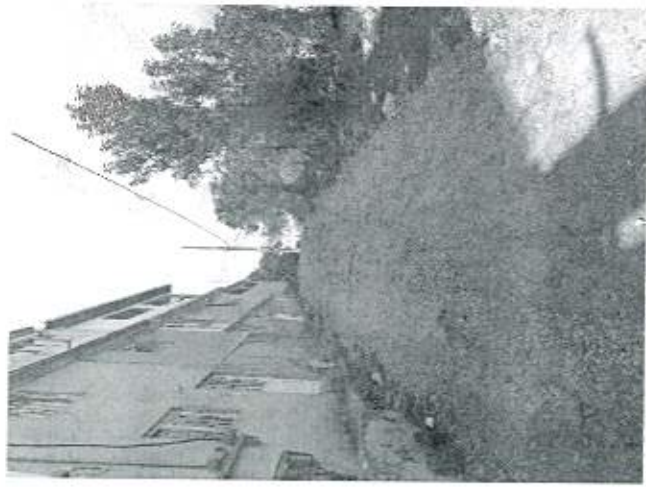


Concepto de obra ejecutado:	Revestimiento con caliza en calle privada Río Tecolutla	Concepto de obra ejecutado:	Rehabilitación de toma domiciliaria en calle privada Río Tecolutla
Observaciones:			
		<div>Luis Ángel Avelino Mann</div> <div>Supervisor de Obras</div>	
		ARQ.	
		Profesión	
		C.C.P. Contralor Interno	
		C.C.P. Tesorero Municipal	
		C.C.P. Director de Obras Públicas	
		C.C.P. Orfís	



E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ		Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024303091084		Periodo: NOVIEMBRE		Número de estimación:	
Descripción: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA MITIGACIÓN POR INUNDACIONES EN		Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS		Fecha de revisión: 17/12/2024	
ANDADOR PINOS, CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS MIXTAS.					

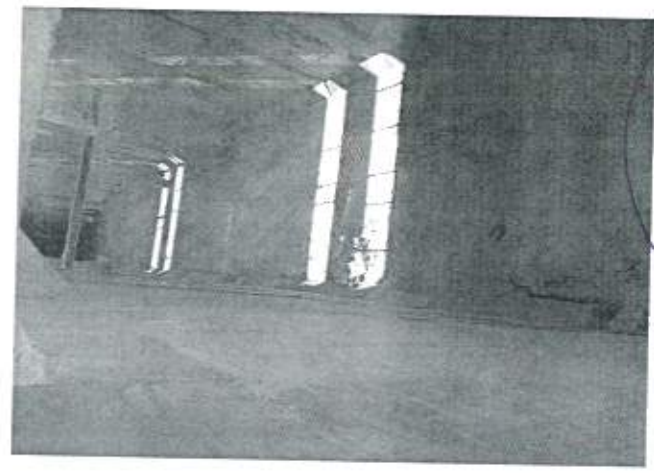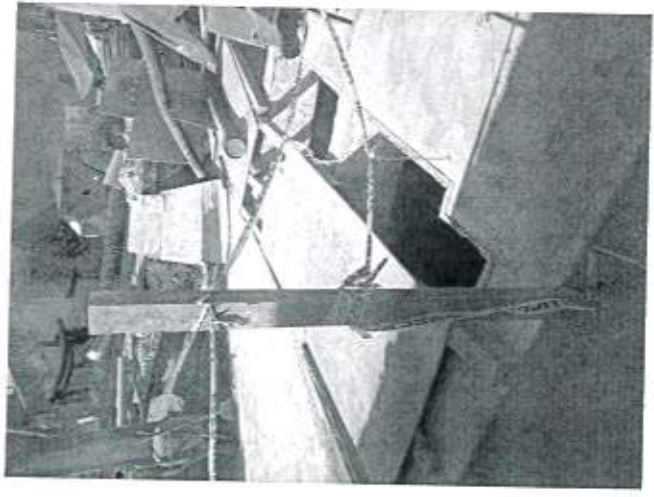

Concepto de obra ejecutado:	Concepto de obra ejecutado:
construcción del carcamo de bombeo losa superior	vista interna de los cajones en carcamo de bombeo
Observaciones:	
<div>Supervisor de Obras VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ PÉREZ ING. CIVIL Profesión C.C.P. Contralor Interno C.C.P. Tesorero Municipal C.C.P. Director de Obras Públicas C.C.P. Ofici</div>	

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		Localidad: XALAPA-ENRIQUETA		Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024305090085		Periodo: NOVIEMBRE		Número de estimación:	
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALcantarillado sanitario, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL, EN LA CALLE MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO, ENTRE LAZARO CÁRDENAS Y				Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	
				Fecha de revisión: 17/12/2024	

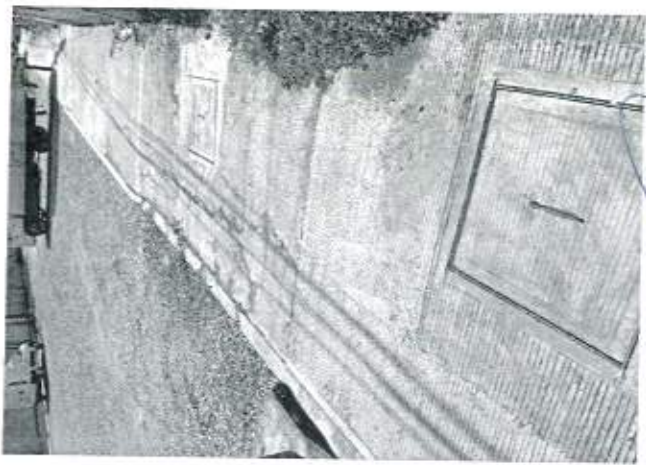


Concepto de obra ejecutado:	colocacion de caliza en calle María Enriqueta	Concepto de obra ejecutado:	reposición de registros y caliza en calle María Enriqueta
Observaciones:		Supervisor de Obras	Ruben Omar Morales Bandala
		ING. CIVIL	Profesión
		C.C.P. Contralor Interno	
		C.C.P. Tesorero Municipal	
		C.C.P. Director de Obras Públicas	
		C.C.P. Orfis	

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	JUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ
No. de obra:	207-4309090086	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALcantarillado sanitario en la calle calzada luz del barrio (entre residencial el encino y calle cerrada luz del barrio) y rehabilitación		
	Ejercicio fiscal:	Número de estimación:	
	EJERCICIO 2024		INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

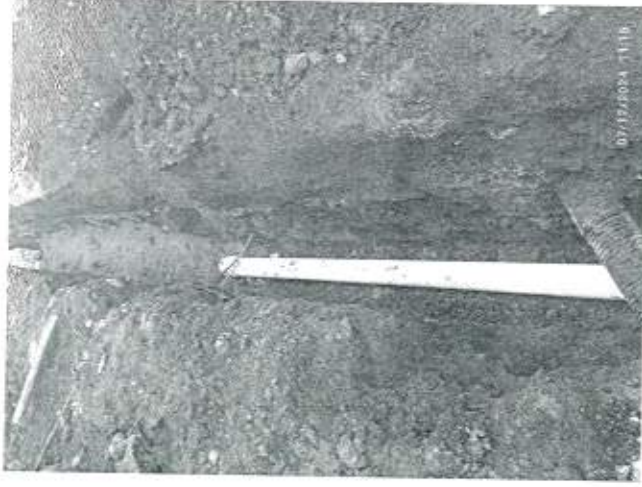

Concepto de obra ejecutado:

tubería de agua potable 6"

Concepto de obra
ejecutado:

06 open

Observaciones:

~~Bianca Aurora Anelli-Flores~~

Supervisor de Obras

ARO.

Profesión.

L.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

Í.C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309090088

Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PERLA, CONSTRUCCIÓN DE

Localidad: XALAPA-ENRIQUÉZ


Periodo: NOVIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación:

Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 17/12/2024

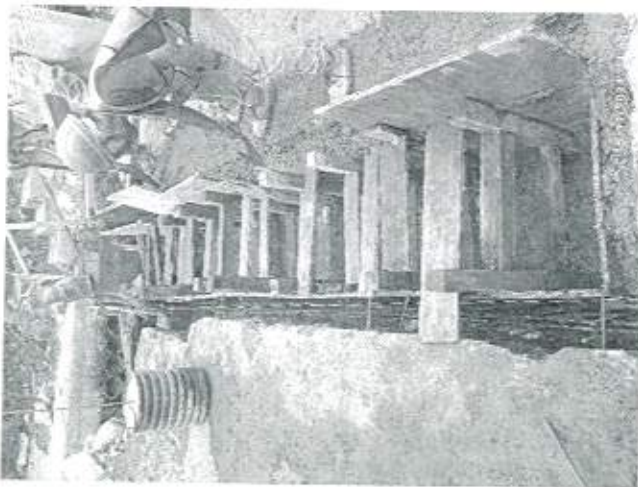

Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:

colado de muros en tragapiedras

construcción de pozo sanitario

Observaciones:

Supervisor de Obras

Blanca Aurora Angell Flores

ARQ.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno



c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Publicas

c.c.p. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ		Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024309090089		Periodo: NOVIEMBRE		Número de estimación:	
Descripción: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALcantarillado sanitario y red de agua potable en circuito Ceiba, (entre Álamo y José María Morelos), y		Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS		Fecha de revisión: 17/12/2024	

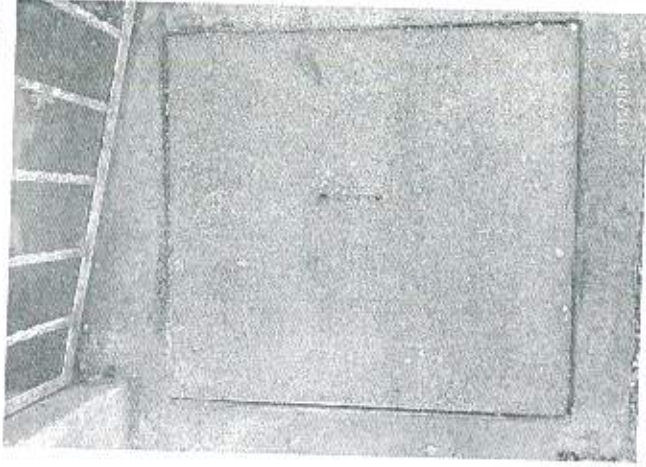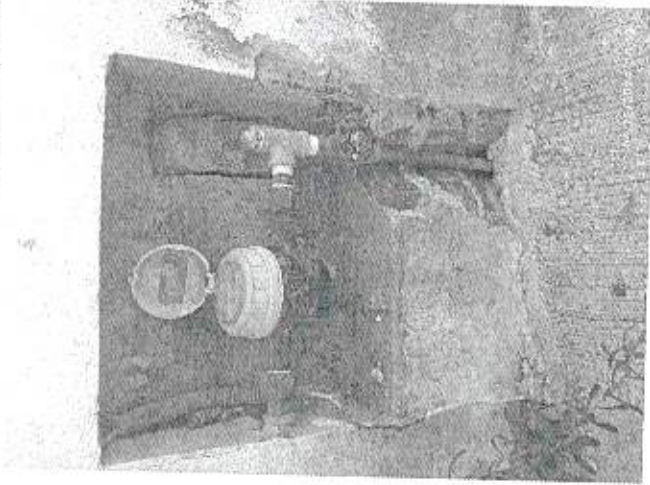

Concepto de obra ejecutado:

Toma domiciliaria

Concepto de obra ejecutado:

registro sanitario

Observaciones:

Brisca Aurora Anelli Flores

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

C.C.P. Controlador Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNIPICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309090090

Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CIRCUITO RÍO SEDENO Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLES (MANANTIAL DE


Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ

Periodo: NOVIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 17/12/2024

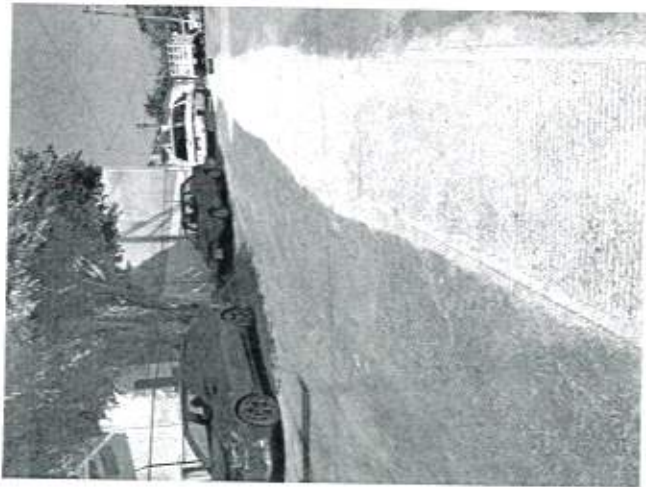

Concepto de obra ejecutado:

reposición con concreto hidráulico

Concepto de obra ejecutado:

reposición de concreto

Observaciones:

Supervisor de Obras

Ruben Ornela Morales Bandala

ING. CIVIL

Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas


c.c.p. Orfis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	202430090091	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (ENTRE ACUEDUCTO E HISTORIAS PREHISPANICAS), DE LA COLONIA	Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión:	17/12/2024

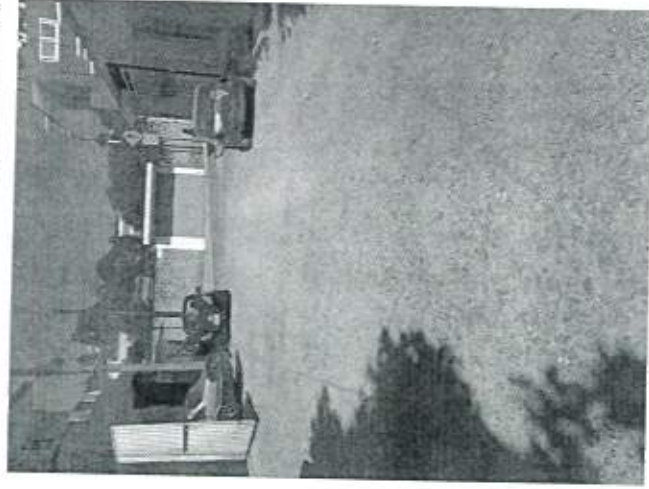

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de la obra

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de la obra

Observaciones:

Bianca Aurora Anelli Flores
Supervisor de Obras

ARQ. Profesión

C.C.P. Contralor Interno



C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024/309090092	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RÍO SECO, (ENTRE RÍO JORDÁN Y CAMINO ANTIGUO AL SUMIDERO); Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA		
Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024		
Número de estimación:			
Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS		
Fecha de revisión:	17/12/2024		

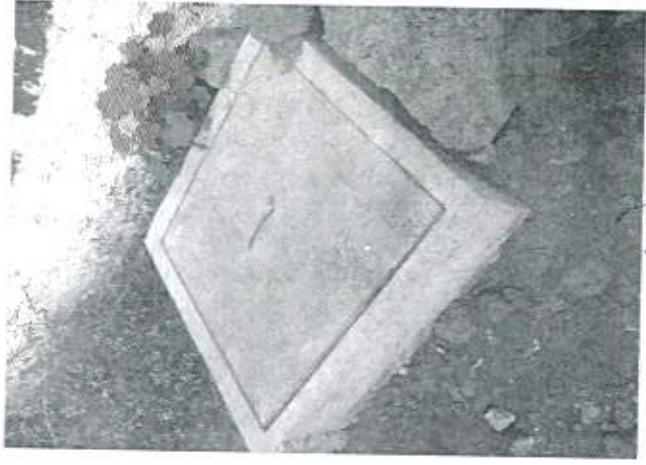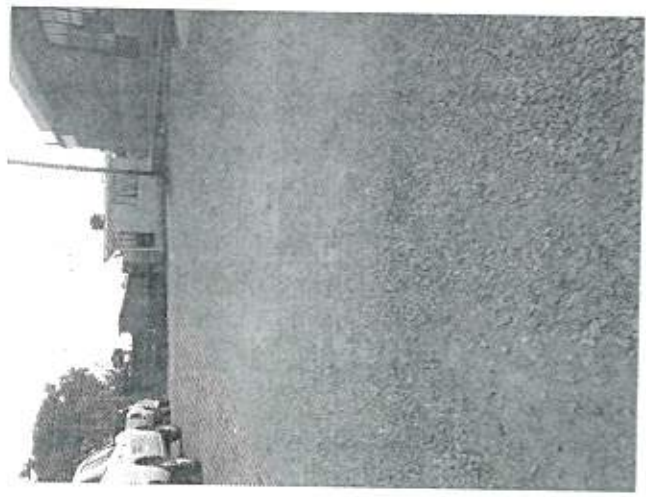

Concepto de obra ejecutado:	Estado actual de caliza	Concepto de obra ejecutado:
Observaciones:		Estado actual de registro sanitario
		Heber Almontemira Medel
		Supervisor de Obras
		ING.
		Profesión
		C.c.p. Contralor Interno
		C.c.p. Tesorero Municipal
		C.c.p. Director de Obras Públicas
		C.c.p. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUIZ
No. de obra:	202430090093	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LINDEROS, ENTRE CALLES (13 DE SEPTIEMBRE Y CHIBA) Y REHABILITACIÓN DE RED DE		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

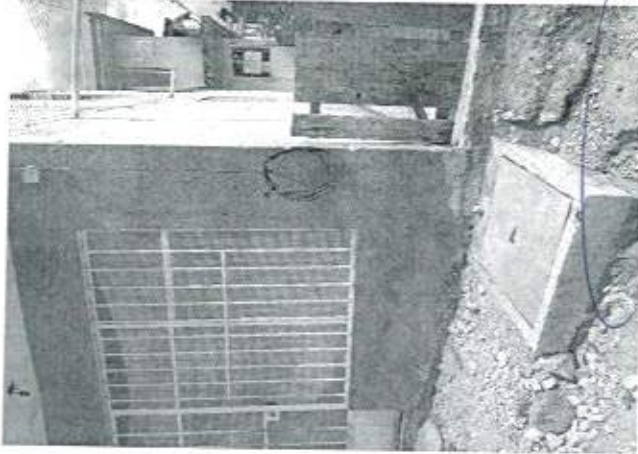


Concepto de obra ejecutado:	Concepto de obra ejecutado:	Rehabilitación de descarga domiciliar
Observaciones:		
<div>Luis Ángel Avelino Marín</div> <div>Supervisor de Obras</div> <div>ARQ.</div> <div>Profesión</div> <div>C.C.P. Contralor Interno</div> <div>C.C.P. Tesorero Municipal</div> <div>C.C.P. Director de Obras Públicas</div> <div>C.C.P. Orfe</div>		

RE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra: 2024309090096 Período: NOVIEMBRE
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
PAGANINI, (ENTRE AV. PASEO DE LAS ARAUCARIAS Y BEETHOVEN), DE LA COLONIA

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
Número de estimación:
Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
Fecha de revisión: 17/12/2024

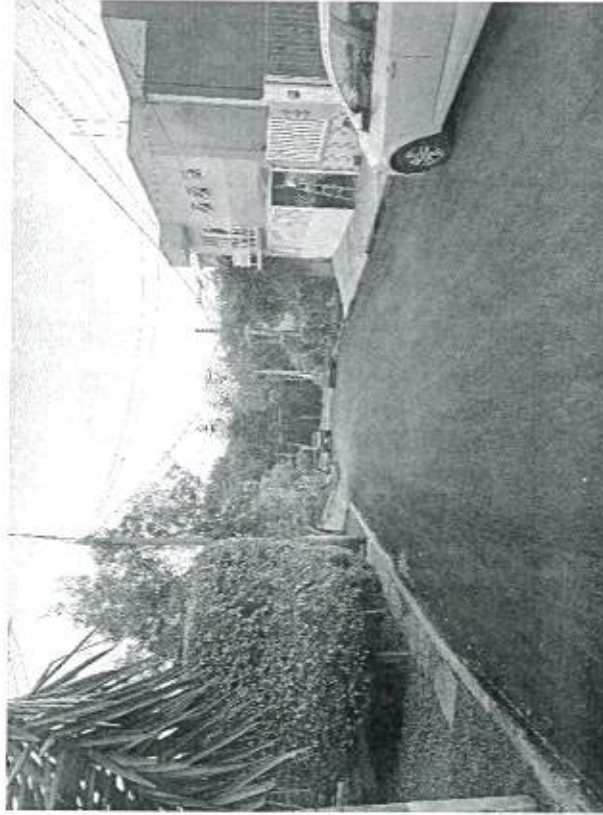

Concepto de
obra ejecutado:

Reposición de asfalto

Concepto de
obra ejecutado:

Registros rehabilitado



Ruben Omar Morales Bandala
Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

Observaciones:

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309090097

Descripción: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y VICENTE GUERRERO, COL. NACIONAL

Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ



Periodo: NOVIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación:

Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS


Fecha de revisión: 17/12/2024

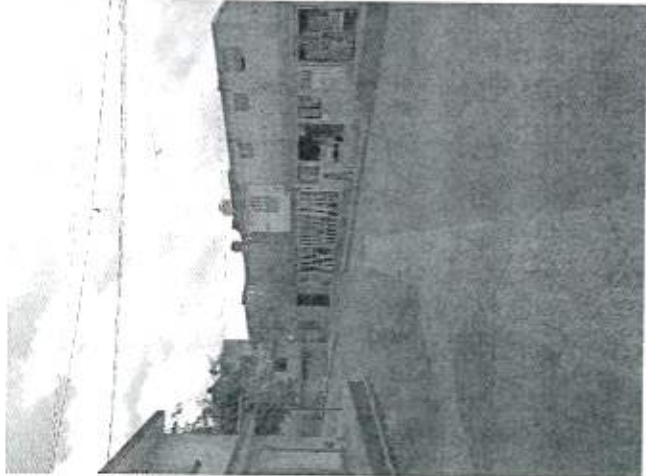	
Concepto de obra ejecutado:	Concepto de obra ejecutado:
Rehabilitación de pavimento	Caja de operación de válvulas
Observaciones:	
	<div><div>Luis Ángel Avelino Maín</div><div>Supervisor de Obras</div></div>
	<div>ARQ.</div> <div>Profesión</div> <div>c.c.p. Contralor Interno</div> <div>c.c.p. Tesorero Municipal</div> <div>c.c.p. Director de Obras Públicas</div> <div>c.c.p. Orfís</div>

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS



DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024-309090098	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SUR 6, (ENTRE FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ Y DIVISIÓN DEL NORTE), EN LA		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

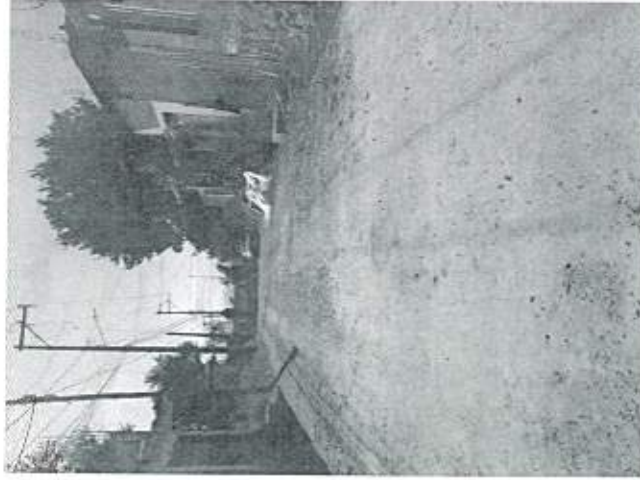

Concepto de obra ejecutado:	Estado actual de la obra	Concepto de obra ejecutado:	Estado actual de la obra
Observaciones:		<p><i>[Firma]</i></p> <p>Bianca Aurora Anelli Flores</p> <p>Supervisor de Obras</p>	<p>Estado actual de la obra</p>
		<p>ARQ.</p> <p>Profesión</p> <p>E.C.P. Contralor Interno</p> <p>E.C.P. Tesorero Municipal</p> <p>E.C.P. Director de Obras Públicas</p> <p>E.C.P. Orfís</p>	

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2024309090099	Período:	NOVIEMBRE
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALBERTO UREÑA, ENTRE CALLES (MACADAMIA Y PRIVADA ABEDUL), DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA EL		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

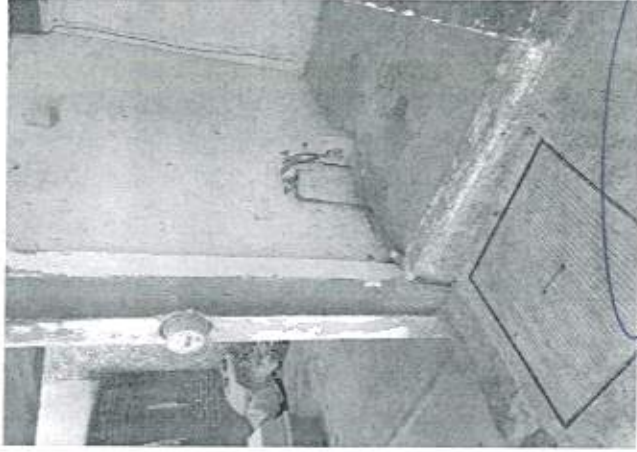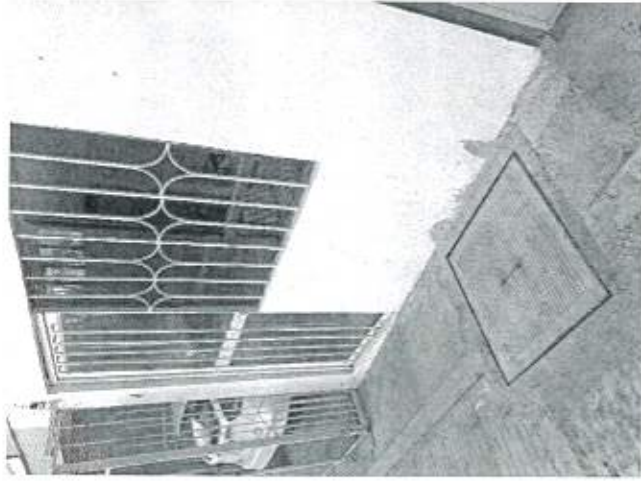

Concepto de obra ejecutado: 3 Rehabilitación de descarga domiciliaria en calle transversal 3

Observaciones:

Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de toma domiciliaria en calle transversal 3

Luis Ángel Avelino Marín

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno



c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfís

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	UNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2024309090100	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MONTES URALES, ENTRE CALLE PROLONGACIÓN JAMAICA Y AV. MONTE EVEREST, COL.		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

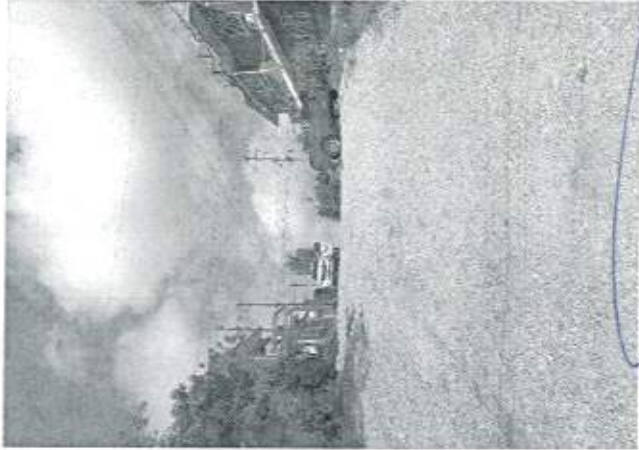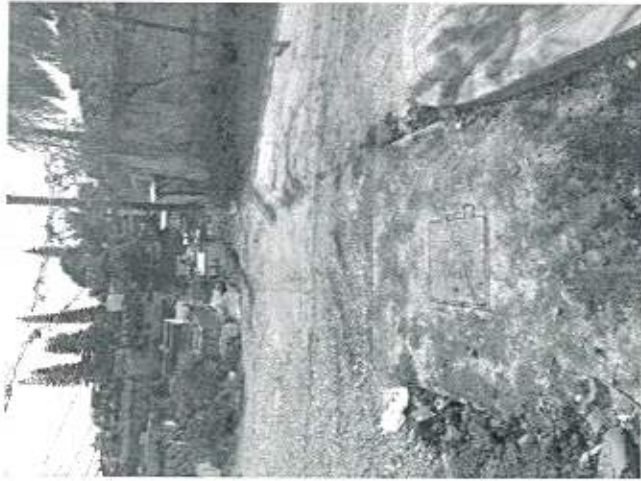

Concepto de obra ejecutado:	Caja de operación de válvulas en calle Montes Urales	Concepto de obra ejecutado:	Revestimiento con material calizo sobre calle Montes Urales
-----------------------------	--	-----------------------------	---



Observaciones:	
----------------	--

	Supervisor de Obras
ARQ.	Profesión
c.c.p. Contralor Interno	
c.c.p. Tesorero Municipal	
c.c.p. Director de Obras Públicas	
c.c.p. Orffs	

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
FOLIO 039

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	202-43090501102	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE REHABILITACIÓN DE TRAGATORIAS EN LA CALLE PRIV. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA.		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

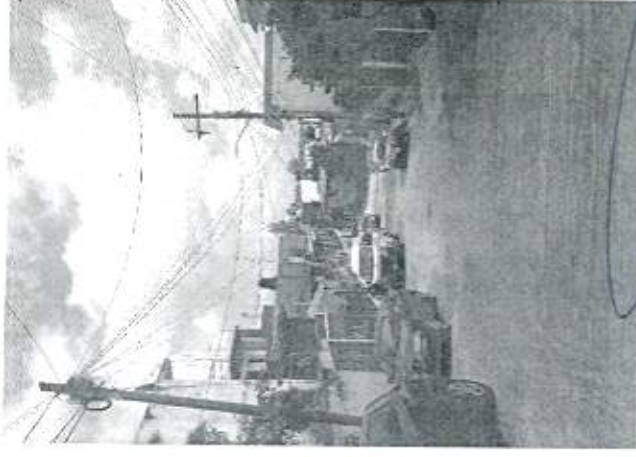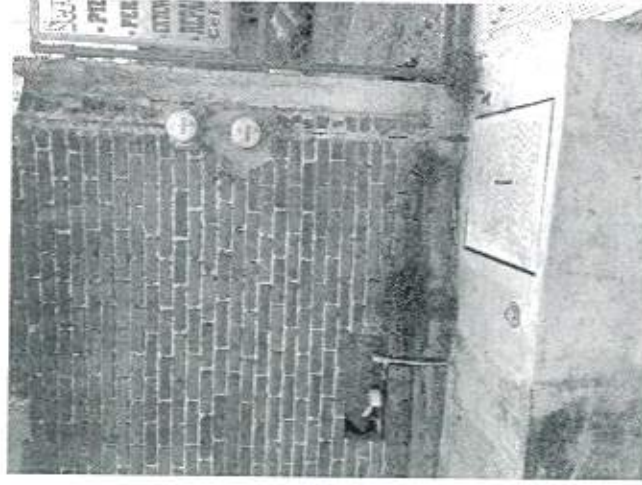

Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de descarga y toma domiciliaria

Concepto de obra
ejecutado:

Rehabilitación de pavimento

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Marin

Supervisor de Obras

420

Profesión

Contralor Interno

Σ.Σ.Π. Tesorero Municipal

Í.C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.D. Orfis


AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
FORMATO 002

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES					
Municipio:	JUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090103	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACION DE LA RED DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MOA ENTRE LAS CALLES FLAMINGOS Y FINAL DE CALLE MOA EN LA COLONIA ZIPOR.			Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	17/12/2024




Concepto de obra ejecutado:	Concepto de obra ejecutado:
reposición de concreto hidráulico	
Observaciones:	
Oscar Jair Reyes Ortiz Supervisor de Obras	ING. Profesión
	C.C.P. Contralor Interno
	C.C.P. Tesorero Municipal
	C.C.P. Director de Obras Públicas
	C.C.P. Otros



E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ
No. de obra:	2024309090104	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE GAVILANES, IGNACIO ZARAGOZA, 2DA. PRIV. DE IGNACIO ZARAGOZA, CALLES SIN		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

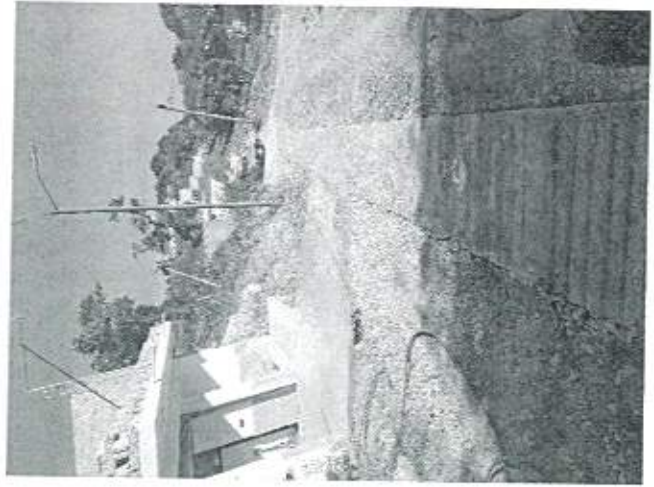

Concepto de obra ejecutado: Reposición de rodada en concreto sobre Fidel Herrera

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra


ARQ.

Profesión

- C.C.P. Contralor Interno
- C.C.P. Tesorero Municipal
- C.C.P. Director de Obras Públicas
- C.C.P. Orfis


E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	202430909105	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENCINOS, ENTRE CALLE DURAZNOS Y AV. TREBOL, COLONIA LOS PRADOS Y		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

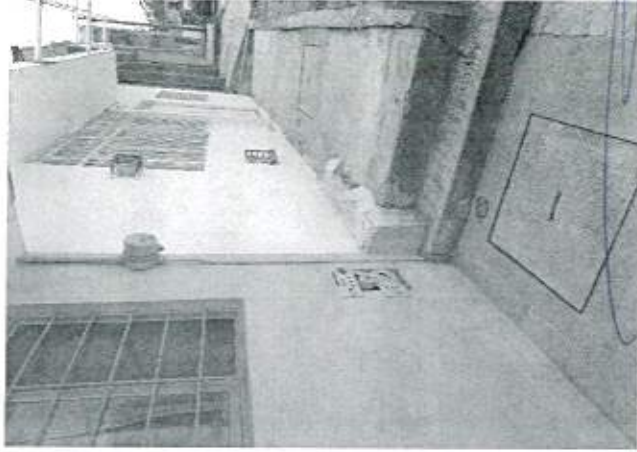

Concepto de obra ejecutado:	Revestimiento con material calizo en calle Río Colorado
Concepto de obra ejecutado:	Rehabilitación de descargas domiciliarias en calle Río Colorado

Observaciones:


Luis Angel Avalino Manrí
Supervisor de Obras

ARQ. Profesión

C.C.P. Contralor Interno
C.C.P. Tesorero Municipal
C.C.P. Director de Obras Públicas
C.C.P. Orfis


E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ		Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024309090106		Periodo: NOVIEMBRE		Número de estimación:	
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CHOFERES, COL. ARBOLEDAS DEL		Fuente de Financiamiento:		INGRESOS PROPIOS	
		Fecha de revisión:		17/12/2024	



Revestimiento con caliza en calle Arrayanes

Concepto de obra ejecutado:

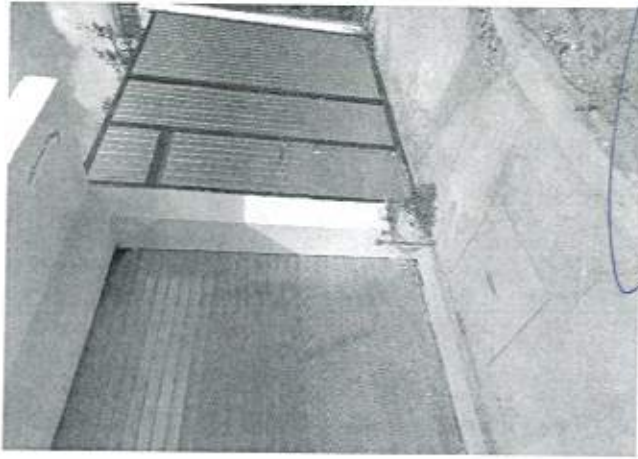

Rehabilitación de descarga y toma domiciliaria sobre calle Arrayanes

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Márin

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno


C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orlis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090107	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JUPITER ENTRE LA AV. POPOCATEPETL Y FINAL DE LA CALLE, CALLE VENUS ENTRE CALLE		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

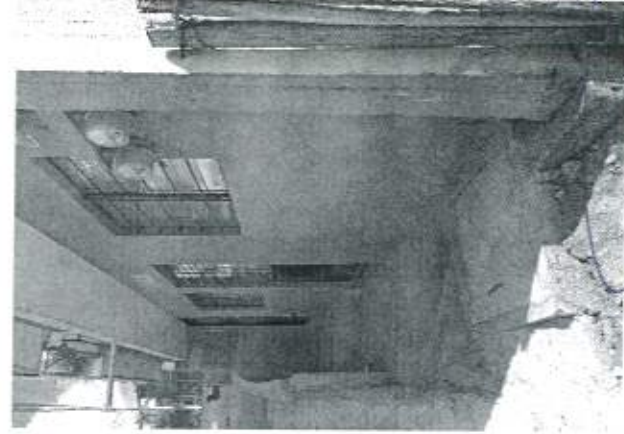

Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de pavimento

Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de descarga domiciliaria

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Martín
Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

C.C.P.

Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: JNIPICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024


No. de obra: 2024309090109

Periodo: NOVIEMBRE

Número de estimación: INGRESOS PROPIOS

Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (ENTRE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE VICENTE)

Fecha de revisión: 17/12/2024

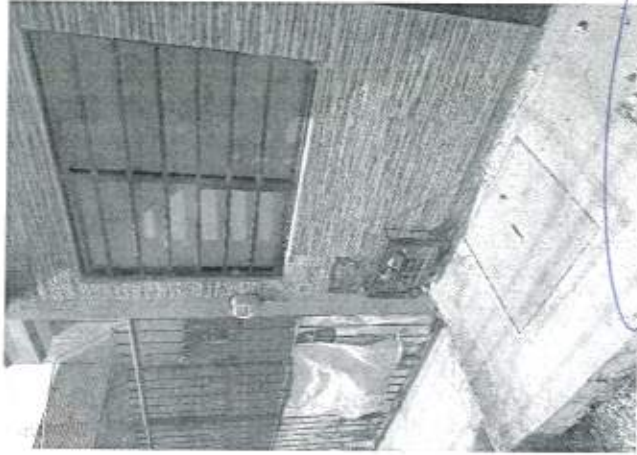

Concepto de obra ejecutado: Rehabilitación de pavimento en calle Gustavo Díaz Ordaz

Concepto de obra ejecutado: Rehabilitación de descarga y toma domiciliaria en calle Gustavo Díaz Ordaz

Observaciones:

Luis Ángel Avelino Marín

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas


c.c.p. Ofis

RE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: NIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra: 2024309090110 Período: NOVIEMBRE
Descripción: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DOROTEO ARANGO (ENTRE LA AVENIDA ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y LA CALLE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
Número de estimación: INGRESOS PROPIOS
Fecha de revisión: 17/12/2024

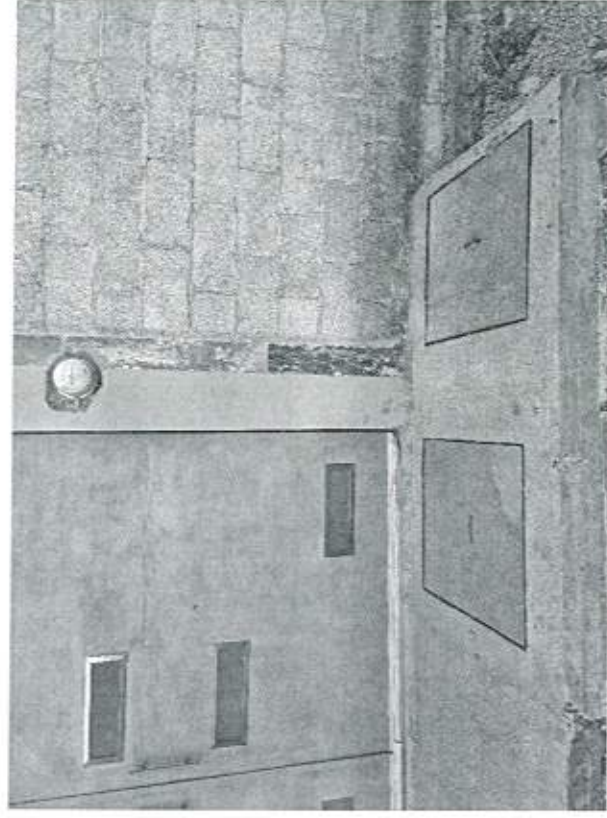

Concepto de obra ejecutado:

Tendido del material tipo calizo

Concepto de obra ejecutado:

Registros rehabilitados

Ruben Omar Morales Bandala
Supervisor de Obras

Observaciones:

ING. CIVIL
Profesión del Supervisor
c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orffis

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ
No. de obra:	2024309090112	Período:	NOVIEMBRE
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CIUDAD DE LAS FLORES ENTRE CALLES VERACRUZ Y DIODORO BATALLA EN LA COLONIA RUBEN PABELLO ACOSTA, EN		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de drenaje pluvial

Observaciones:

Estado actual de pozo para drenaje pluvial

Heber Ali Montañera Medel
Supervisor de Obras

ING.

Profesión

C.c.p. Contralor Interno

C.c.p. Tesorero Municipal

C.c.p. Director de Obras Públicas

C.c.p. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: INIICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309090113

Descripción: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LAS PARCELAS Y CALLE 22 DE FEBRERO, DE LA COLONIA

Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ


Periodo: NOVIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación: INGRESOS PROPIOS

Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 17/12/2024

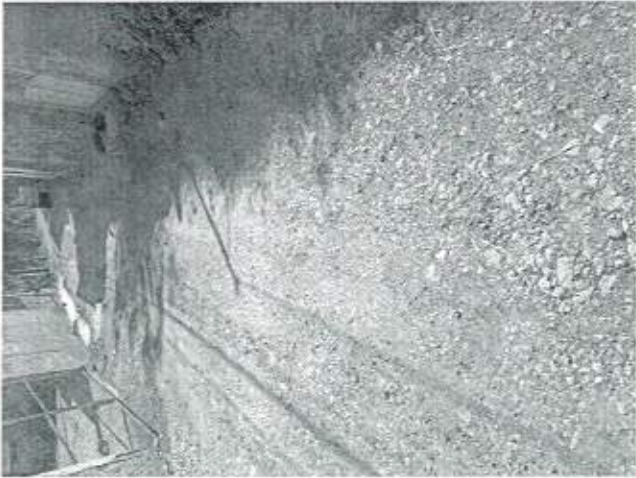

Concepto de obra ejecutado:

tendido de calizo

Concepto de obra ejecutado:

toma domiciliaria

Observaciones:

Oscar J. Rojas Ortiz
Supervisor de Obras

ING.


Profesión

- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	202430000900114	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR NEYRA ENTRE LA AV. RAFAEL MURILLO VIDAL Y FINAL DEL ANDADOR NEYRA; REHABILITACIÓN Y		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

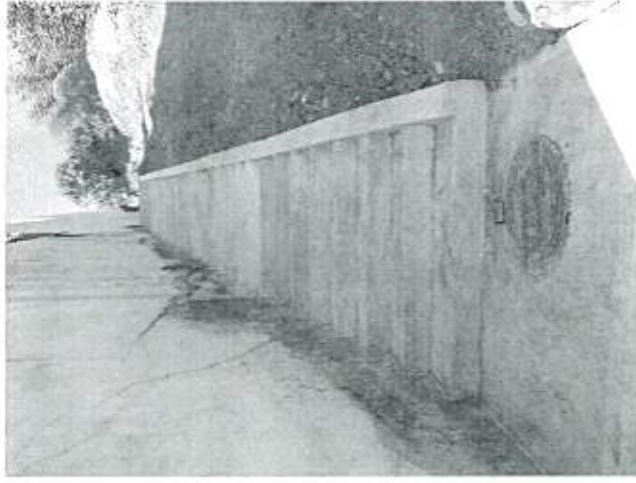

Concepto de obra ejecutado:

construcción de pozos de visita y escaleras peatonales

Concepto de obra
ejecutado:

construcción de escalinatas

Observaciones:

Ruben Omar Morales Bandala

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

i.c.p., Contrator Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:

INICIPIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Localidad:

XALAPA-ENRIQUEZ

Ejercicio fiscal:

EJERCICIO 2024

No. de obra:

2024309090115

Periodo:

NOVIEMBRE

Número de estimación:

Descripción:

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTOR PLUVIAL Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MALLORCA, ENTRE CALLES CASTILLA Y APALACHES; CALLE CIRCUITO

Fuente de financiamiento:

INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión:

17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:

Suministro e instalación de tubo de PEAD de 60 cm

Concepto de obra ejecutado:

construcción de cajas de caída escalonada

Observaciones:

Supervisor de Obras

Carlos Gustavo Hernández Paredes

AIQ.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal


c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Ofis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	JNIPICAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090116	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA VICENTE GUERRERO, CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, 23 DE MARZO.				
				Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	17/12/2024

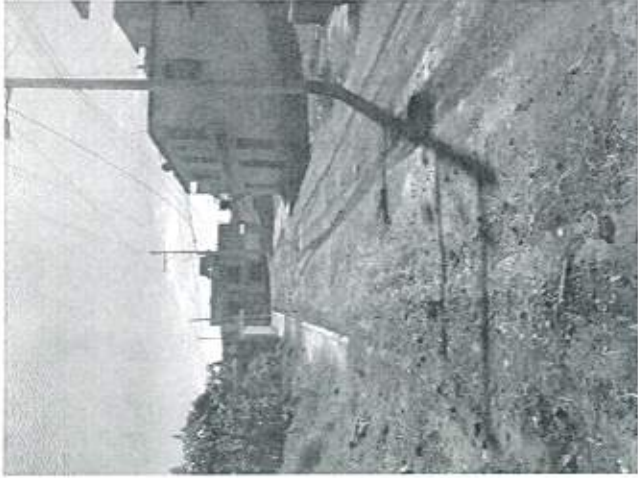

Concepto de obra ejecutado:

Sitio por donde se instaló tubería de PVC de 6" de diámetro

Concepto de obra ejecutado:

Sitio en donde se instaló tubería de PVC de 6" de diámetro

Observaciones:


Juan Ortiz Lagunas
Supervisor de Obras
ING. CIVIL
Profesión
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfís

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090118	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAUREL, (ENTRE LUIS DONALDO COLOSTIO Y CIPRÉS), EN LA COLONIA BOSQUES DE LAS	Periodo:	NOVIEMBRE
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:	Concepto de obra ejecutado:	toma domiciliaria
Observaciones:		 Oscar Rojas Ortiz Supervisor de Obras
		ING.
		Profesión
		C.C.P. Contralor Interno
		C.C.P. Tesorero Municipal
		C.C.P. Director de Obras Públicas
		C.C.P. Otros

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024
No. de obra: 2024309090120	Periodo: NOVIEMBRE	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LAUREL, ENTRE CALLES HUIZACHAL Y ENCINOS, COLONIA HIGUERAS Y REHABILITACIÓN		Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión: 17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:	tendido de calizo	Concepto de obra ejecutado:	registro sanitario terminado
Observaciones:			Oscar J. Rojas Ortiz Supervisor de Obras
			ING.
			Profesión
			c.c.p. Contralor Interno
			c.c.p. Tesorero Municipal
			c.c.p. Director de Obras Públicas
			c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	JMPCIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090123	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN VARIAS CALLES (FRENO, EUCALIPTO, ENCINOS, HAYAS Y NISPEROS), Y REHABILITACIÓN DE		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:

Supervisor de Obras

Luis Ángel Avelino Márin

ARQ.

Profesión

- C.C.P. Contralor Interno
- C.C.P. Tesorero Municipal
- C.C.P. Director de Obras Públicas
- C.C.P. Orlis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309090124

Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE Z. MERCADO, ENTRE CALLES AVENIDA FERROCARRIL INTEROCEANICO Y AVENIDA ENCANTO Y PRIVADA

Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ

Periodo: NOVIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación:

Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:

Toma domiciliaria

Concepto de obra ejecutado:

terrido de material calizo

Observaciones:

Oscar Jaime Rojas Ortiz

Supervisor de Obras

ING.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas


C.C.P. Orfis



RE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090125	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINES, ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y PROLONGACIÓN VILLA HERMOSA, EN			Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	17/12/2024

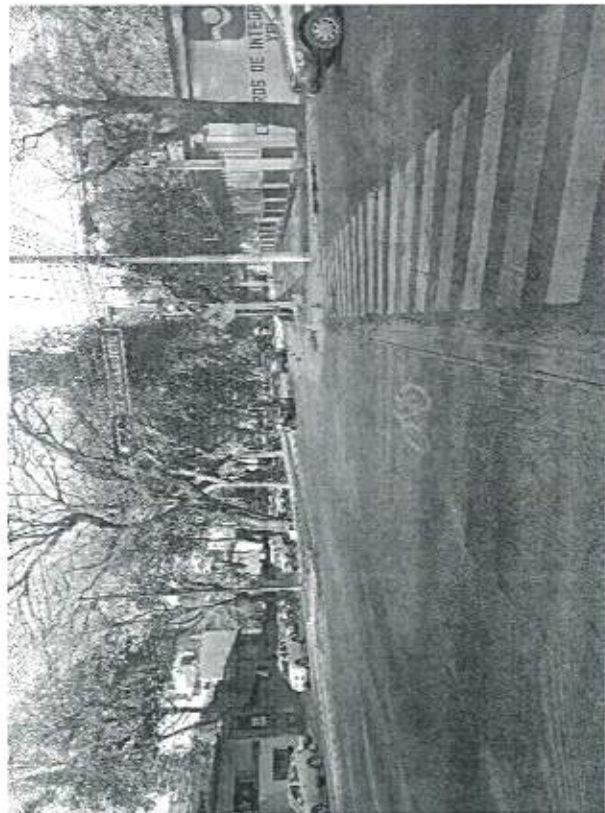

Concepto de obra ejecutado:

Estatus de Av. Ruiz Cortinez con obra concluida

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de caja de valvulas en operación con obra terminada

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de

Obra
ARQ.

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	INICIPIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090127	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HIGUERAS, PRIVADA HIGUERAS, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA, PRIVADA HIGUERAS.				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra ejecutado: Estado actual de revestimiento con material de base tipo calizo

Observaciones:

Juan Ortiz Lagunes
Supervisor de Obras
ING. CIVIL
Profesión
c.c.p. Controlador Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309040128

Descripción: REHABILITACIÓN DE AL CANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, ENTRE LAS FLORES Y EDUARDO MARQUINA, DE LA COLONIA

Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ

Período: NOVIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 17/12/2024



Concepto de obra ejecutado: reposición de concreto hidráulico

Concepto de obra ejecutado: tendido de calizo

Observaciones:

Oscar Jaramila Ortiz

Supervisor de Obras

ING.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas


C.C.P. Orfís



REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	NICPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	Localidad:	XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090129	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA 3A PRIV. DE LINO SERRANO ENTRE LINO SERRANO Y FINAL DE LA PRIVADA Y AND. S/N	Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión:	17/12/2024

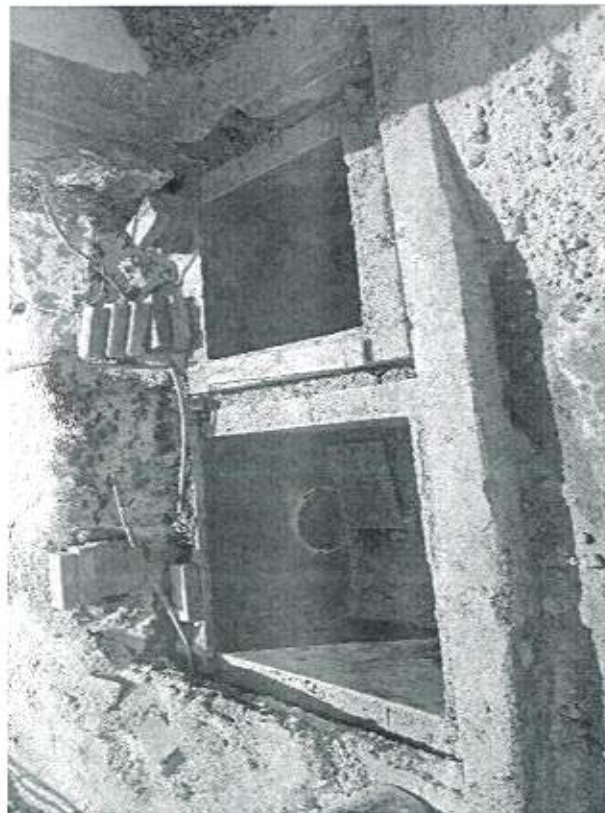

Concepto de obra ejecutado:

Registros Sanitario y Pluvial en Paso de Servidumbre

Concepto de obra ejecutado:



Corte y demolición de concreto para línea de drenaje pluvial y sanitaria

Observaciones:

Jabir James Jiménez

Residente de Obra en funciones de Supervisor de

Obra
ARQ.

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309090130

Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ZAFIRO, ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A NAOLINGCO Y CALLE ZAFIRO, REHABILITACION


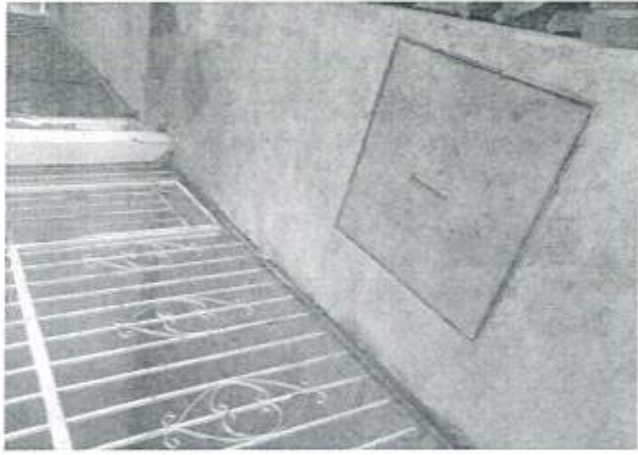
Localidad: XALAPA-ENRIQUEZ

Periodo: NOVIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 17/12/2024

	
Concepto de obra ejecutado:	Concepto de obra ejecutado:
Construcción de registro de albañal	Construcción de registro de albañal
Observaciones:	

Juan Ortiz Lagunes

Supervisor de Obras

ING. CIVIL

Profesión

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis

AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024300001131	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CARLOS R. SMITH, CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PRIMAVERA Y REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:

compactación de piedra caliza

Concepto de obra ejecutado:

suministro de material de piedra caliza

Observaciones:

Bianca Aurora Anelli Flores
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfís

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 2024309090132

Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RÍO AMARILLO, ENTRE CALLE RÍO FUERTE Y CALLE RÍO VERDE, DE LA COL. CAROLINO ANAYA.


Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ

Periodo: NOVIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 17/12/2024

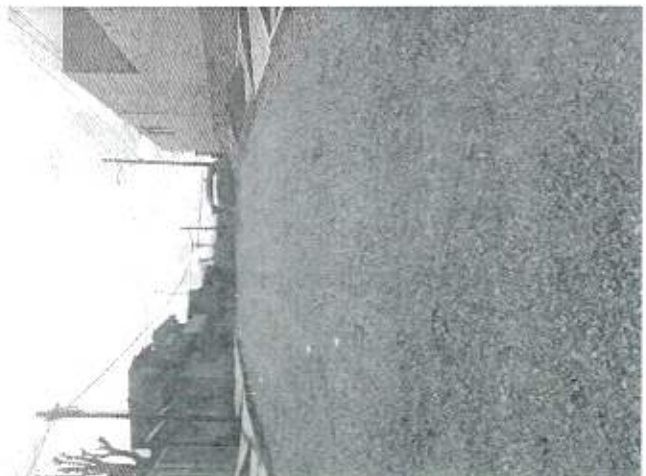

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de caliza

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de toma domiciliaria

Observaciones:

Supervisor de Obras

ING.

Profesión

C.C.P.

Contralor Interno

C.C.P.

Tesorerero Municipal

C.C.P.


Director de Obras Públicas

C.C.P.

Orfis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090133	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS		
	4, ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO Y ANDADOR D., DE LA COLONIA PREDIO DE		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fecha de revisión:	17/12/2024

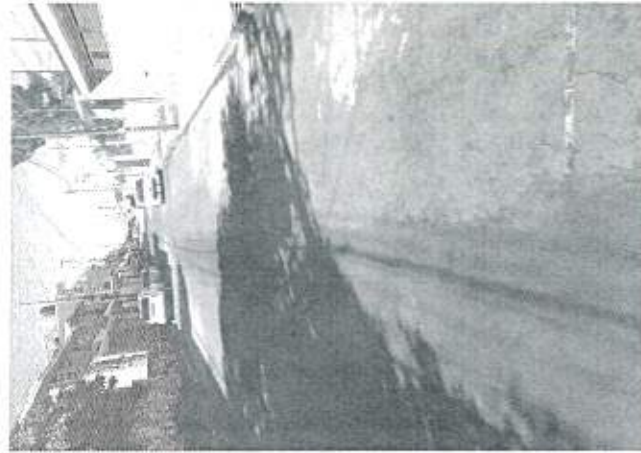

Concepto de obra ejecutado:	Estado actual de reposición de asfalto	Estado actual de reposición de asfalto
Observaciones:	Concepto de obra ejecutado:	Juan Ortiz Lagunes Supervisor de Obras
		ING. CIVIL
		Profesión
		Contralor Interno
		Tesorero Municipal
		Director de Obras Públicas
		Orfis

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. de obra: 202409090134

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AVENIDA MARFIL, ESMERALDA, ROQUETA, AZABACHE, ZAFIRO, CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2, ENTRE

Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ



Periodo: NOVIEMBRE

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024

Número de estimación:


Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS

Fecha de revisión: 17/12/2024

	
Concepto de obra ejecutado: tendido de caliza en andador esmeralda	Concepto de obra ejecutado: tendido de base de caliza en andador Roqueta colonia arenal
Observaciones:	<div><div>Supervisor de Obras</div><div>Víctor Hugo Hernández Pérez</div><div>ING. CIVIL</div><div>Profesión</div><div>C.C.P. Contralor Interno</div><div>C.C.P. Tesorero Municipal</div><div>C.C.P. Director de Obras Públicas</div><div>C.C.P. Orfis</div></div>

E FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	INICIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ
No. de obra:	2024309090.136	Periodo:	NOVIEMBRE
Descripción:	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y REHABILITACIÓN DE OBRA DE CAVALIZACIÓN DEL ARROYO CHORREADO PARA SALVAGUARDAR EL COLECTOR SANITARIO MARGINAL A		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024

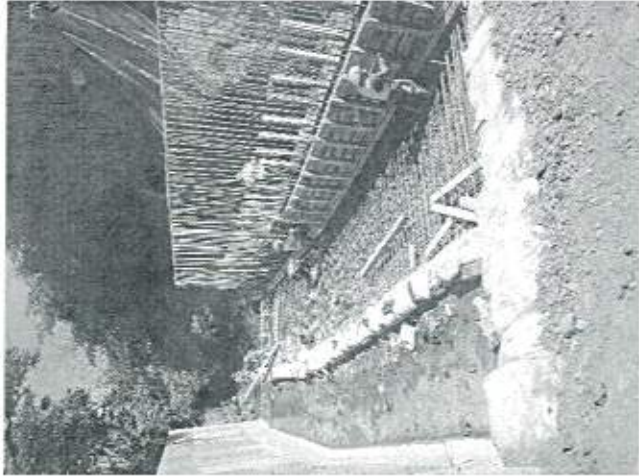

Concepto de obra ejecutado: Armado de muro y base con varilla de 3/4" a cada 20 cms doble parrilla, con bastones de 3/4" en esquinas para reforzar chafán en el canal de concreto. Cimbrao de muro

Concepto de obra ejecutado:

Suministro y tendido de material filtrante para fun ionamiento de drenaje ciego

Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de

Obra

ARQ.

Profesión

C.C.P.

Contralor Interno


C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Orfís

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio:	JUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090137	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN ANADOR				
	ARBOLEDAS ENTRE CALLE TUXTEPEC Y FINAL DE LA CALLE DE LA COLONIA RAFAEL				
				Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra
ejecutado:

Bianca Aurora Amell Flores
Supervisor de Obras

Profesión

K.C.P. Controlor Interno


z.c.p. Tesorero Municipal

C.C.P., Director de Obras Públicas
C.C.P., Ofis

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	JUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090138	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS				
	HILANDERAS ENTRE CALLES CIRCUITO 1 Y ESTIBADORES, COL. MIGUEL ALEMÁN, EN Fecha de revisión: 17/12/2024				

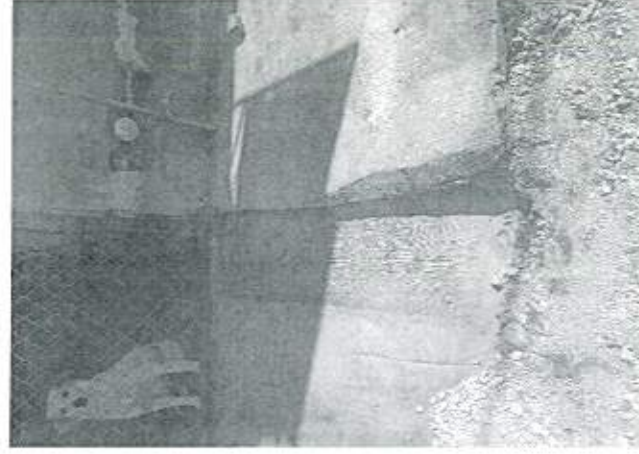

Concepto de obra ejecutado:

tendido de calizo

Concepto de obra ejecutado:

colado de banquetta

Observaciones:

Oscar Jair Rojas Ortiz
Supervisor de Obras



ING.

Profesión

- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfís

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Municipio:	INIUCIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090140	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JAZMIN ENTRE LA CALLE LUJIS DORANTES Y CALLE ALFREDO SERRANO, COL. PORTÓN				
				Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	17/12/2024

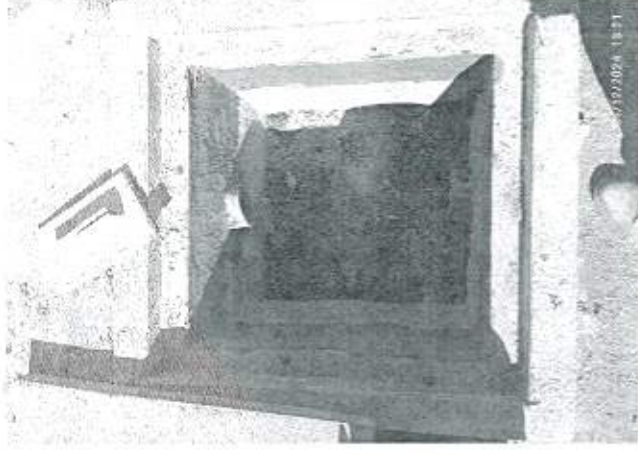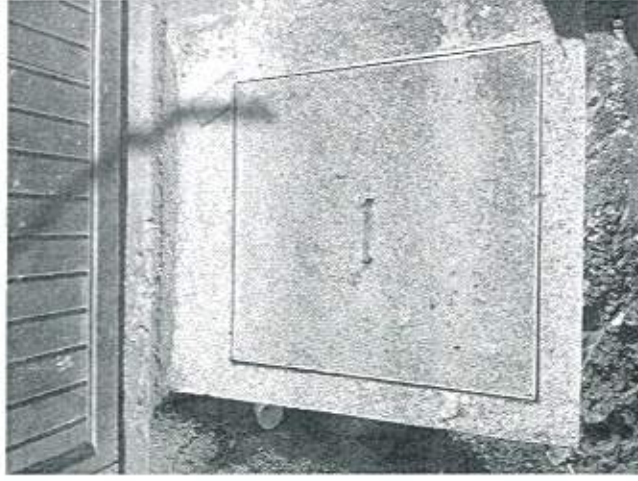

Construcción de Registro sanitario

Bianca Aurora Anell Flores
Supervisor de Obras

Profesión

x.c.p. Contralor Interno
x.c.p. Tesorero Municipal
x.c.p. Director de Obras P.
x.c.p. Orfis

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309090141	Período:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS ANDES ENTRE CALLE LA CASTILLA Y AV. NIÁGARA, EN ANDADOR UNO ENTRE CALLE LOS ANDES Y AV. MONITES				
				Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
				Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material calizo

Concepto de obra ejecutado:

Revestimiento con material calizo

Observaciones:

Carlos Gustavo Hernández Paredes

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

c.c.p. Contralor Interno



c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Otros

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio: MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad: XALAPA-ENRÍQUEZ	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2024	
No. de obra: 2024309090147	Periodo: NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CIRCUITO JACARANDAS ENTRE CALLE DURAZNO Y FINAL DE LA CALLE, EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL EL		Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS	
		Fecha de revisión: 17/12/2024	

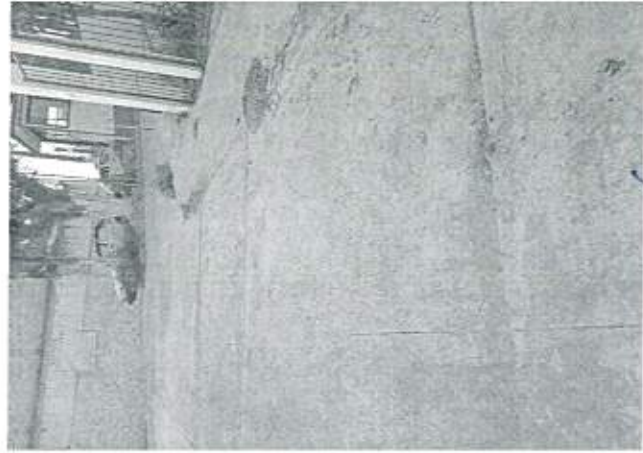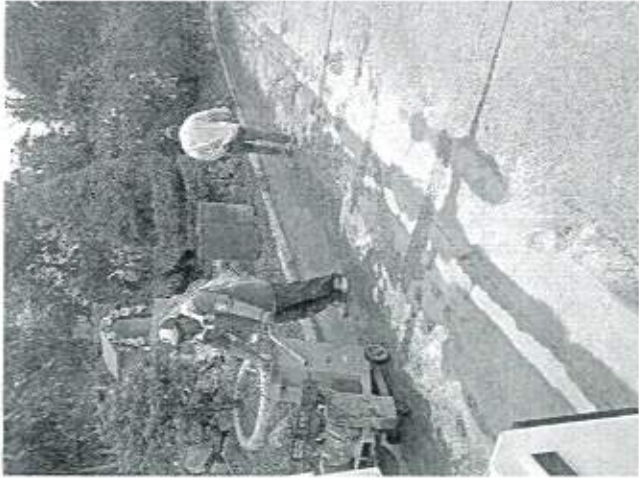

Concepto de obra ejecutado:

Trazo y corte en pavimento hidráulico

Concepto de obra trazo y corte con cortadora de disco en calle circuito arboledas ejecutado:

Observaciones:

Carlos Gustavo Hernández Paredes

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión

- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfís

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES			
Municipio:	MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUÉZ
No. de obra:	2024309090143	Período:	NOVIEMBRE
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SILVESTRE REVUELTA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE JOSE ROLÓN DE LA COLONIA INDECO ANIMAS.		
		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
		Número de estimación:	
		Fuente de Financiamiento:	INGRESOS PROPIOS
		Fecha de revisión:	17/12/2024



Concepto de obra ejecutado: Construcción de Registro sanitario 60x60 cms para descarga domiciliaria

Concepto de obra ejecutado:


Observaciones:

Residente de Obra en funciones de Supervisor de Obra	
ARQ.	Profesión
E.c.p. Contralor Interno	
E.c.p. Tesorero Municipal	
E.c.p. Director de Obras Publicas	
E.c.p. Orfís	

E FOTOGRAFÍCO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	INICIPIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Localidad:	XALAPA-ENRIQUEZ	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2024
No. de obra:	2024309080144	Período:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GONZALO VÁZQUEZ VELA ENTRE CALLE BOULEVARD DIAMANTE Y CALLE JORGE CERDAN Y	Fuente de financiamiento:	INGRESOS PROPIOS	Fecha de revisión:	17/12/2024

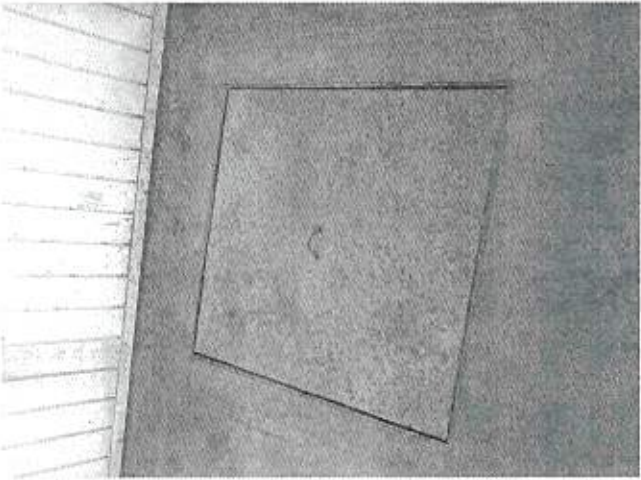

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de registro sanitario

Concepto de obra ejecutado:

Estado actual de toma domiciliar

Observaciones:

Heber Ali Montemira Medel

Supervisor de Obras

ING.

Profesión

C.C.P. Contralor Interno

C.C.P. Tesorero Municipal

C.C.P. Director de Obras Públicas

C.C.P. Otros
